


Հիմնարարության տնօրոգյան օրացույցային ժամանակացույց																											
№ h	Աշխատանքների անվանումը	Զանգի միավոր	Ծա-վալը	Մնվա-նումը	Քան-ակը	արտադրո-րական թ-յունը հնարա-փոխում	Ջերմ-ա-փոխի քանակը	Տեղում, օր	Տեղում, ամիս	Բանվոր-ների քանակը թյունը հնարա-փոխում	Ամիսներ																
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Նախապատրաստական շրջան							15	0.6	4																	
2	Քրուճնային ճանապարհի պրոֆիլավորում	կմ	6	գրեմիեր, բուլդոզեր	2	0.1198	1	25.03	1.00	4																	
3	Բուսատնկի կտրում, տեղափոխումով, կամ տեղում հարթեցումով	մ3	4175.5	բուլդոզեր	1	903.2258	1	4.62	0.18	2																	
4	Փափուկ բնահողերի քանդում էջակավատորով կողմիցով, կամ բարձրումով	մ3	22351.0	էջակավատոր մեղ շերտի	1	227.3	1	98.34	3.93	1																	
5	Կիսախոտային բնահողերի քանդում փոստակի և խրամուղու տեղծման համար	մ3	32507.0	էջակավատոր	1	139.7	1	232.66	9.31	2																	
6	ՕԿՑ-ի թափի հատակի, պատմեղի հիմնաքանակի և կատարի ճանապարհային պատտարի հիմնաքանակի խրամուղու հատակի հիմնի հարթեցում և խտացում հՀՁԾ	մ2	14045.0	բուլդոզեր, գլորն	1	933.3	1	15.05	0.60	2																	
7	Նախապատրաստական շերտի տեղծում ավազից բնահողերով տոփանումով	մ3	204.0	բանվոր, տոփիչ	1	3.9	1	52.46	2.10	4																	
8	Պաշտպանիչ հետվիցքի իրականացում մեղքով ավազից, տոփանումով խողովակի վրա 20սմ հաստ.	մ3	269.00	բանվոր, տոփիչ	1	4.9	1	54.90	2.20	2																	
9	Բետիցք և լիցք օգտակար հանույթի բնահողերով մեղքով հեմապատի ետնամասում, տոփանումով	մ3	80.00	բանվոր, տոփիչ	1	4.9	1	16.33	0.65	2																	
10	Բետիցք և լիցք օգտակար հանույթի բնահողերով մեղքով, տոփանումով	մ3	776.00	բուլդոզեր, գլորն	1	700.00	1	1.11	0.04	2																	
11	Նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի տեղծում, յուրաքանչյուրը 30սմ հաստությամբ բետոնի տային գորգի տակ և վրան	մ3	7170.00	բուլդոզեր, գլորն	1	700.00	1	10.24	0.41	3																	
12	Պատվարի մարմնի իրականացում	մ3	47450.0	բուլդոզեր, գլորն	1.0	274.19	1.00	173.06	6.92	6.00																	
13	Բեմոտմասային գորգի փուլում	մ2	11950.0	բանվոր	1.0	193.37	1.00	61.80	2.47	4.00																	
14	Չոր քարե շարվածք	մ3	1900.0	բանվոր	2.0	4.9	1.00	193.88	7.76	3.00																	
15	Միամույլ բետոնի և երկաթբետոնի տեղադրում	մ3	467.00	բանվոր, բետոնագործ	1	6.3	1	74.72	2.99	6																	
16	Պողպատե Փ426-630մմ խողովակների մոնտաժ վերջավորումով	մ	207.50	մոնտաժիչ	1	9.40	1	22.08	0.88	4																	
17	Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ, աղային վահանակներ, ֆոտովոլտային համակարգ, տեխանկողություն			բանվոր	1	կիրառելի		100.00	4.00	8																	
18	Այլ աշխատանքներ - ՕԿՑ-ի և թափահալարի տարածքի բարեկարգում, մետաղական ցանցապատի տեղադրում և այլն			բանվոր		կիրառելի		150	6.00	4																	
19	Հիմարքի մաքրում և հեռացում			բանվոր		կիրառելի		15	0.6	4																	

Բանվոր ուժի շարժման ժամանակացույց

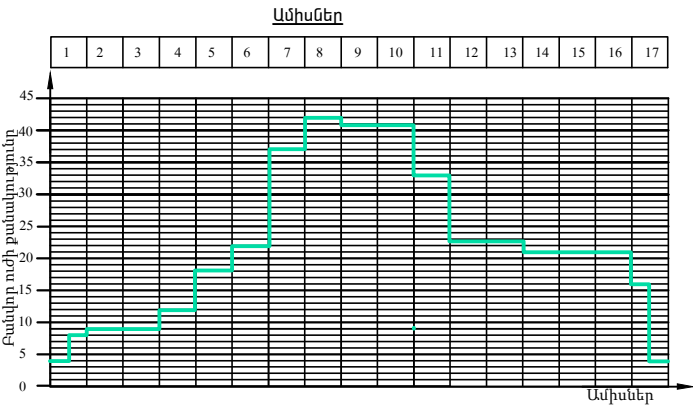

Ծանոթություն:
1. Հիմնարարության տնօրոգությունը որոշվել է համաձայն գործող շինարարական նորմատիվների և ЕННР -ների նորմատիվային տվյալների հիման վրա:

				Որոշման համակարգչում ավելցուկային ջրերի անհարկի կտրուտների կամիմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր	գ.գ
և գ.6	Վ.Գովասանյան			Պայմանագիր N 2/4 - եմՕԶԲ -22-1	
Ֆին. մասն.	Գ.Պետրոսյան			Գեղարքունիքի մարզի Մանասի առու ջրանցքի գլխամասից վերև «Լոկոյի վար» տարածքում 27 հազար խմ ծավալով ՕԿՑ-ի կառուցում	
Համագործակցության	Յ.Բաքարյան			Հիմնարարական կազմակերպման մանրագիր	ՓՈՒՆ
				Մ. Գ.	ՇԿԼ-8
				Զ	8
				Հիմնարարության տնօրոգության և բանվոր ուժի շարժման ժամանակացույցներ	ՀԱՅԿԵԴ
