


«ԳԼՈԲԱԼ ԷՆՋԻՆ» ՍՊԸ

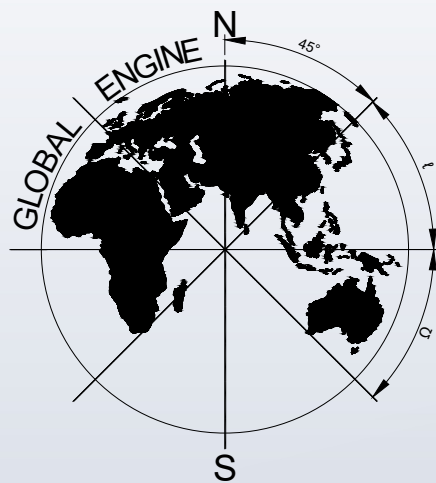

ООО «ГЛОБАЛ ЭНДЖИН»

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ 1 - АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТОМ 2 - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИЯХ ЗАО «ОБЩЕСТВЕННАЯ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ АРМЕНИИ»

ТОМ 2 - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Ведомость объёмов работ

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИЯХ ЗАО
«ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ АРМЕНИИ»**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, серверная комната 1				
1	Щиток с дверцей IP44, на 24 модуля	шт.	1	26.74	26.74
2	Автоматический выключатель 380В, 16А	шт.	1	7.62	7.62
3	Автоматический выключатель 380В, 10А	шт.	1	6.85	6.85
4	Автоматический выключатель 380В, 16А	шт.	1	7.23	7.23
5	Автоматический выключатель 220В, 10А	шт.	2	6.59	13.18
6	Модульный магнитный пускатель с тепловым реле, с 2 кнопками управления, 380В, 6А	шт.	1	13.69	13.69
7	Модульный магнитный пускатель с тепловым реле, с 2 кнопками управления, 220В, 6А	шт.	1	12.67	12.67
8	Кабель медный, изолированный, с разделительным основанием, сечением 5х1,5мм ² / ВВГнг-LS	100м	0.42	125.67	52.78
9	Кабель медный, изолированный, с разделительным основанием, сечением 3х1,5мм ² / ВВГнг-LS	100м	0.10	65.74	6.57
10	Полиэтиленовая гофрированная труба Ф20мм	100м	0.48	34.45	16.54
11	Крепёжная клипса (пряжка / хомут)	шт.	120.00	0.01	1.61
	Электроснабжение, серверная комната 2				
1	Щиток с дверцей IP44, на 24 модуля	шт.	1	26.74	26.74
2	Автоматический выключатель 380В, 16А	шт.	1	7.62	7.62
3	Автоматический выключатель 380В, 10А	шт.	1	6.85	6.85
4	Автоматический выключатель 380В, 16А	шт.	1	7.23	7.23
5	Автоматический выключатель 220В, 10А	шт.	2	6.59	13.18
6	Модульный магнитный пускатель с тепловым реле, с 2 кнопками управления, 380В, 6А	шт.	1	13.69	13.69
7	Модульный магнитный пускатель с тепловым реле, с 2 кнопками управления, 220В, 6А	шт.	1	12.67	12.67
8	Кабель медный, изолированный, с разделительным основанием, сечением 5х1,5мм ² / ВВГнг-LS	100м	0.42	125.67	52.78
9	Кабель медный, изолированный, с разделительным основанием, сечением 3х1,5мм ² / ВВГнг-LS	100м	0.10	65.74	6.57
10	Полиэтиленовая гофрированная труба Ф20мм	100м	0.48	34.45	16.54
11	Крепёжная клипса (пряжка / хомут)	шт.	120.00	0.01	1.61
	Электроснабжение, серверная комната 3			0.00	0.00
57	Щиток с дверцей IP44, на 24 модуля	шт.	1	26.74	26.74
58	Автоматический выключатель 380В, 16А	шт.	1	7.62	7.62
59	Автоматический выключатель 380В, 10А	шт.	1	6.85	6.85
60	Автоматический выключатель 380В, 16А	шт.	1	7.23	7.23
61	Автоматический выключатель 220В, 10А	шт.	2	6.59	13.18
62	Модульный магнитный пускатель с тепловым реле, с 2 кнопками управления, 380В, 6А	шт.	1	13.69	13.69
63	Модульный магнитный пускатель с тепловым реле, с 2 кнопками управления, 220В, 6А	шт.	1	12.67	12.67
64	Кабель медный, изолированный, с разделительным основанием, сечением 5х1,5мм ² / ВВГнг-LS	100м	0.47	125.67	59.06
65	Кабель медный, изолированный, с разделительным основанием, сечением 3х1,5мм ² / ВВГнг-LS	100м	0.11	65.74	7.23
66	Полиэтиленовая гофрированная труба Ф20мм	100м	0.54	34.45	18.60
67	Крепёжная клипса (пряжка / хомут)	шт.	130.00	0.01	1.75
	Серверная комната 1				

1	Пылеудаляющий центробежный вентилятор с монтажным комплектом L=1200м³/ч 900Па	к-кт	1.000	308.72	308.72
2	Канальный вентилятор для компенсации удаляемого [воздуха] с монтажным комплектом L=500м³/ч	к-кт	1.0	73.97	73.97
3	Фильтр очистки воздуха G4 d=200	м²	0.04	519.77	20.79
4	Пылесборный короб d=200 с выходом для воздуховода	шт.	1	34.70	34.70
5	Воздуховод из листовой оцинкованной стали d=200 0,5мм	м²	3.0	5.61	16.84
6	Воздуховод из листовой оцинкованной стали d=160 0,5мм	м²	1.6	5.61	8.98
7	Приточная вентиляционная решетка 500x200	шт.	1.000	18.58	18.58
8	Пылеулавливающая насадка (диффузор) 500x200	шт.	2.000	7.88	15.77
Серверная комната 3					
1	Пылеудаляющий центробежный вентилятор с монтажным комплектом L=1200м³/ч 900Па	к-кт	1.00	308.72	308.72
2	Канальный вентилятор для компенсации удаляемого [воздуха] с монтажным комплектом L=500м³/ч	к-кт	1.0	73.97	73.97
3	Фильтр очистки воздуха G4 d=200	м²	0.04	519.77	20.79
4	Пылесборный короб d=200 с выходом для воздуховода	шт.	1	34.70	34.70
5	Воздуховод из листовой оцинкованной стали d=200 0,5мм	м²	1.6	5.61	8.98
6	Воздуховод из листовой оцинкованной стали d=150 0,5мм	м²	0.8	5.61	4.49
7	Приточная вентиляционная решетка 500x200	шт.	1.000	18.58	18.58
8	Пылеулавливающая насадка (диффузор) 500x200	шт.	2.000	7.88	15.77
Սերվերային սենյակ 2					
1	Пылеудаляющий центробежный вентилятор с монтажным комплектом L=1200м³/ч 900Па	к-кт	1.000	308.72	308.72
2	Канальный вентилятор для компенсации удаляемого [воздуха] с монтажным комплектом L=500м³/ч	к-кт	1.0	73.97	73.97
3	Фильтр очистки воздуха G4 d=200	м²	0.04	519.77	20.79
4	Пылесборный короб d=200 с выходом для воздуховода	шт.	1	34.70	34.70
5	Воздуховод из листовой оцинкованной стали d=200 0,5мм	м²	1.6	5.61	8.98
6	Воздуховод из листовой оцинкованной стали d=160 0,5мм	м²	0.8	5.61	4.49
7	Приточная вентиляционная решетка 500x200	шт.	1.000	18.58	18.58
8	Пылеулавливающая насадка (диффузор) 500x200	шт.	2.000	7.88	15.77
9	Дымовой извещатель (датчик)	шт.	2.00	13.70	27.39
10	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	шт.	2.00	14.33	28.66
11	Тепловой извещатель (датчик)	шт.	2.00	11.15	22.31
12	Огнестойкий кабель с медными жилами, сечением 2x0,5 мм/КПСнг(А)- FRLS/	м	55	0.50	27.23
<u>Итого</u>					<u>2081.53</u>
<u>НДС 20%</u>					<u>416.31</u>
<u>Всего (Общий итог)</u>					<u>2497.84</u>

Директор ООО «Глобал-Энджин»:

Т. Айрапетян
