

Կատարող				
 «Հայնախագիծ» ԲԲԸ 0025 Հայաստանի Հանրապետություն ք. Երևան, Չարենցի 1 էլ. փոստ info@armproject.am				
Պատվիրատու				
«Վայոց ձորի ԲԿ» ՓԲԸ				
Նախագծի անվանումը				
«ՀՀ Վայոց ձորի ԲԿ» ՓԲԸ ուղղաթիռային հարթակի վերակառուցման նախագիծ				
Փուլ	Մաս	Այբոմ	Գիրք	Հատոր
ԱԼ	ՇԿ	1	-	-
Գծագրի անվանում				
Բացատրագիր				
Գծագիր	ՇԿ - 01	Էլ.ֆայլ	PC 100.01	
Մասշտաբ				
Կատարող բաժնի անվանումը				
ՆԳՃ		Ռ. Մամյան		
Բաժ. դեկ.		ԳՍՍմբաության		
Նախագծեց		ԱՐՂույան		
Ստուգեց		ՀՍՍողոմոնյան		
Պատվեր		ՆՊ 001 - ՈԱ25		
ամսաթիվ	արխիվ. համար	գույքահամար		
Փոփոխություններ				
3				
2				
1				
0				
էջ	1	ՖՈՐՄԱՏ		

Մոնտաժային աշխատանքներում զբաղված բանվորները պետք է կիրառեն պաշտպանական գոտիներ՝ ամրակցված կայուն կոնստրուկցիայի։ Գործիքների պատահական անկումը կանխելու համար առաջարկվում է որսող ցանցի տեղադրում մուտքային մասում և հետիոտնային անցումի տեղադրում Ա առանցքով։

Կոռնկի տեղադրման տեղամասը ցանկապատվում է ազդանշանային ժապավենով, տեղադրվում են նախագուշացնող և արգելող անվտանգության նշաններ։

Շինարարական աղբը հավաքվում է աղբամանում և հեռացվում շինհրապարակից նախապես սահմանված վայր։

3. Շինարարության կազմակերպատեխնոլոգիական սխեման

3.1 Նախապատրաստական աշխատանքներ

Նախապատրաստական փուլում իրականացվում են՝

- տարածքի ժամանակավոր ազդանշանային ցանկապատում,
- պահեստային և մոնտաժային հարթակների կարգավորում,
- ժամանակավոր տնտեսության կազմակերպում,
- մեքենաների և մեխանիզմների փոխադրում շինհրապարակ,
- բանվորների հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ,
- անվտանգության նշանների տեղադրում,
- հակահրդեհային միջոցների տեղադրում։

Որպես շարժական կոմպրեսոր (օդաճնշումային գործիքների սպասարկման համար) առաջարկվում է Comp Air C 76 մոդելը։

3.2. Վերակառուցման աշխատանքներ

Վերակառուցման աշխատանքներից առաջ իրականացվում է գոյություն ունեցող հարթակի ծածկույթի և հարթեցնող շերտի քանդում, բազրիկի ապամոնտաժում։

Հարթակի սալում նախագծով սահմանված տեղերում գալլիկոնվում են անցքեր, որոնց մեջ տանձվում են խարիխներ։

Գումարային աշխատատարությունը կազմում է **197 մարդ-օր**։

5.Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը

Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը որոշվել է աշխատանքների ծավալների և բնույթի հիման վրա` հաշվի առնելով շինարարության պայմանները։

Հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների անվանացանկը բերված է աղյուսակ 1-ում, իսկ գործիքների, հարմարանքների, հանդերձանքի անվանացանկն աղյուսակ 2-ում։

Աղյուսակ 1	Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների անվանացանկ		
NN	Անվանում	Մակնիշ	Քանակ
1	Ավտոմոբիլային կտունկ	XCMG QY25K-II	1
2	Ավտովերիան	AT-22/7 CTE B-LIFT 230 HY, IVECO Daily	1
3	Բետոնամղիչ	777 DO 01 Mercedes Benz Axor,	1
4	Թրթռիչ մակերեսային	НВ-91А	2
5	Փոխարկիչ քրթոիչների համար	НВ-4	1
6	Եռակցման սարքեր	WARRIOR 500i CC/CV	3
7	Փոքր մեքենայացման միջոցներ	կոմպլեկտ	1
8	Շարժական կոմպրեսոր	Comp a.r C 76	
9	Ավտոբետոնախառնիչ	Kamaz 58149 z	ըստ հաշվարկի

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ
1. Ընդահուր դրույթներ

«Շինարարության կազմակերպում» բաժինը մշակված է նախագծման տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա համաձայն ՀՀ ՇՆ 3.01.01-09 և ընդգրկում է.
- բացատրագիր, - աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, - շինարարական գլխավոր հասակագծեր։
Բաժնի մշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.
- ՀՀ ՇՆ 3.01.01-09 «Շինարարության կազմակերպում », - ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, - ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում», - ՀՀՇՆ 13-03-2022 « Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ», - ՄՆԽՊ 3.02.01-87 «Հողային կառույցներ, հիմնատակեր և հիմքեր », - ԳՈՍՏ 24258-88 «Փայտամածային միջոցնոր։ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ », - ԳՈՍՏ 27321-87 «Կցովի կանգնակային փայտամածեր շինոնոտաժային աշխատանքների կատարման համար։Տեխնիկական պայմաններ»,
2. Շինարարության պայմանները
Վերակառուցվող ուղղաթիռային հարթակը գտնվում է Վայոց Ձորի մարզի գործող ԲԿ-ի ընդունարանի մասնաշենքի տանիքի վրա։ Նախագծով նախատեսվում է մեծացնել գոյություն ունեցող հարթակը 0,7 մ բարձակային սալի չափով (հարթակի շառավիղը մեծացնելով 9մ –ից 9,7 մ) և ավելացնել անվտանգության ցանցային գոտի։
Գոյություն ունեցող հարթակի ծածկույթը ռետինե մանրուքից է, որը քանդվելու է հարթեցնող շերտի հետ միասին։ Մեծացվող հարթակի ծածկույթը նույնպես ռետինե մանրուքից է լինելու։
Վերակառուցման պայմանները բարդ են` պայմանավորված գործող ԲԿ-ով։

Ցեմենտալագն հարթեցնող շերտը որոշակի թերություն է տալիս հարթակին։ Հարթակի ծածկույթը ռետինե մանրուքից է` պոլիուրետանային ստնձի հենքով։

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է **XCMG QY25K-II K** ավտոկտունկը։



Ավտոկտունկ XCMG QY25K-II K

XCMG QY25K-II կտունկի տեխնիկական բնութագիրը	
Առավելագույն բեռնամբարձություն/սլաքի թռիչք	25 մ / 3 մ
Հիմնական սլաքի երկարությունը	10.5 մ
Սլաքի երկարությունը բացված վիճակում	39.5 մ
Սլաքի երկարությունը սազիկով	47,8մ
Անիվային բանաձև	8 x 8 x 8

4. Շինարարության ժամկետները

Շինարարության նորմատիվ տևողությունը որոշվել է հիմնական աշխատանքների ծավալների, աշխատատարության հաշվարկման և տեխնոլոգիական հաջորդականության հաշվառման հիման վրա։

Շենքի վերակառուցման ընդհանուր տևողությունը կազմում է **3 ամիս** կամ **90 օրացուցային օր**։

Բանվորների առավելագույն քանակը կազմել է **7 մարդ**։

ԲՈՎԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

- Ընդհանուր դրույթներ
- Շինարարության պայմանները
- Շինարարության կազմակերպատեխնոլոգիական սխեման
- Շինարարության ժամկետները
- Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը
- Հիմնական շինարարական աշխատանքների ծավալները և ռեսուրսների պահանջարկը
- Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի հսկումը
- Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ
- Ժամանակավոր վարչակենցաղային և սանիտարահիգիենիկ շինությունների պահանջվող մակերեսների հաշվարկ

ԳԾԱԳՐԵՐ

ՇԿ-1 Բացատրագիր

ՇԿ-2 Բացատրագիր շարունակություն

ՇԿ-3 ՇԳՀ` կաղապարամածային աշխատանքներ / I փուլ/,

ՇԿ-4 ՇԳՀ` ամրանային աշխատանքների ավարտ / I փուլ/,

ՇԿ-5 ՇԳՀ` տանիքի սալի բետոնացման ավարտ,

ՇԿ-6 ՇԳՀ` ամվտանգության ցանցի մոնտաժում,

ՇԿ-7 Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց։

Աշխատանքներն իրականացվում են փուլային եղանակով։ Մասնավորապես կաղապարամածի տեղադրման, ամրանավորման և բետոնացման աշխատանքներն իրականացնելու համար նախատեսվում է 4 սեկտորային գործամաս։ Փայտե կաղապարամաճն ունի Գ-ձև հատվածք։ Այն ամրակապելու համար կիրառվում է ամրանային կարճաձողերի, դրանց եռակցվող անկյունակների և վերջիններիս վրա տեղադրվող մետաղական խողովակների համակարգ, որը պատկերված է Գծագիր 1-ում։ Կաղապարամծային վահաններն ամրացվում են այդ համակարգին մետաղալարերի միջոցով։ Աշխատանքներն իրականացվում են հարթակից և կախովի ձոճից, որը կարող է լինել ինչպես գույքային, այնպես էլ պատրաստովի ըստ պահանջվող չափսերի։ Կաղապարամածը տեղադրելուց հետո կատարվում է շառավղային և հորիզոնական ամրանների տեղադրում գործամասում ըստ Գծագիր 2-ի։

Առաջին գործամասում բետոնացման աշխատանքներն իրականացնելուց հետո կատարվում են երկրորդ գործամասի կաղապարամածային և ամրանավորման, ապա բետոնացման աշխատանքներ։

Անվտանգության ցանցային գոտու իրականացումը կատարվում է բետոնացման աշխատանքների ավարտից հետո, տեղաշարժվող աշխատանքային տախտակամածի վրայից։ Այս փուլում ևս պարտադիր է բանվորների պաշտպանական գոտիների ամրակապումը կայուն կոնստրուկցիայից։

Աղյուսակ 2

NN	Անվանում	Մակնիշ	Քանակ
1	Գույքային կամ պատրաստովի ճոճ		Ըստ պահանջի
2	Տանիքային ամբարձիչ		1
3	Հատիչներ (հավաքածու)		1
4	Բանալիներ (հավաքածու)		1
5	Մուրճեր (հավաքածու)		2
6	Ակցան		2
7	Հարթաշուրթ դիէլեկտիկ . բռնիչներով		2
8	Մաղավարտ		7
9	Երկարաճիտ կիրգե կոշիկներ		5
10	Ապահովիչ գոտի	ГОСТ Р 50849-96	3
11	Կախաճուպան		3
12	Ջեռնոցներ	Ըստ պահանջի	
13	Ռեսպիրատոր	Леспектор	4
14	Պաշտպանիչ ակնոցնր		5
15	Աղբակուտակիչ		1

աշխատանքային փաստաթղթերի մուտքային հսկումը;

բ/ արտադրական օպերացիաների և առանձին պրոցեսների օպերացիոն հսկումը;

գ/ շինմոնտաժային աշխատանքների ընդունման հսկումը:

Շինարարական արտադրության որակի ապահովման համակարգն ընդգրկում է նաև որակի տեխնիկական հսկումը, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 746 և 752 հոդվածների հիման վրա:

Մուտքային հսկումմբ ստուգվում է աշխատանքային փաստաթղթերի լիակազմությունը, տեղեկատվական անհրաժեշտ ծավալը; շինարարական կոնստրուկցիաների, շինվածքների, իրերի, նյութերի և սարքավորումների արտաքին տեսքը և համապատասխանությունը ստանդարտներին, նորմատիվային և աշխատանքային փաստաթղթերին, անձնագրերի, սերտիֆիկատների և այլ ուղեկցող փաստաթղթերի առկայությունը: Շինարարական կառուցվածքների իրականացման որակի հսկումն անհրաժեշտ է իրականացնել ըստ ՀՀ ՇՆ 3.01.01-09 «Շինարարության կազմակերպում » և ՀՀՇՆ 13-03-2022 « Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ»:

8. Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ

8.1. Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումները, որոնց ավարտը պետք է ձևակերպված լինի համապատասխան ակտով:

8.2. Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախագգուշացնող ցուցանակներ:

8.3. Օրվա մութ ժամանակահատվաում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ГОСТ 12.1.046-85.

Լուսավորվածությունը պետք է լինի համաչափ , առանց կուրացնող էֆֆեկտի: Զլուսավորված տեղամասերում աշխատանքի իրականացումը չի թույլատրվում:

6. Հիմնական շինարարական աշխատանքների և ռեսուրսների ծավալները

Հիմնական աշխատանքների ծավալները բերված են աղյուսակ 3-ում:

Աղյուսակ 3

NN	Աշխատանքների անվանումները	Զափման միավ.	Ծավալը
1.	Ամրանավորման աշխատանքներ	տ	5,1
2.	80x60x4 մմ քառակուսի հատվածքով պողպատե խողովակների տեղադրում	տ	2,63
3.	Մալում անցքերի գայլիկոնում և խարիսխների տեղադրում	հատ	212
4.	Բետոնային աշխատանքներ	մ³	29,6
5.	Ցեմենտավազային շերտի իրականացում	մ²	296,0
6.	Ռետիներ մանրուքից հարթակի ծածկույթի պատրաստում	մ²	296,0
7.	Հակակոռոզիոն ներկման աշխատանքներ	տ	5,1

Շինարարական աղբը կուտակվում է աղբամաններում և պարբերաբար հեռացվում:

Շինարարության ջրի և էներգառեսուրսների պահանջարկը

Պահանջարկը որոշվել է աշխատանքների ծավալների, կատարման ժամկետների և Պետշինի խոշորացված նորմերի հիման վրա :

Էներգառեսուրսների և ջրի պահանջարկ			
1	Էլեկտրաէներգիա	Քիաշվ, ԿՎտ	65,0
2	Ջուր	մ3/օր	1,5

Հակահրդեհային նպատակներով ջրի պահանջարկը 10 լ/վրկ:

Ստորև բերվում են ջրօգտագործման հաշվեկշիռը և անհրաժեշտ էլեկտրական հզորության հաշվարկը:

8.4. Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգությունն ապահովող այլ միջոցներով ` համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի:

8.5. Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր:

8.6. Էլեկտրական գործիքների հետ աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց: Էլեկտրաֆիկացված բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համար: Կիրառելուց առաջ ստուգվում է գործիքի սարքին վիճակը` լարերի և բռնիչի մեկուսացումը, աշխատանքային մասի վիճակը , պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն: Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր էլեկտրաֆիկացված գործիքները պարտադիր հողացնվում են:

8.7. Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և անհատական պաշտպանության միջոցներով:

8.8. Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձությունը կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով:

8.9. Աշխատանքի գոտում պետք է ունենալ հակահրդեհային միջոցներ ` 200 մ2 մակերեսին - 1 կոմպլեկտ հաշվարկով:

8.11. Շինարարական աղբը պետք է ժամանակին հեռացվի , արգելվում է աղբի այրումը շինարարական հրապարակում

8Օ12 Անհրաժեշտ է իրականացնել փոշմարման միջոցառումներ `անհրաժեշտության դեպքում ճակատային պաշտպանիչ թաղանթների կիրառմամբ և բեռնատարների թափքը պաստառով ծածկելու միջոցով:

ՀԱՇՎԱՐԿ		
<i>անհրաժեշտ էլեկտրական հզորության ,կՎտ</i>		
1. Եռակցման սարքեր /3 հատ		27,0
2. Տարբեր էլեկտրաուժային սարքավորումներ		25,0
/հատիչներ, դուրեր,սղոցներ և այլն, 3 կոմպլեկտ		
3 Էլեկտրաթրթռիչներ 2 հատ		20,0
5. Շենքի լուսավորում		
և կենցաղ		10

Р տեղ.-82 կՎտ		
Р հաշվ.= Рտեղ.* Кպահանջ.-82 կՎտ * 0,8–65 կՎտ :		
ΔΓΟԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՇՎԵԿԵԾԻՌ		

1.Ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կենցաղային կարիքներ մարդ*0,016մ³/մարդ	2 x 0,016 մ³=	0,032 մ³
2.Բանվորների կենցաղային կարիքներ 7 մարդ*0,025մ³/մարդ		0,175 մ³
3. Բետոնի ջրման	29մ³*0,0314մ³/մ³	0,899 մ³
6. Ծինիրապարակի մարքման	100մ²*0,004մ³/մ²	0,4 մ³
Ընդամենը`		1,5 մ³

Չույգ հակահրդեհային հիդրանտներից ջրի ծախսը` 2*5=10 լ/վրկ

մոնտաժային աշխատանքների որակի հսկումը

Շինմոնտաժային աշխատանքների բարձր որակն ու հուսալիությունն ապահովվում է է շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների արտադրական հսկման միջոցով, որն իրենիցց ներկայացնում է շինարարական արտադրանքի բոլոր փուլերում իրականացվող միջոցառումների համալիր:

Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի արտադրական հսկումը ներառում է .

ա/ կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների,

9. Ժամանակավոր վարչակենցաղային և սանիտարաեիզիեիկ շինությունների պահանջվող մակերեսների հաշվարկ

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցում բանվորների առավելագույն բանակը կազմել է 7 մարդ:




Համապատասխան նորմատիվային հարաբերակցության ԻՏԱ և ծառայողների թիվը կկազմի 2 մարդ :

Ըստ ստացված թվաքանակի	
1.Գրասենյակի պահանջվող մակերեսը`	F գր = 2*3 =6 մ²
2.Հանդերձարանի պահանջվող մակերեսը`	
F հանդ=5 x 0,3 =1,5 մ²	(5=7*0.6)
3.Ցնցուղարանի պահանջվող մակերեսը`	
1 ցնցուղ` 12 մարդուն, այսպիսով 0,4*7/12 =1 ցնցուղ:	
4. Լվացարանի պահանջվող մակերեսը`	
1 ծորակ` 15 մարդու համար, այսպիսով 5/15 =1 ծորակ:	
5. Սենդի ընդունման կետի պահանջվող մակերեսը ` 4 մարդուն 1 նստատեղ	

5/4 =1.25 1.25*4=5 մ²:
6. Տաքացման սենյակի մակերեսը
5 x / 0.1+0.2/ =1,5 մ ² :

7.Զուգարան` նորմաներով 30 մարդուն 1 անցք 5/30=1: Պահանջվող մակերեսները կարելի է նախատեսել ուղղաթիռային հարթակի վրա առկա շինության ներսում և ԲԿ-ում:

Կատարող				
				
«Հայնախագիծ» ԲԲԸ				
0025 Հայաստանի Հանրապետություն ք. Երևան, Զարենցի 1 Էլ. փոստ info@armproject.am				
Պատվիրատու				
«Վայոց ձորի ԲԿ» ՓԲԸ				
Նախագծի անվանումը				
«ՀՀ Վայոց ձորի ԲԿ» ՓԲԸ ուղղաթիռային հարթակի վերականգնման նախագիծ				
Փուլ	Մաս	Ալբոմ	Գիրք	Հատոր
ԱՆ	ՇԿ	1	-	-
Գծագրի անվանում				
Բացատրագիր շարունակություն				
Գծագիր	ՇԿ - 02	Էլ.ֆայլ	PC 100.02	
Մասշտաբ				
Կատարող բաժնի անվանումը				
ՆԳՃ		Ռ. Մամյան		
Բաժ. դեկ.		Գ.Սմբատյան		
Նախագծեց		ԱՊՂույան		
Ստուգեց		ՀՊՍողոմոնյան		
Պատվեր				
ՆՊ 001 - ՈՍ25				
ամսաթիվ	արխիվ. համար	գույքահամար		
Փոփոխություններ				
3				
2				
1				
0				
Էջ	2	ՖՈՐՄԱՏ		

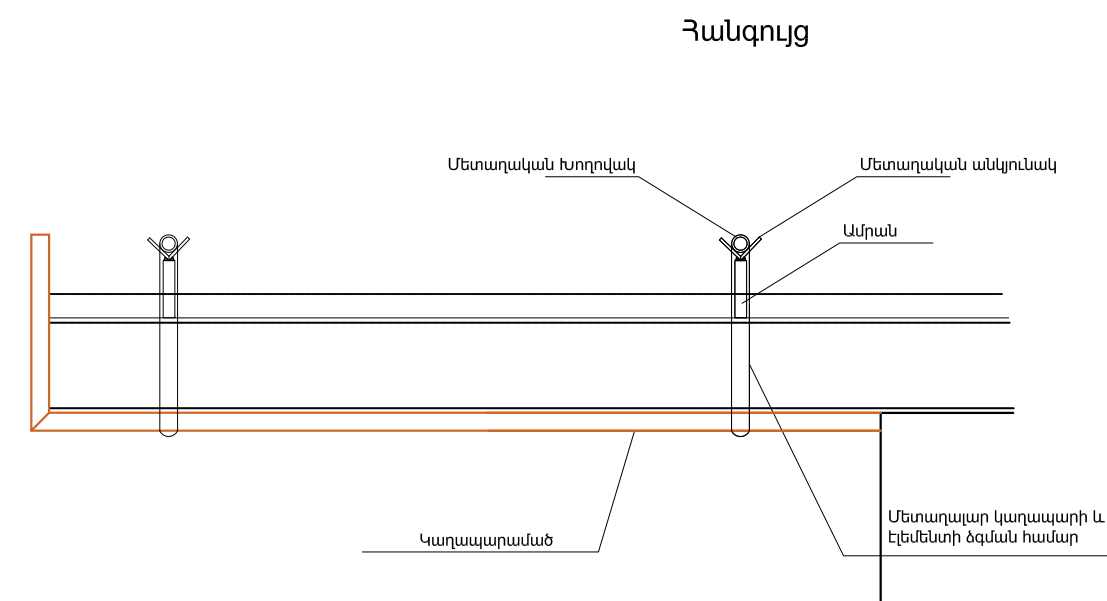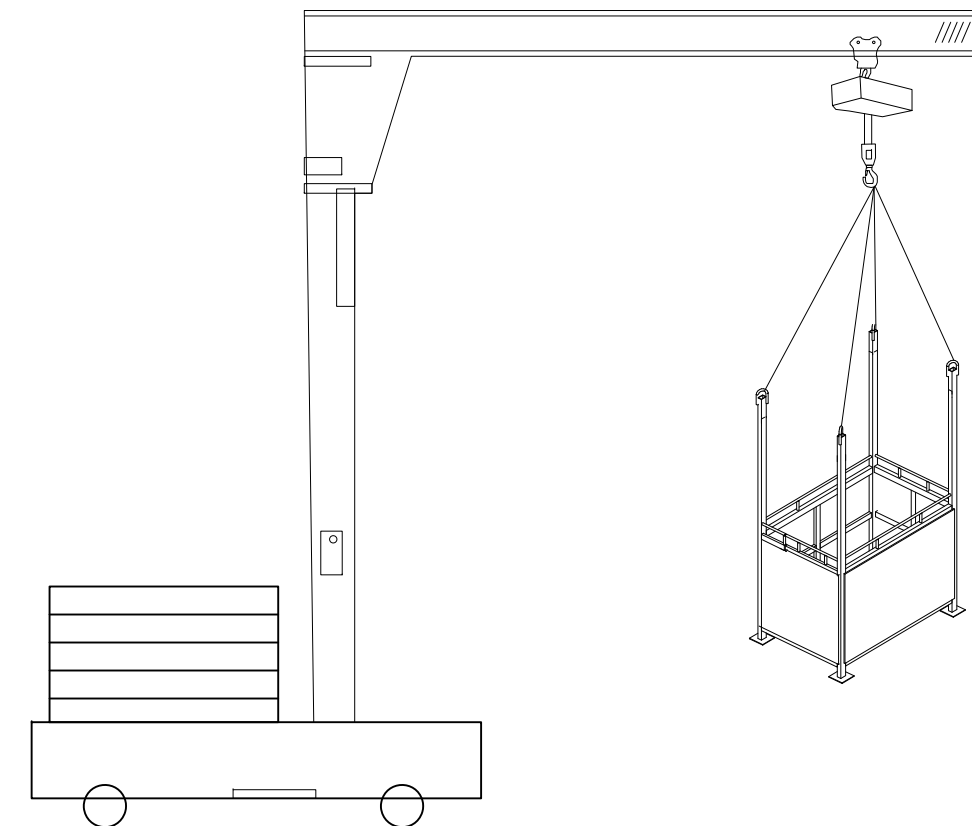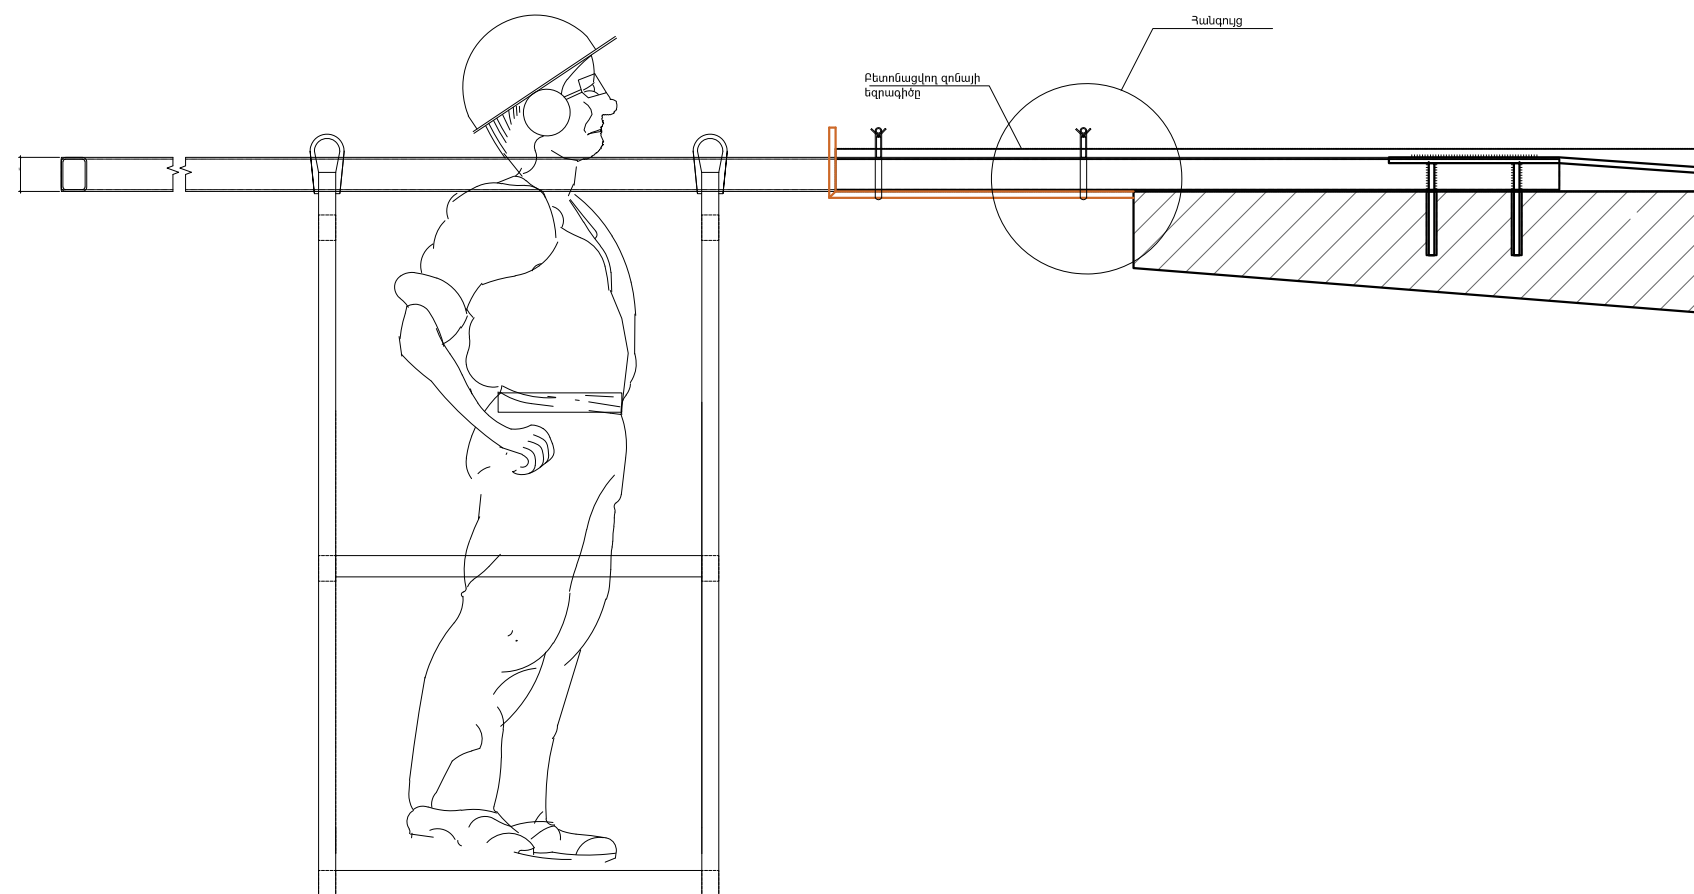

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ

0025 Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Չարենցի 1
Էլ. փոստ info@armproject.am

Պատվիրատու

«Վայոց ձորի ԲԿ» ՓԲԸ

Նախագծի անվանումը

«ՀՀ Վայոց ձորի ԲԿ» ՓԲԸ
 ուղղաթիռային հարթակի
 վերականգնման նախագիծ

Փուլ	Մաս	Ալբոմ	Գիրք	Հատոր
ԱՆ	ՇԿ	1	-	-

Գծագրի անվանում

ՇԳՅ՝ կադապարամածային
աշխատանքներ /I փուլ/

Գծագիր	ՇԿ - 03	ԷԼ.Ֆայլ	PC 100.03
--------	---------	---------	-----------

Մասշտաբ

Կատարող բաժնի անվանումը	
-------------------------	--


ԵԳԳ		Ռ. Մամյան
Բաժ. ղեկ.		Գ.Սմբատյան
Նախագծեց		Ա. Դուլյան
Ստուգեց		Հ.Սողոմոնյան

Պատվեր	ՆՊ 001 - ՌՄ25
--------	---------------


ամսաթիվ	արիսիվ. համար	գույքահամար

Փոփոխություններ	
-----------------	--

3			
2			
1			
0			
᠘᠒	3	ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠰ	



Էջ	3	ՖՈՐՄԱՏ	
----	---	--------	--

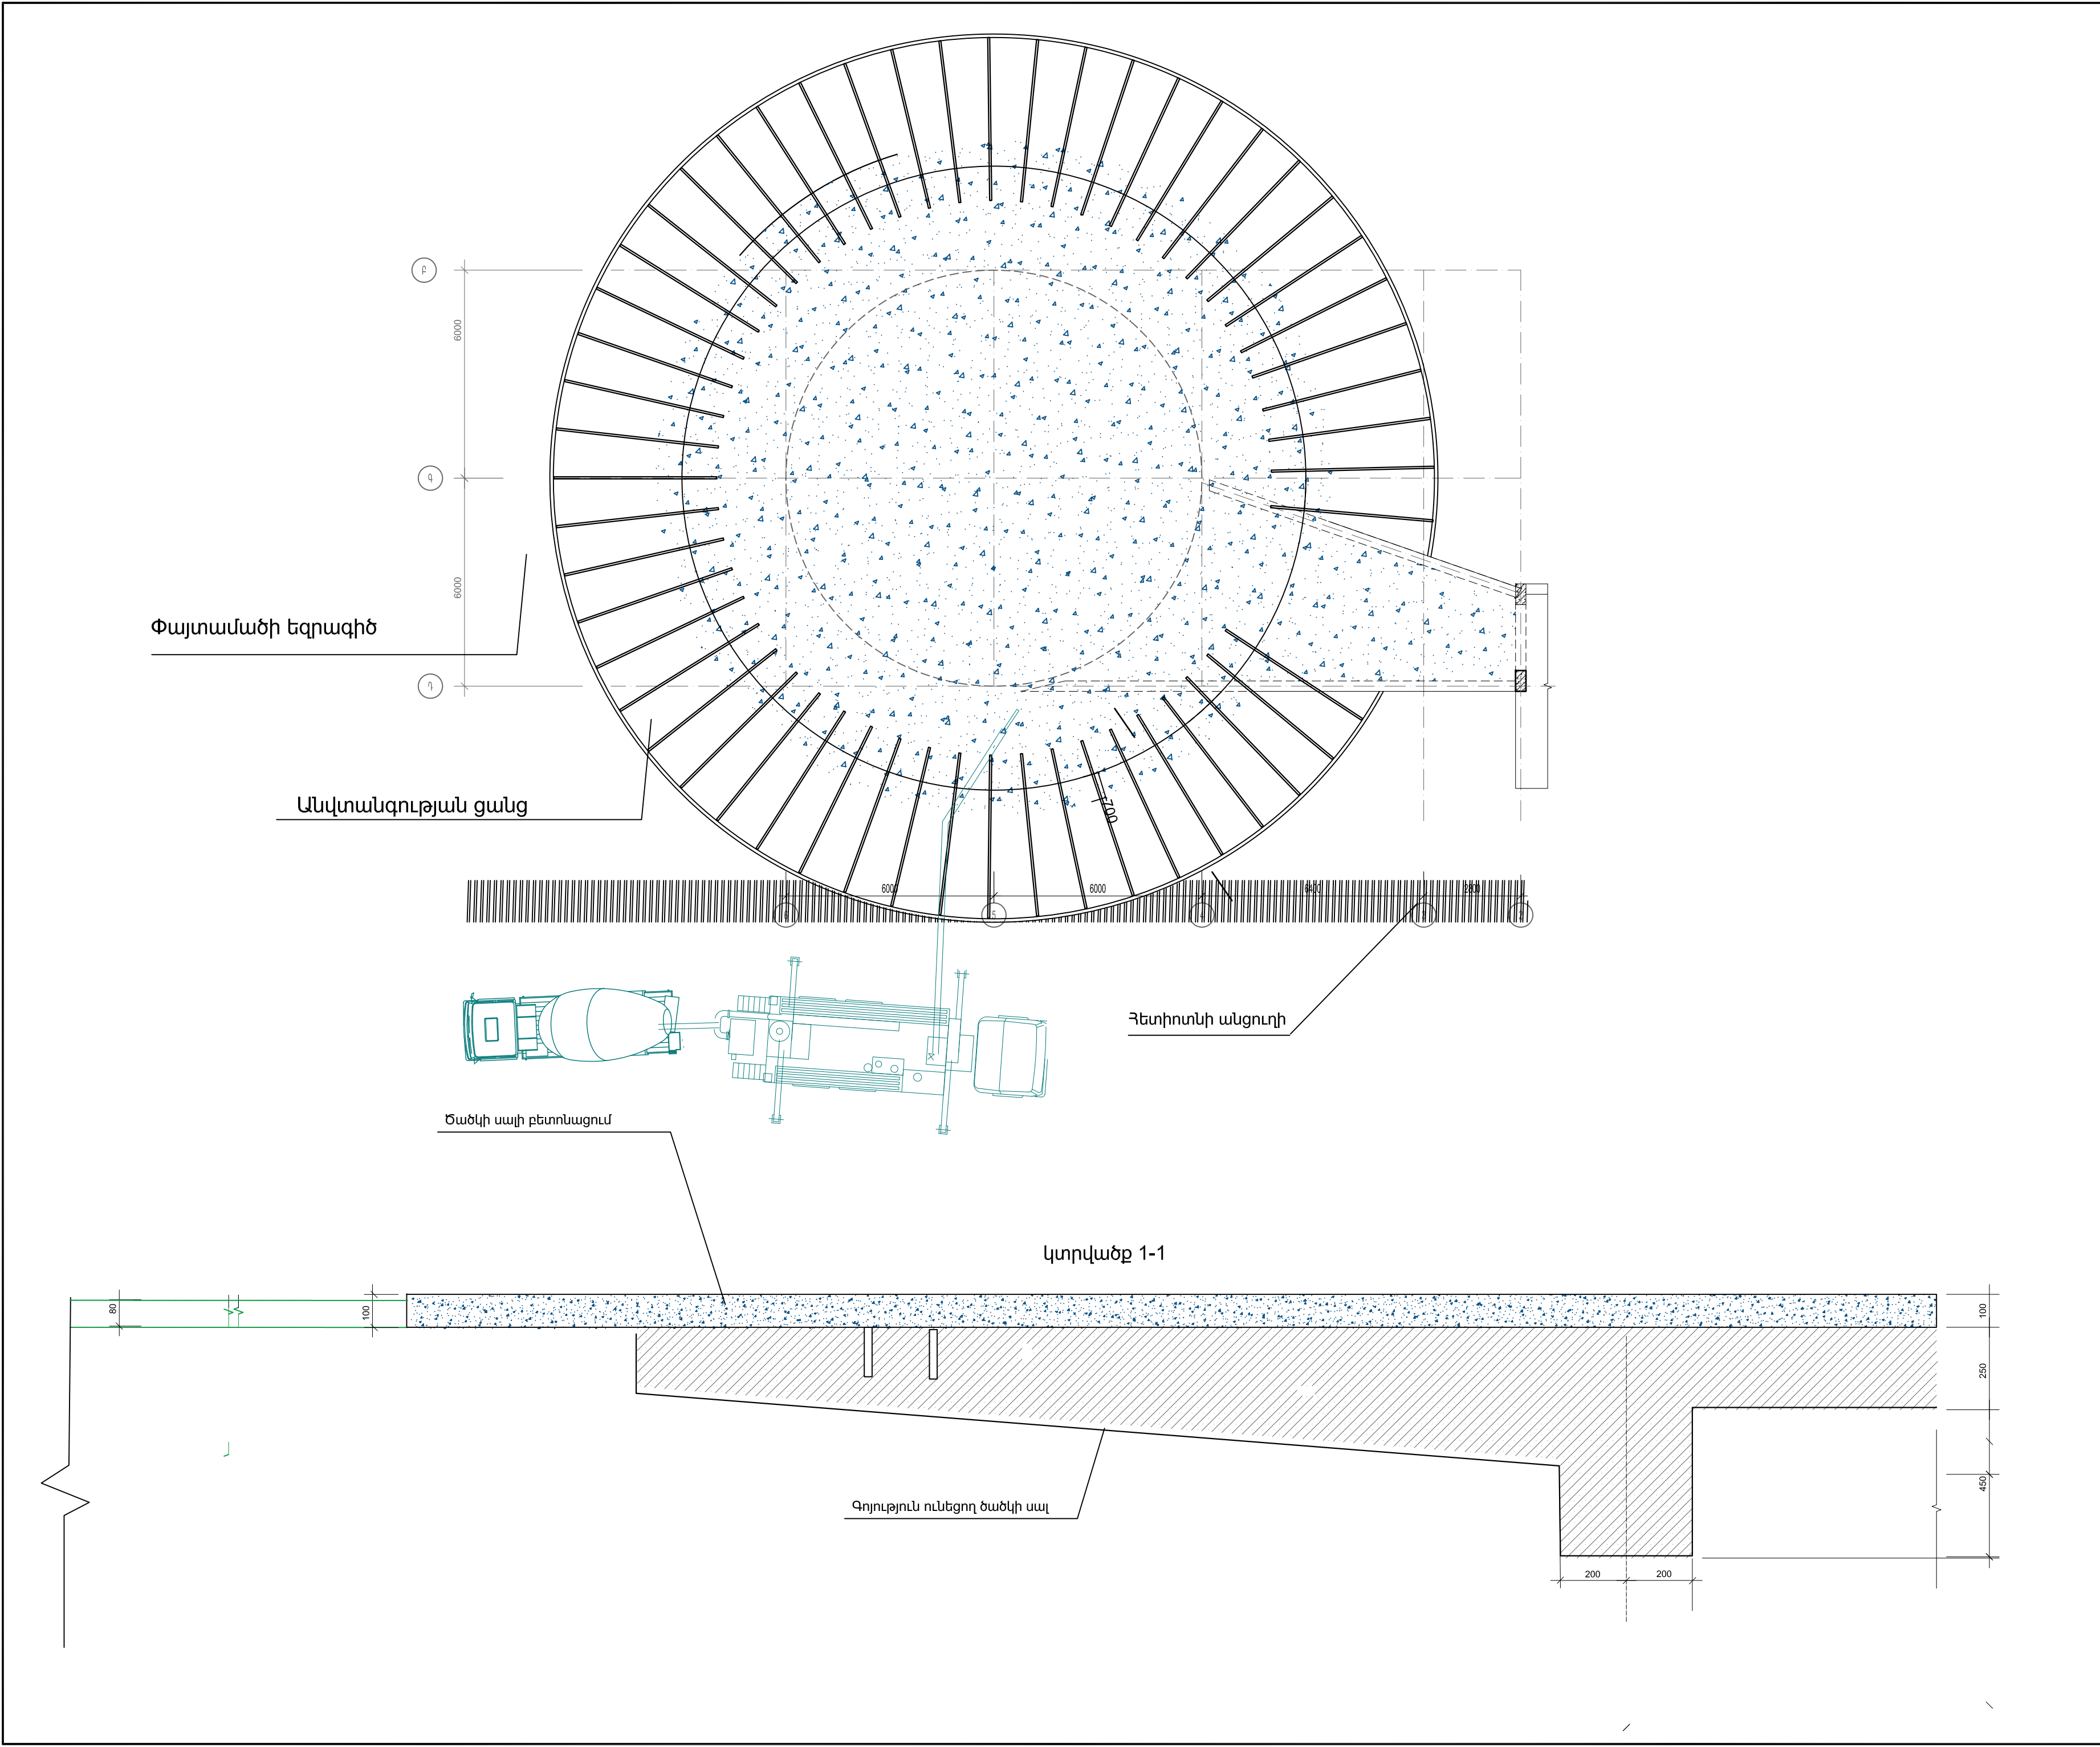

Կատարող



Հայաստանի Հանրապետության
Պարտապաշտության նախարարություն

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ

0025 Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Չարենցի 1
Էլ. փոստ info@armproject.am

Պատվիրատու

«Վայոց ձորի ԲԿ» ՓԲԸ

Նախագծի անվանումը

«ՀՀ Վայոց ձորի ԲԿ» ՓԲԸ
ուղղաթիռային հարթակի
վերականգնման նախագիծ

Փուլ	Մաս	Ալբոմ	Գիրք	Հատոր
ԱՆ	ՇԿ	1	-	-

Գծագրի անվանում

ՇԳՀ՝ տանիքի սալի բետոնացման
ավարտ

Գծագիր	ՇԿ - 05	Էլ.ֆայլ	PC 100.05
--------	---------	---------	-----------

Մասշտաբ

Կատարող բաժնի անվանումը

ՆԳՃ		Ռ. Մամյան
Բաժ. ղեկ.		Գ.Սմբատյան
Նախագծեց		Ա.Ղուլյան
Ստուգեց		Հ.Սողոմոնյան


Պատվեր

ՆՊ 001 - ՈՍ25

ամսաթիվ	արխիվ. համար	գույքահամար

Փոփոխություններ

3		
2		
1		
0		
Էջ	6	ՖՈՐՄԱՏ

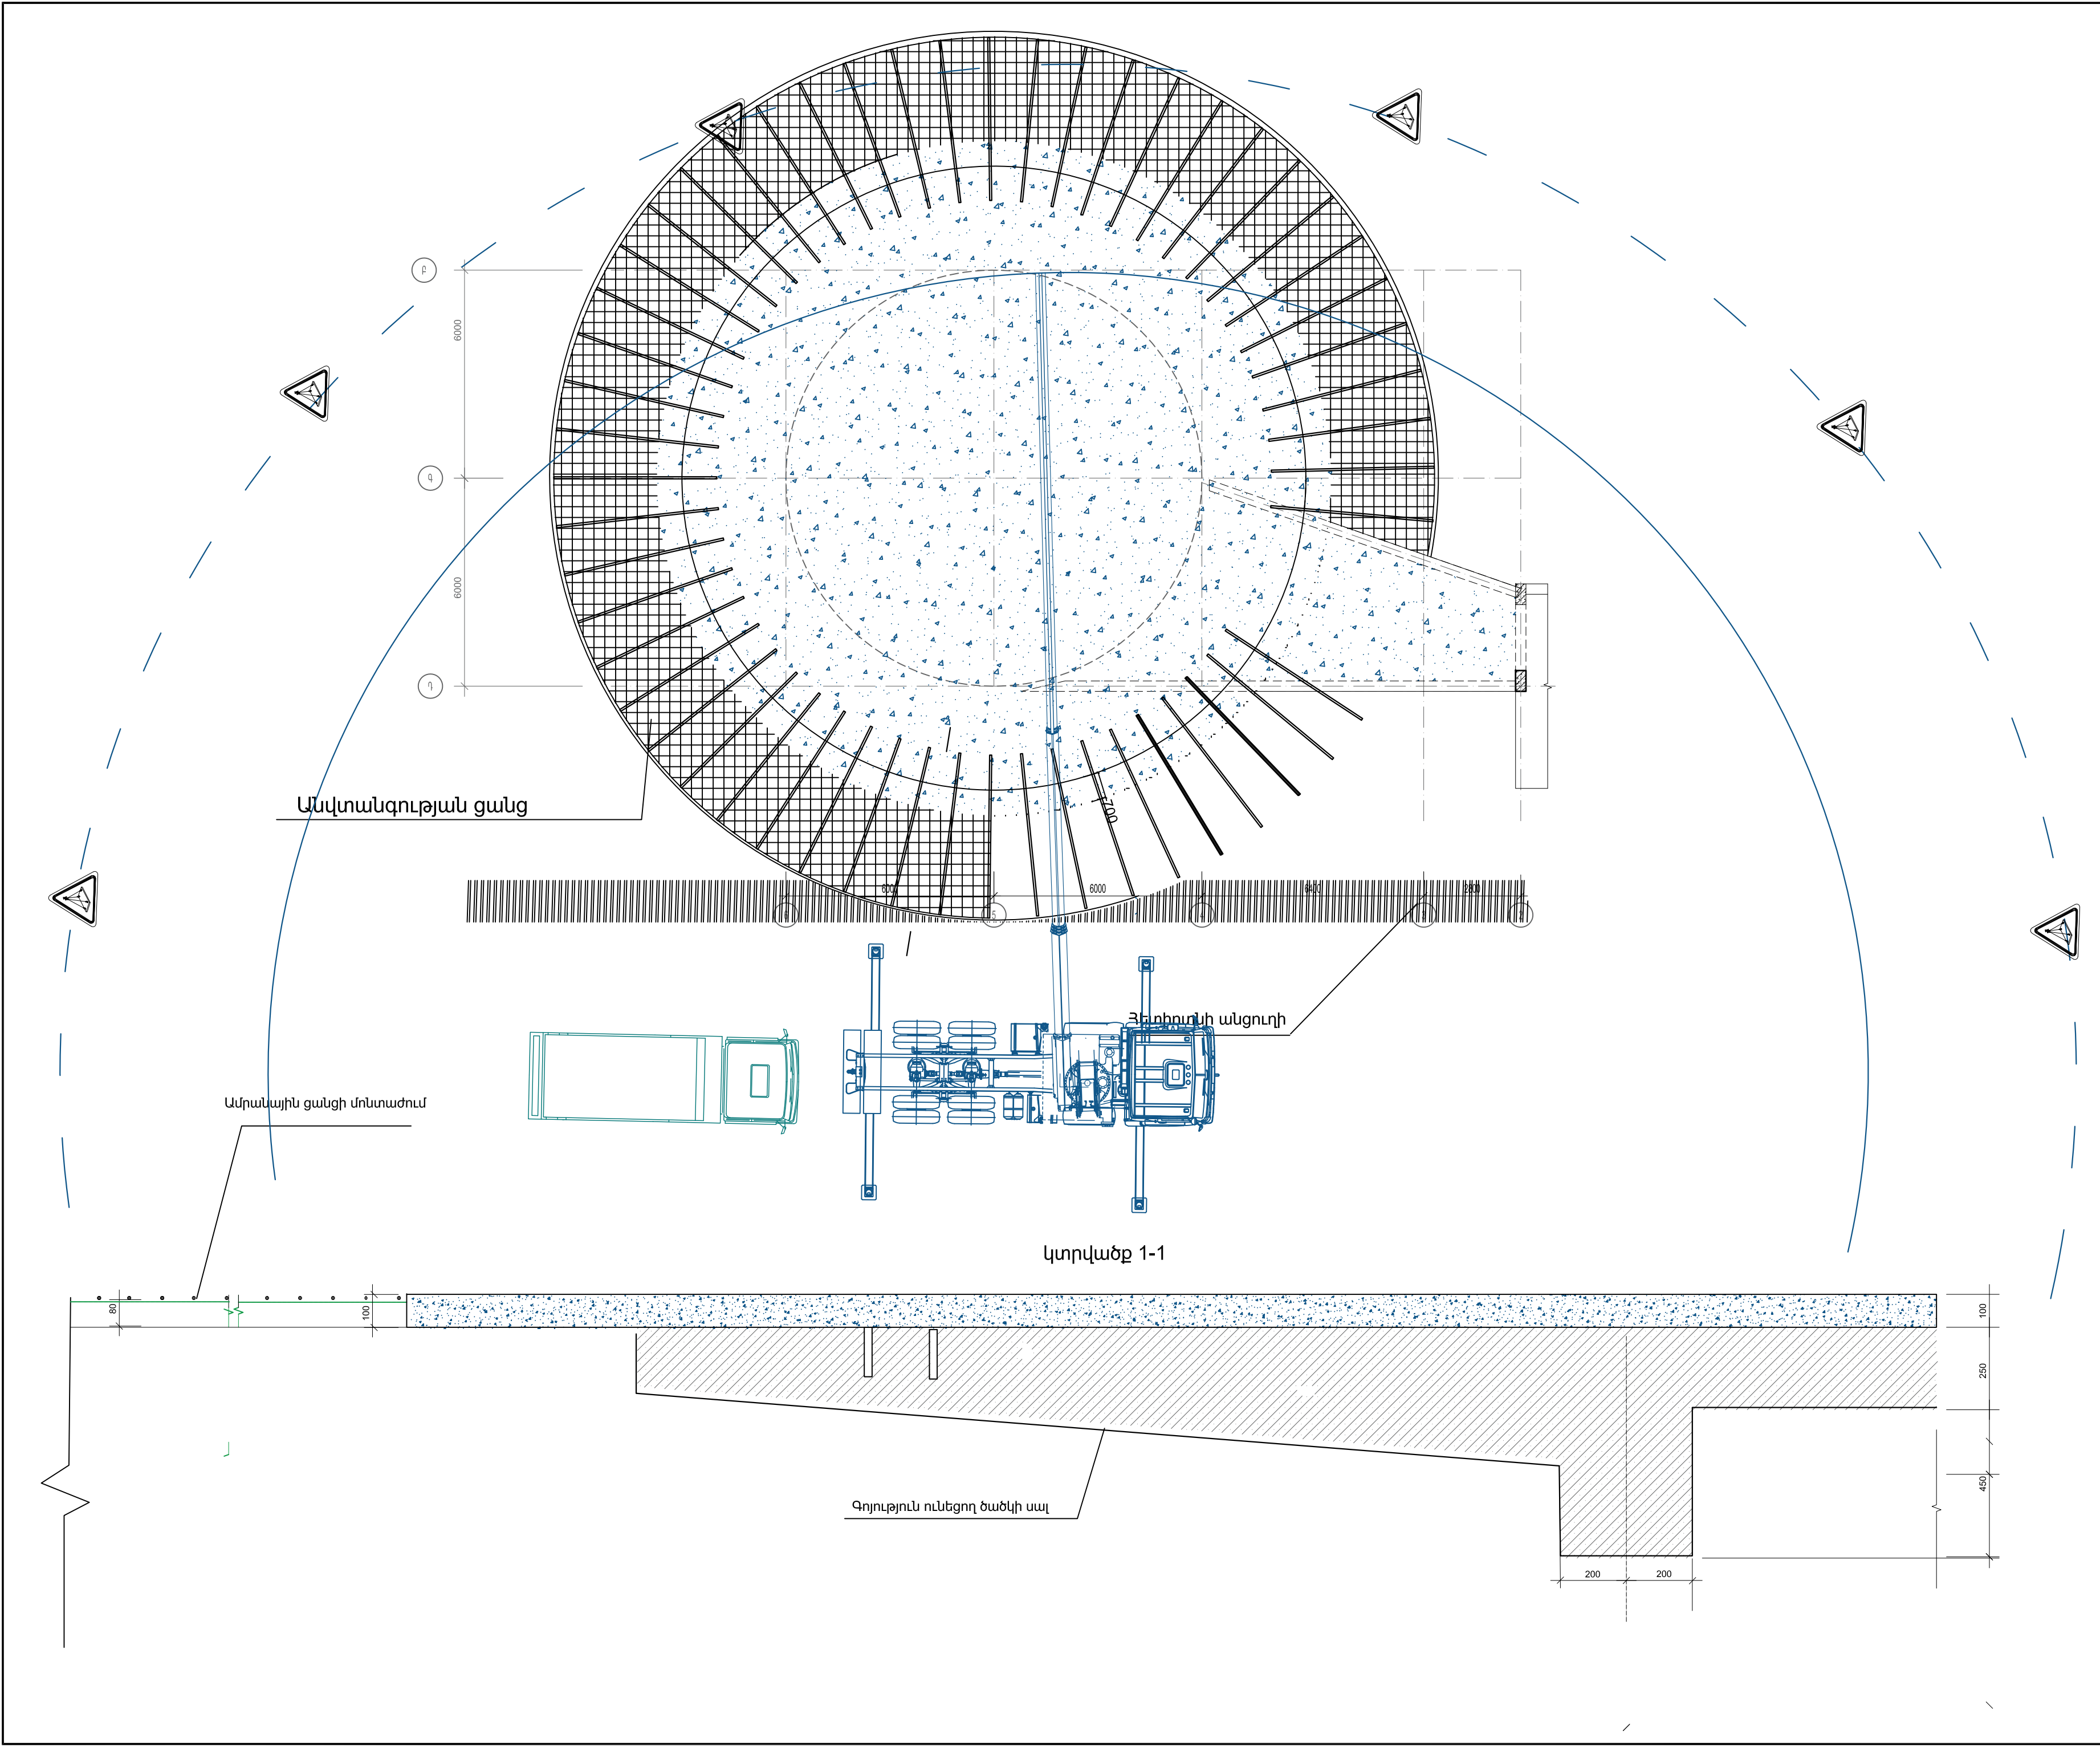

Կատարող



«Հայնախազիծ» ԲԲԸ

0025 Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Չարենցի 1
Էլ. փոստ info@armproject.am

Պատվիրատու

«Վայոց ծորի ԲԿ» ՓԲԸ

Նախագծի անվանումը

«ՀՀ Վայոց ծորի ԲԿ» ՓԲԸ
ուղղաթիռային հարթակի
վերականգնման նախագիծ

Փուլ	Մաս	Ալբոմ	Գիրք	Հատոր
ԱՆ	ՇԿ	1	-	-

Գծագրի անվանում

ՇԳՀ՝ անվտանգության ցանցի
մոնտաժում

Գծագիր	ՇԿ - 06	Էլ.ֆայլ	PC 100.06
--------	---------	---------	-----------

Մասշտաբ

Կատարող բաժնի անվանումը

ՆԳՃ		Ռ. Մամյան
Բաժ. ղեկ.		Գ.Սմբատյան
Նախագծեց		Ա.Ղուկաս
Ստուգեց		Հ.Սողոմոնյան

Պատվեր

ՆՊ 001 - ՈՍ25

ամսաթիվ	արխիվ. համար	գույքահամար

Փոփոխություններ

3		
2		
1		
0		
Էջ	6	ՖՈՐՄԱՏ

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԿ-Ի ՈՒՂՂԱԹԻՌԱՑԻՆ ՀԱՐԹԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ	Խումբ ը	Աշխատանքների անվանումները	Չ,մ.	Ծավալը	Հիմնավորումը	Աշխատատարությունը		Բանվորների թիվը	Ցնողություն, օր	I ՏԱՐԻ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Նորմա, մ-ժ	Ընդհանուր, մ-հերթ			I ամիս												II ամիս												III ամիս																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72		74	76	78	80	82	84	86	88	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	Ա	Նախապատրաստական աշխատանքներ					24	4	6	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Բանվորների առավելագույն քանակը 7 մարդ:

Կատարող



Հայաստանի Հանրապետության
Ճարտարապետության
Գործընկերություն

«Հայնախագիծ» ԲԲԸ

0025 Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Չարենցի 1
Էլ. փոստ info@armproject.am

Պատվիրատու

«Վայոց ձորի ԲԿ» ՓԲԸ

Նախագծի անվանումը

«ՀՀ Վայոց ձորի ԲԿ» ՓԲԸ
ուղղաթիռային հարթակի
վերականգնման նախագիծ

Փուլ	Մաս	Այբոմ	Գիրք	Հատոր
ԱՆ	ՇԿ	1	-	-

Գծագրի անվանում

Աշխատանքների կատարման
ժամանակացույց

Գծագիր

ՇԿ - 07

Էլ.ֆայլ

PC 100.07

Մասշտաբ

Կատարող բաժնի անվանումը

ՆԳՃ		Ռ. Մամյան
Բաժ. ղեկ.		Գ.Սմբատյան
Նախագծեց		Ա.Ղուկաս
Ստուգեց		Հ.Սողոմոնյան
Պատվեր		
ՆՊ 001 - ՈՍ25		
ամսաթիվ	արխիվ. համար	գույքահամար
Փոփոխություններ		
3		
2		
1		
0		
Էջ	7	ՖՈՐՄԱՏ
