

« ԹՈՒՆՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿԹ » ՍՊԸ




« TOKHUNTS PROJECT » LLC

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/59»

ԵՐԵՎԱՆ 2024

« ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿԹ » ՍՊԸ



« TOKHUNTS PROJECT » LLC

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ
ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ

ՆԳՃ՝

Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ

ՆԳԿ՝

Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2024



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001720, 3-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-10-30, «ԹՈՒՆՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐՔ, ԳԱԼՇՈՅԱՆ Փ., 38, 12 ԲՆ.

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGE2-4637-BA84-FF8B

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքետումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001720-08

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԹՈՒՆՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՅԵՐ, ՀԻԴՐՈՍԵԼՈՐԱՑԻԱ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

30.10.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG97-624D-728E-7D9D

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԳԱԳԻԿ ՄԱԴԱԹՅԱՆ	<	001986	2024-09-13



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG97-624D-728E-7D9D
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՃԲԴ - Ա-043

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ԲԱԲԱՅԱՆ ՀՐԱՉ ՀԱՄԱԵՏԻ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացման առանց սահմանափակումների,
բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի,
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման,
ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

(Signature)

ՏՐՎԱԾ Է 22.02.2019
ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ԶԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ Ա. ԴՈՒԼԱՐՅԱՆ



ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ
ԵԳԵԹԱՆ ԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ.
ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ
ԵԳԵԹԱՆՈՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ



ԿԵԴ -Ա2-011

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա2»

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

ՀՈՎԱՏԵՓՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐՈՒՄ

Սահմանափակումներ՝ Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 3 հարկից, մինչև 12մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 15մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ, որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին:
Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 6 հարկից, մինչև 21մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 24մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ, որոնք համապատասխանում են միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանին:
Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Ս. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ս. Մինասյան

ՀՀ ԶԱՂԱԶԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ՝ Ա. ԴՈՒԼԱՐՅԱՆ



ՏՐՎԱԾ Է 15.03.2019
ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵԶ-ԲՄԽԱՇՁԶԲ-24/59 ԿՆՔՎԱԾ ՊԼՅԱՄԱՆԱԳՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՊԼՀԱՆՋՆԵՐԻՆ : ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱԶՄՎԵԼ Է ՏԵՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓԱՏԱՏՅԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԱԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ : ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՊՈՂՈՍԱՅԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ, ԽՈՐԵՆԱՅԻ ԵՎ ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՅՑՆԵՐԻ ՄՈՏ 3860Մ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ :

1 ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԻՄԱՆԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ.

- ՏԱՐԱԾՔԻ ԱԶԱՏՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
- ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ԵՎ ՇԻՆԱԳԻԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 15ԿՄ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲԱՎԱՅՐ
- ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ ԵՎ ՊԼԱՆՎՈՐՈՒՄ
- ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱԼՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՏԵՂԱԳՐՈՒՄՈՎ ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ.
- ՀՈՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ Ե/Ր ԿԼՈՐ ԵԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻՑ
- ԲԱԶԱԼՏԵ ԵՎ ՏՈՒՖԵ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԳՐՈՒՄ
- ՄԱՅԹԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ (ԵՄԿԱՐԴԱ) ԵՎ ՏՈՒՖԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ
- ՓԱՅՏԵ ՆՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԳՐՈՒՄ
- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԻՏԱՆԻ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿԵԼ ԵՎ ՎԵՐԱՏԵՂԱԳՐԵԼ

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հիմնարարո՞թցան ԿԱԶՄԿԵՐՊՈՒՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԸՆԿԱԾ ԵՆ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ «ԳԾԱԳԻՐԸ», ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՎ ՆՐԱ ՇՐՋԱԿԱՑՔԻ ՈՒՄՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ, ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՅՏԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՄԻԱՎՈՐ ԳՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՐԸ ՈՐՈՇԵԼԻՄ. ՊԵՏՔ Է ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԻ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԿԵՐՊՈՒՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԱՎԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱԽՍԵՐԸ :

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՈՇՎԱԾ Է ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՎ, ԲԱՅՑ ԿԱՐՈՂ Է ՃՇՏՎԵԼ ՊԵՏԱԻՍՏՈՒՆ ՀԵՏ :

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ՊԵՏՔ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾԻ ՇԻՆԱՐԱՐԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՅՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՆՇՎԱԾ ԵՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴԻՐԻ ԱՅՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՆԱԽԱԳԾՈՎ : ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԱՋԱՐԿԵԼ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՅՄԱՆՈՎ, ՈՐ ԱՅԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՐԱԿԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԻ (ԿԱՄ ԼԻՆԻ ԱՎԵԼԻ ԲԱՐՁՐ) ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՏՐՎԱՆԵՐԻՆ : ԱՅԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎ ՊԵՏԱԻՍՏՈՒՆ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ՀԵՏ : ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ԴՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎ ՊԵՏԱԻՍՏՈՒՆ ՀԵՏ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԸ :

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՕԲՅԱՅՏԸ ԾԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄՈՆԻԹՐՈՒՆԳ ԵՎ ՅԱՌՈՂՈՒՄ՝ ՊԵՏԱԻՍՏՈՒՆ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԱՄՈՁՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԵՏ :

3. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

ՇՈՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՄ ԱՆՀՐԱՎԺԵՇՏ Է ՂԵԿԱՎԱՐԵԼ ՀԵՏԵՎՑԱԼ ԴՐՈՒԹՅՆԵՐՈՎ (ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԵԼ ԱՑԴՔԱՆՈՎ)

- ԿԱՏԱՐԵԼ ԲՈԼՈՐ ԱՑՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ, ՈՐՈՒՔ ԿԱՊԱԿԱԾ ԵՆ ՇՈՒՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԽԱՆԳԱՐՈՂ ԱՌԿԱ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻՄԵՆՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ԿԱՍ ՄՇԱՍԿԱՆ ՏԵՂԱՓՈՒՄԱՆ ՀԵՏ
- ՀԱՍԱԶԱՑՆԵՑՆԵԼ ՇՈՒՆԱՐԱՊԱՐԱԿԻ ՇՈՒՐՋ ԳՏՎՈՂ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ԲՆԱԿԻԶՆԵՐԻ ՀԵՏ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻՄԵՆՏԻ ԱՆՁԱՄԱՍՏԻ ՄԵՇԱՄԱՆԿԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ, ՈՐՊԵՍՁԻ ԶԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՍՑՐԱԾ ԱՆՀՐԱՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼԻՆԵՆ ՓՈՔՐԱԳՈՒԹՅՆ
- ՇՈՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ԱՐԿԱՆԱՄԱՆ ԲԱԵՐՈՎ ՓՈՇԻՆ ԶՉԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
- ՇՈՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԸ ՏԵՂԱՓՈՒՆԵԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԶԱՑՆԵՑԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍ ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է
- ՇՈՒՆԱՐԱՊԱՐԱԿԻ, ՇՈՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ, ԲԱՆԿՈՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵՐԻ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՑԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՈՒ ՇՈՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԱՆՑԱՏԵՂԸ ԿԱԶՄԱԿԵՊԵԼԻՄ, ՃՇՏԵԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԳՈՏԻՆԵՐԸ, ՈՐՏԵՂ ՄՇԱՊԵՍ ԱՌԿԱ ԵՆ ԿԱՍ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԼԻՆԵԼ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
- ՄՇԱՊԵՍ ԱՌԿԱ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԱՐՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԿՈՂՄԱԿԻ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄՈՒՏՔԸ ԿԱՆԻԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԵՏՔ Է ՏԵՂԱԴՐՎԻ ՇՐՋԱՓԱԿԻԶՆԵՐ (ՎՏԱՆԳԱԶԵՐԾՈՂ)

4. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնարարողութեան ընթացքներու շրջակայ տեղակայութի վրա Ազդեցնութեան ԱՍՏԻՃԱՆԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ԵՎ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԻՐԱՎԱՆԱՅՎԵԼ Է ՈՒՂԱԿԻ ՊԱՐԶ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ:

Հիմնարարութեան եւ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼՆ ԵՆ.

- ՃԱՆԱՊԱՐԸԻՑ, ՀԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ԵՎ ԲԵՌՆԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵԲԵՆԱՆԵՐԻՑ ԲԱՐՁՐԱՑՈՂ ՓՈՇԻ,

- ՀԻՆ, ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՋՈՒՐ,

- ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՈՒՄ,

- ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՈՐՈՆՔ ՎՆԱՍ ԵՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ (ԿԱՊԱՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՆԵՐԿԵՐ, ԱՍԲԵՍ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ),

- ՀԻՆ ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ,

- ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ,

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՅՅԱԼ ՀԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԴՐՎՈՒՄ Է ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿԻԶՎ ՎՐԱ:

ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՂ ՀԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՑՄԱՆԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՂ:

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԵՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՅ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՑԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԱՆ	1	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՅ ՓՐՈԶԵԶԹ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

5. ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԸ ՄԻՆԶԵՎ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՎՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՑԱՑՆԵԼԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է՝

- ՄԱՆՐԱԿՐԿԻՏ ՁԵՒՈՎ ԵՄՆՈՒԹԱՆԱԼ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻՆ, ՆՐԱՑՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻՆ ԵՎ ԵՎԱԿԱԼՆԵՐԻՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԵԻՆ, ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՐԻ ՈՂՋ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ:
- ՃՇՏԵԼ ԿԱՌՈՒՑՑԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՏԵՂՈՒՄ ՌՈՐԱՊԵՍ ՌԻՍՈՒՄՆԱՄԻՐԵԼ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎԱԿԱԼՆԵՐԸ, ՆՐԱՑ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԵԱԼ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԹՓԱԿԱՆ ԿԱՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԵԼԻՔ ՈՒԺԵՐՈՎ, ԵԼՆԵԼՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀՁՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՎՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻՑ:
- ՊԱՐԶԵԼ ԱԾԽԱՏԱՆՔԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ, ՏԵՂԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴԺԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ԱՌԱՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱԼ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԳՆԻ ՎՐԱ :
- ՊԱՐԶԵԼ ԾԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՕՔՅԵԿՏՆԵՐԻՆ ՄՈՏԵՆԱԼՈՒ, ԾԽՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՋՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՊԱՀԵՍԱՑՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՋՐԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՆՆԵՐԸ :
- ՊԱՐԶԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿՎՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ, ԱՅՐ ԹՎՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴԱԳԾԵՐ, ՋՐԱԳԾԵՐ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԾԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ :
- ՀԱՇՎԵ ԱՌՆԵԼ ՈՐ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՒՄ Է ՆԱԵՎ ՀՀ ՕՐԵՆՄԴՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՐԿԵՐԻ, ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ, ԻՆԶՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ :
- ՎԵՐԸ ՆԾՎԱԾ ԵՆ ՌԻՍՈՒՄՆԱՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՑ ՎԵՐԼՈՒԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻԶ ԾԱԽՍԵՐԸ ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՅՑԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՄԻԱՎՈՐ ԳՆԵՐԸ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ ՈՐՈՇԵԼԻՄ :

6. ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՄԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԻՄ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ, ԿԱՇՄԱԿԵՐՊԵԼ ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՒՄԸ :

ԽՄԵԼՈՒ ՉՈՒՐԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՄԽԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ :

ՆՐԱ ՍԱԿԱՎՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ՏԵԽՆԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԱՐԱՊԱՏՈՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՄԱՆ ՍԱՌԿՈՒՄԵՐԻՑ ԸՅՈՑ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ ՆԱԵՎ ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՄՈՏԱԿԱ ԱՅԼ (ՋՐԵՐ ՍՈՐՈԳԵՏՆՅԱ, ԳԵՏԻ, ԱՎԱԶԱՐԻ ԵՎ ԱՅԼԸ) ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՋՐԱՏԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՐ :

7. ԾԻՆՀՐԱՊՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՈՒՄ

ԿԱՊԻՏԱԼԱՌՈՒՄԻ ՊԵՐՏԱԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵՋ Է ՄՏՆՈՒՄ, ՊԵՐՏԱԿՐԱՏՈՒՄ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՄԱՁԱՅՆՅՈՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՅՈՎԱԾ ՏԱՐԱԾԻ ՄԱՔՐՈՒՄԸ ԱՐՄԱՆՆԵՐԻՑ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԱՂԲԻՑ ԵՎ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ :

ՊԵՐՏԱԿՐԱՏՈՒՄ ԻՐԱՎՈՒՄԸ ՈՒՆԻ ԱՆԱՐԳԵԼ ՍՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՍՏԱՐԳՈՒՄՆԵՐ :

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ, ԿԱՊԻՏԱԼԱՌՈՒՄԻ ՊԵՐՏԱՎՈՐ Է ԻՐ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱԾԿԻՆ ԱՆՀԱՊԱՂՈՐԵՆ ՎԵՐԱՑՆԵԼ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑ (ԿԱՄ ԲՈՒՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ) ՊԵՐՏԱԿՐԱՏՈՒՄ ՊԵՐՏԱՎՈՐ :

8. ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԸ

[illegible]

9. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

ԿԱԴԱՆԱՌՈՒՄԻ ՊԱՐԱՎՈՐ Է ԱՊՐԱՇՆՈՒՄԻ ԾԻՆՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՎՈՐ ԳՏՆՎՈՐ ԻՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱՊԵՇՏ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ ՕՐԵՆՍՊՐՈՒԹՅԱՆ :

ԿԱԴԱՆԱՌՈՒՄԻ ԻՐ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՊԵՏՔ Է ԿԱՌՈՒՑԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱԿԱՐԴԵՀԱՅԻՆ ԿԵՏԵՐ ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻ ՀԱԿԱՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ :

ԿԱԴԱՆԱՌՈՒՄԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ԻՐ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՊԵՏՔ Է ԻՐԱԿԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՑԱՆԿԱՊԱՏ, ՈՐԸ ՊԵՏՔ Է ԸՆԴԳՐԿԻ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ԱՄԲՈՂ ՏԱՐԱԾՔԸ : ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՐ ՑԱՆԿԱՊԱՏՆԵՐԻ ՏԵՍՔԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ : ԱՅՆ ՊԵՏՔ Է ԲԱՑԱՌԻ ԱՅՆ ԱՆՁԱՆՍ ՄՈՒՏՔԸ ԾԻՆՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՎՈՐ : ԾԻՆԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲՈՂՁ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՁԱՆՈՒՄ, ՄԵԿԱՐԿԻ ՕՐԱՎԱՆԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ՆԱԽԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄԸ, ԿԱԴԱՆԱՌՈՒՄԻ ՊԱՏՄԱՆԱՆՏՈՒ Է ԻՐԱԿԱՆԱՅՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՍԱՐՔԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ : ԾԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՉԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՄԻՋՈՑՈՒՄ ՏԱՐԲԵՐ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ ՆՐԱ ԿՐԱԾ ՎՆԱՍՐ ԾԱԾԿՈՒՄ Է ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱԾՎԻՆ, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԵՊՔԵՐԻ :

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարական Տրվածությունները Օբյեկտի Պետք է Մտնեն Եվ Դրան Փայլ ՄԱՔՈՒՐ ՎԻՃԱԿՈՎ՝
ԶԱՂՏՈՏԵԼՈՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՇԻՆ. ԱՂԲՈՎ :
2. Շինարարական ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԻ **"ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕМОНТЕ И
СОДЕРЖАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 1993-01-01 "** ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻՆ:
3. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՆՇԱԳԾՈՒՄՆ ՈՒ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀԱՄԱԶԱՅՆ **ГОСТ Р
52289-2000:**

- ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԿԱԶՄԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ:

- ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԸ ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐԵԼ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔՈՎ, ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՈՒՄ Է ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ ԿԱՄ ՆՐԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԱՆՁԸ:

- ԱՍԲՈՂՋ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ

1. ՕԲՅԵԿՏԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՏԵՍՔԻ ՊԱՏԿԵՐ
2. ՃՀԱ ՏՐԱՍՄԱԴՐՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ ԵՎ ՀԱՄԱՐԸ
3. ՇԻՆ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԸ ԵՎ ԱՄՍԱԹԻՎԸ
4. ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆԵՆՐԻ ՍԿԻԶԲԸ ԵՎ ԱՎԱՐՏԸ
5. ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂԻ /ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ/ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
6. ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
7. ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ


ՑՈՒՑԱՆԱԿ

በተገናኝቦት

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՀԵՏ:


- Շինարարական կազմակերպության վարպետ-գործավարները, մասնագետները պետք է ունենան աշխատանքների բնույթին համապատասխան թույլտվություններ, 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային փորձ:
- Կատարված աշխատանքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետը նորմալ շահագործման, ընթացիք վերանորոգման պայմաններում սահմանվում է.
- բետոնե և երկաթբետոնե աշխատանքներ՝ 30 տարի
 - հարդարման աշխատանքներ՝ 5 տարի
 - կոմունիկացիաներ՝ 15 տարի
 - քարեկարգում՝ 10 տարի
- Պատվիրատուն շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովի մշտական տեխնիկական հսկողություն՝ շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության հրահանգին համապատասխան: Շինարարական աշխատանքների սկսման պահից մինչև ավարտը պետք է իրականացվի հեղինակային հսկողություն:

Կազմեց՝  Լ. Լոպսեփյան

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՜ՆԻՔԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ	ԱՆ	4	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

	ՏԵԽՆԻԱԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԻՊԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	ԷՔՄԿԱՎԱՏՈՐ	ԲԱՀԻ ԾԱՎԱԼԸ 0.30Մ³	1
2	ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԿՈՌԻՆԿ Լ-32Մ	ԲԵՌՆԱՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ-32Տ	1
3	ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱՓ	ԲԵՌՆԱՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ-15Տ	1
4	ԲԵՏՈՆԱԽԱՌՆԻՉ	ԾԱՎԱԼԸ-10-12Մ³	1
5	ԱՍՖԱԼՏԱՏԵՂԱԴՐԻՉ	ՈՉ ՊԼԿԱՍ ՅՄԿԱՐԱՎՈՐՈՂ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄՔ	1
6	ՋՐԻ ՄԵՔԵՆԱ	ՑԱՆԱԿԱՑԱԾ	1
7	ՉԵՌՔԻ ԳԼԴՈՆ	ՑԱՆԱԿԱՑԱԾ	1
8	ԳԼԴՈՆ 2Տ-4Տ	ՊՆԵՎՄԱՆՎԱՎՈՐ	1
9	ԳԼԴՈՆ 9Տ-11Տ	ՊՆԵՎՄԱՆՎԱՎՈՐ	1
10	ԱՎՏՈԳՐԵՅԴԵՐ	ՑԱՆԱԿԱՑԱԾ	1
11	ԱՍՖԱԼՏՖՐԵՉԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱ	ՑԱՆԱԿԱՑԱԾ	1

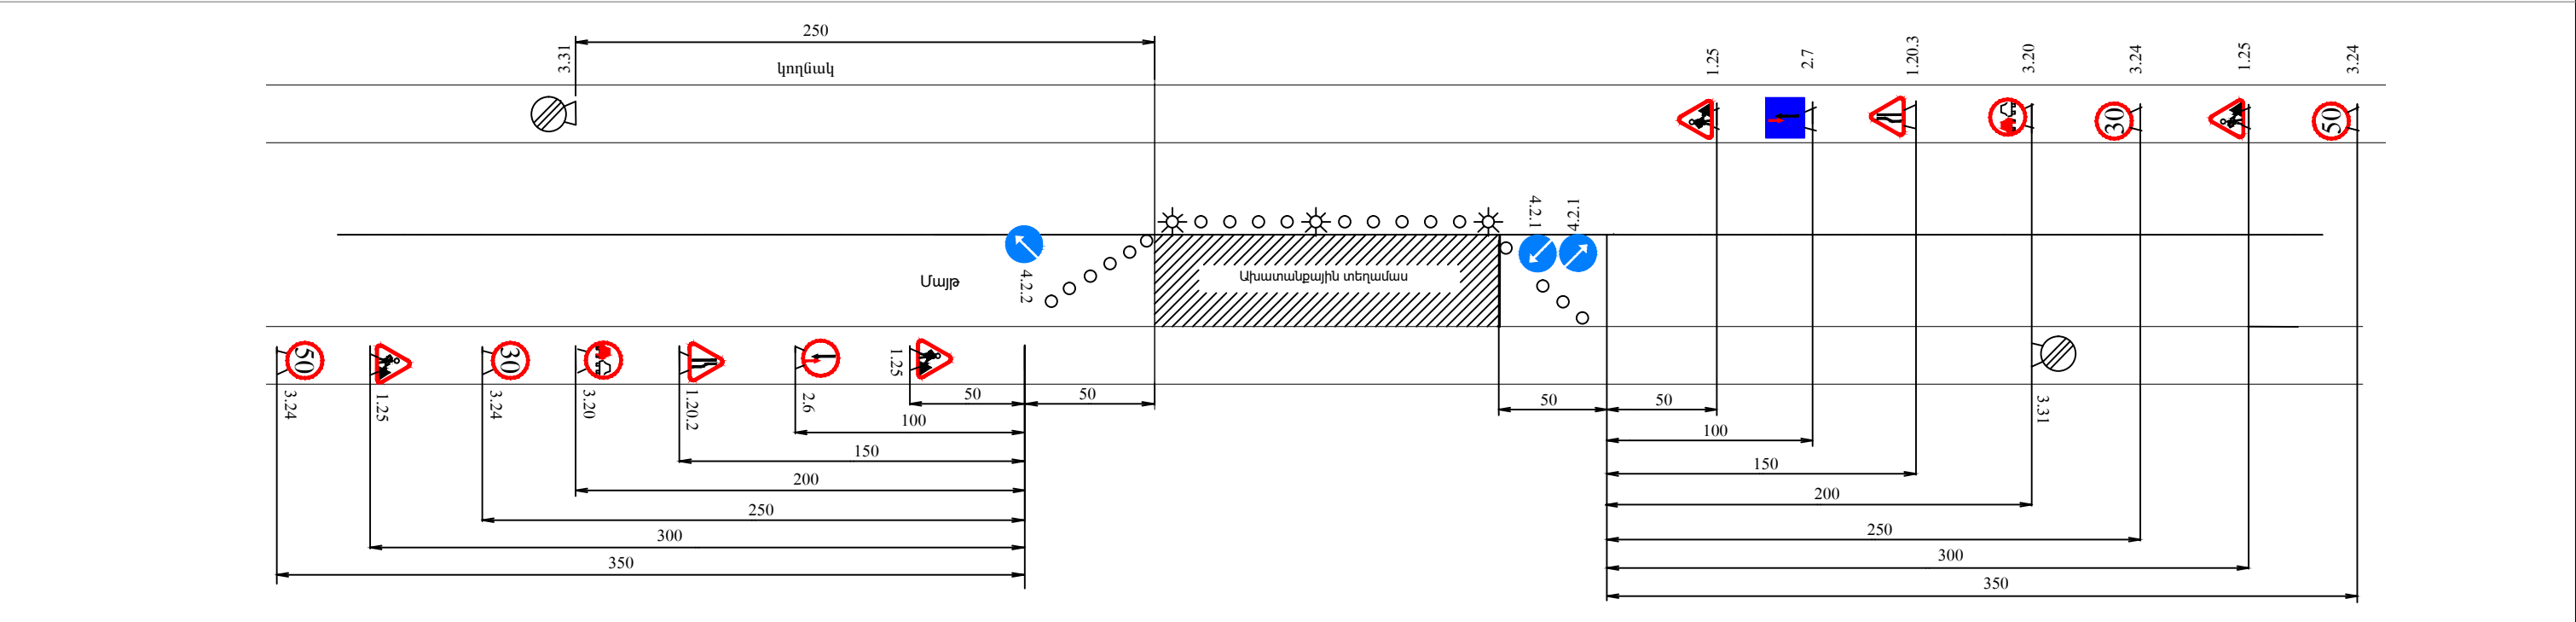

Մեծադական պատմեղների տեղադրման աշխատանքները պետք է իրականացվեն պաշտպանիչ ցանցի կիրառմամբ՝ նվազագույնը 100 մետր տարածության վրա, հատկապես այն վայրերում, որտեղ ընթանում են ակտիվ շինարարական աշխատանքներ:

Ավագային և նմանատիպ այլ նյութերը պետք է պահեստավորվեն պատշաճ կերպով՝ համապատասխան ծածկերով՝ օդափոխման և փոշու տարածման ռիսկը նվազագույնի հասցնելու համար:

70 50 30 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում

2.7 Առավելություն հանդիպակաց շարժման նկատմամբ

 ԼՈՍԱԳՊԱՆՇԱՆԱՅԻՆ առկայծող լապտեր

Պաշտպանիչ ցանց

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ (տեղադրել յուրաքանչյուր 25մ մեկ)
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N N	Աշխատանքների անվանումները	Աշխատանքների ծավալները		Աշխատանքի տևողությունը /օր/	Աշխատանքների գրաֆիկը (օր,ամիս)																											
		Չափման միավորը	Քանակը		I ամիս						II ամիս						III ամիս						IV ամիս									
					5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր			
1.	Քանդման աշխատանքներ	ւ ²	2811,0	48																												
2.	Խրամուղու քանդում և ոռոգման ցանցի տեղադրում	զծմ	780.0	43																												
3.	Հին եզրաքարերի քանդում	զծմ	1414.4	28																												
4.	Ծին. աղբի հավաքում և տեղափոխում	տն	553,6	12																												
5.	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում	զծմ	1430,0	64																												
6.	Ավազացեմենտային բարձիկի տեղադրում	ւ ²	2811,0	106																												
7.	Դիտահորերի նիշերի և ծածկերի վերակառուցում	հատ	31	19																												
8.	Բազալտե սալիկների տեղադրում	ւ ²	2811,0	106																												
9.	Բուսահողի ներկրում և փռում գազոններում	ւ ³	62.45	4																												

Աղյուսակ 1

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ՓՈՂՈՑԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 120 ՕՐ

N N	Աշխատանքների անվանումները	Աշխատանքների ծավալները		Աշխատանքի տևողությունը /օր/	Աշխատանքների գրաֆիկը (օր,ամիս)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Չափման միավորը	Քանակը		I ամիս				II ամիս				III ամիս				IV ամիս				V ամիս				VI ամիս				VII ամիս				VIII ամիս																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր

Աղյուսակ 2


ԽՈՐԵՆԱՅԻ ՓՈՂՈՑԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 240 ՕՐ


N N	Աշխատանքների անվանումները	Աշխատանքների ծավալները		Աշխատանքի տևողությունը /օր/	Աշխատանքների գրաֆիկը (օր,ամիս)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Չափման միավորը	Քանակը		I ամիս				II ամիս				III ամիս				IV ամիս				V ամիս				VI ամիս				VII ամիս				VIII ամիս																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր	5օր

Աղյուսակ 3

ԱՄԻՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 240 ՕՐ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱԾԻԿ	ԱՆ	6	77	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ								

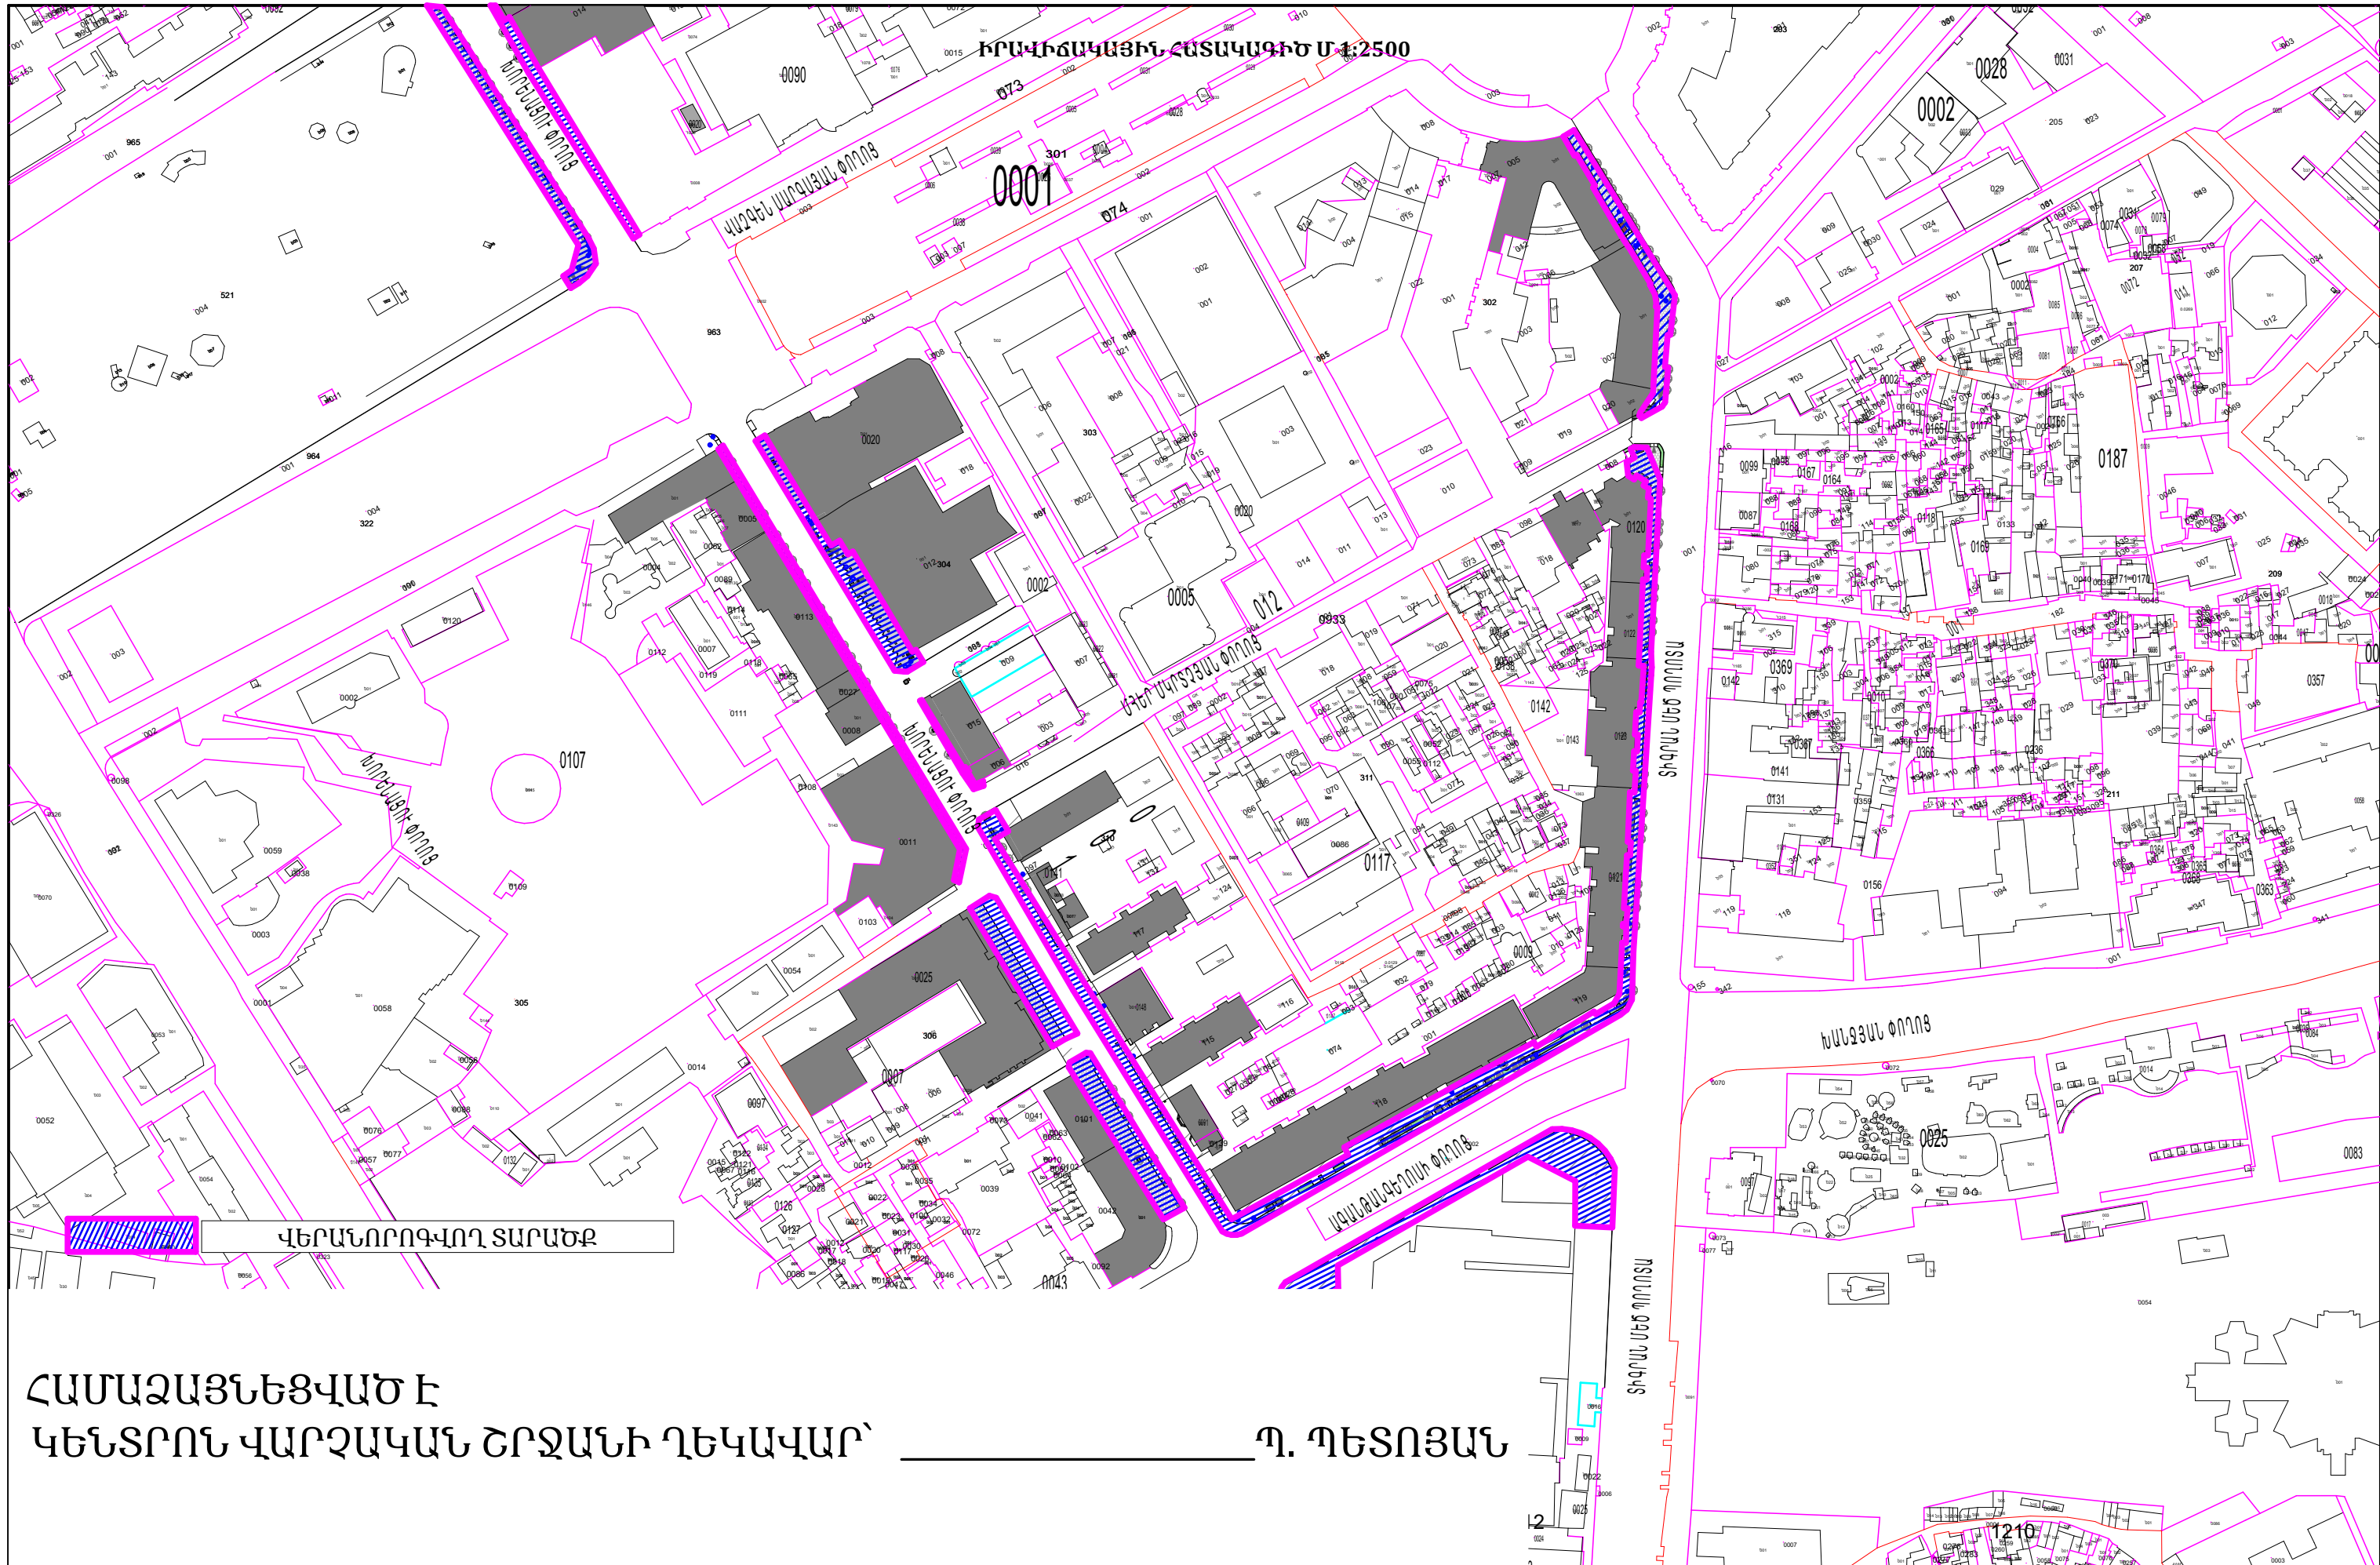



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՑԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2500	ԱՆ	7	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՆՓՅԱՆ								

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ


ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ



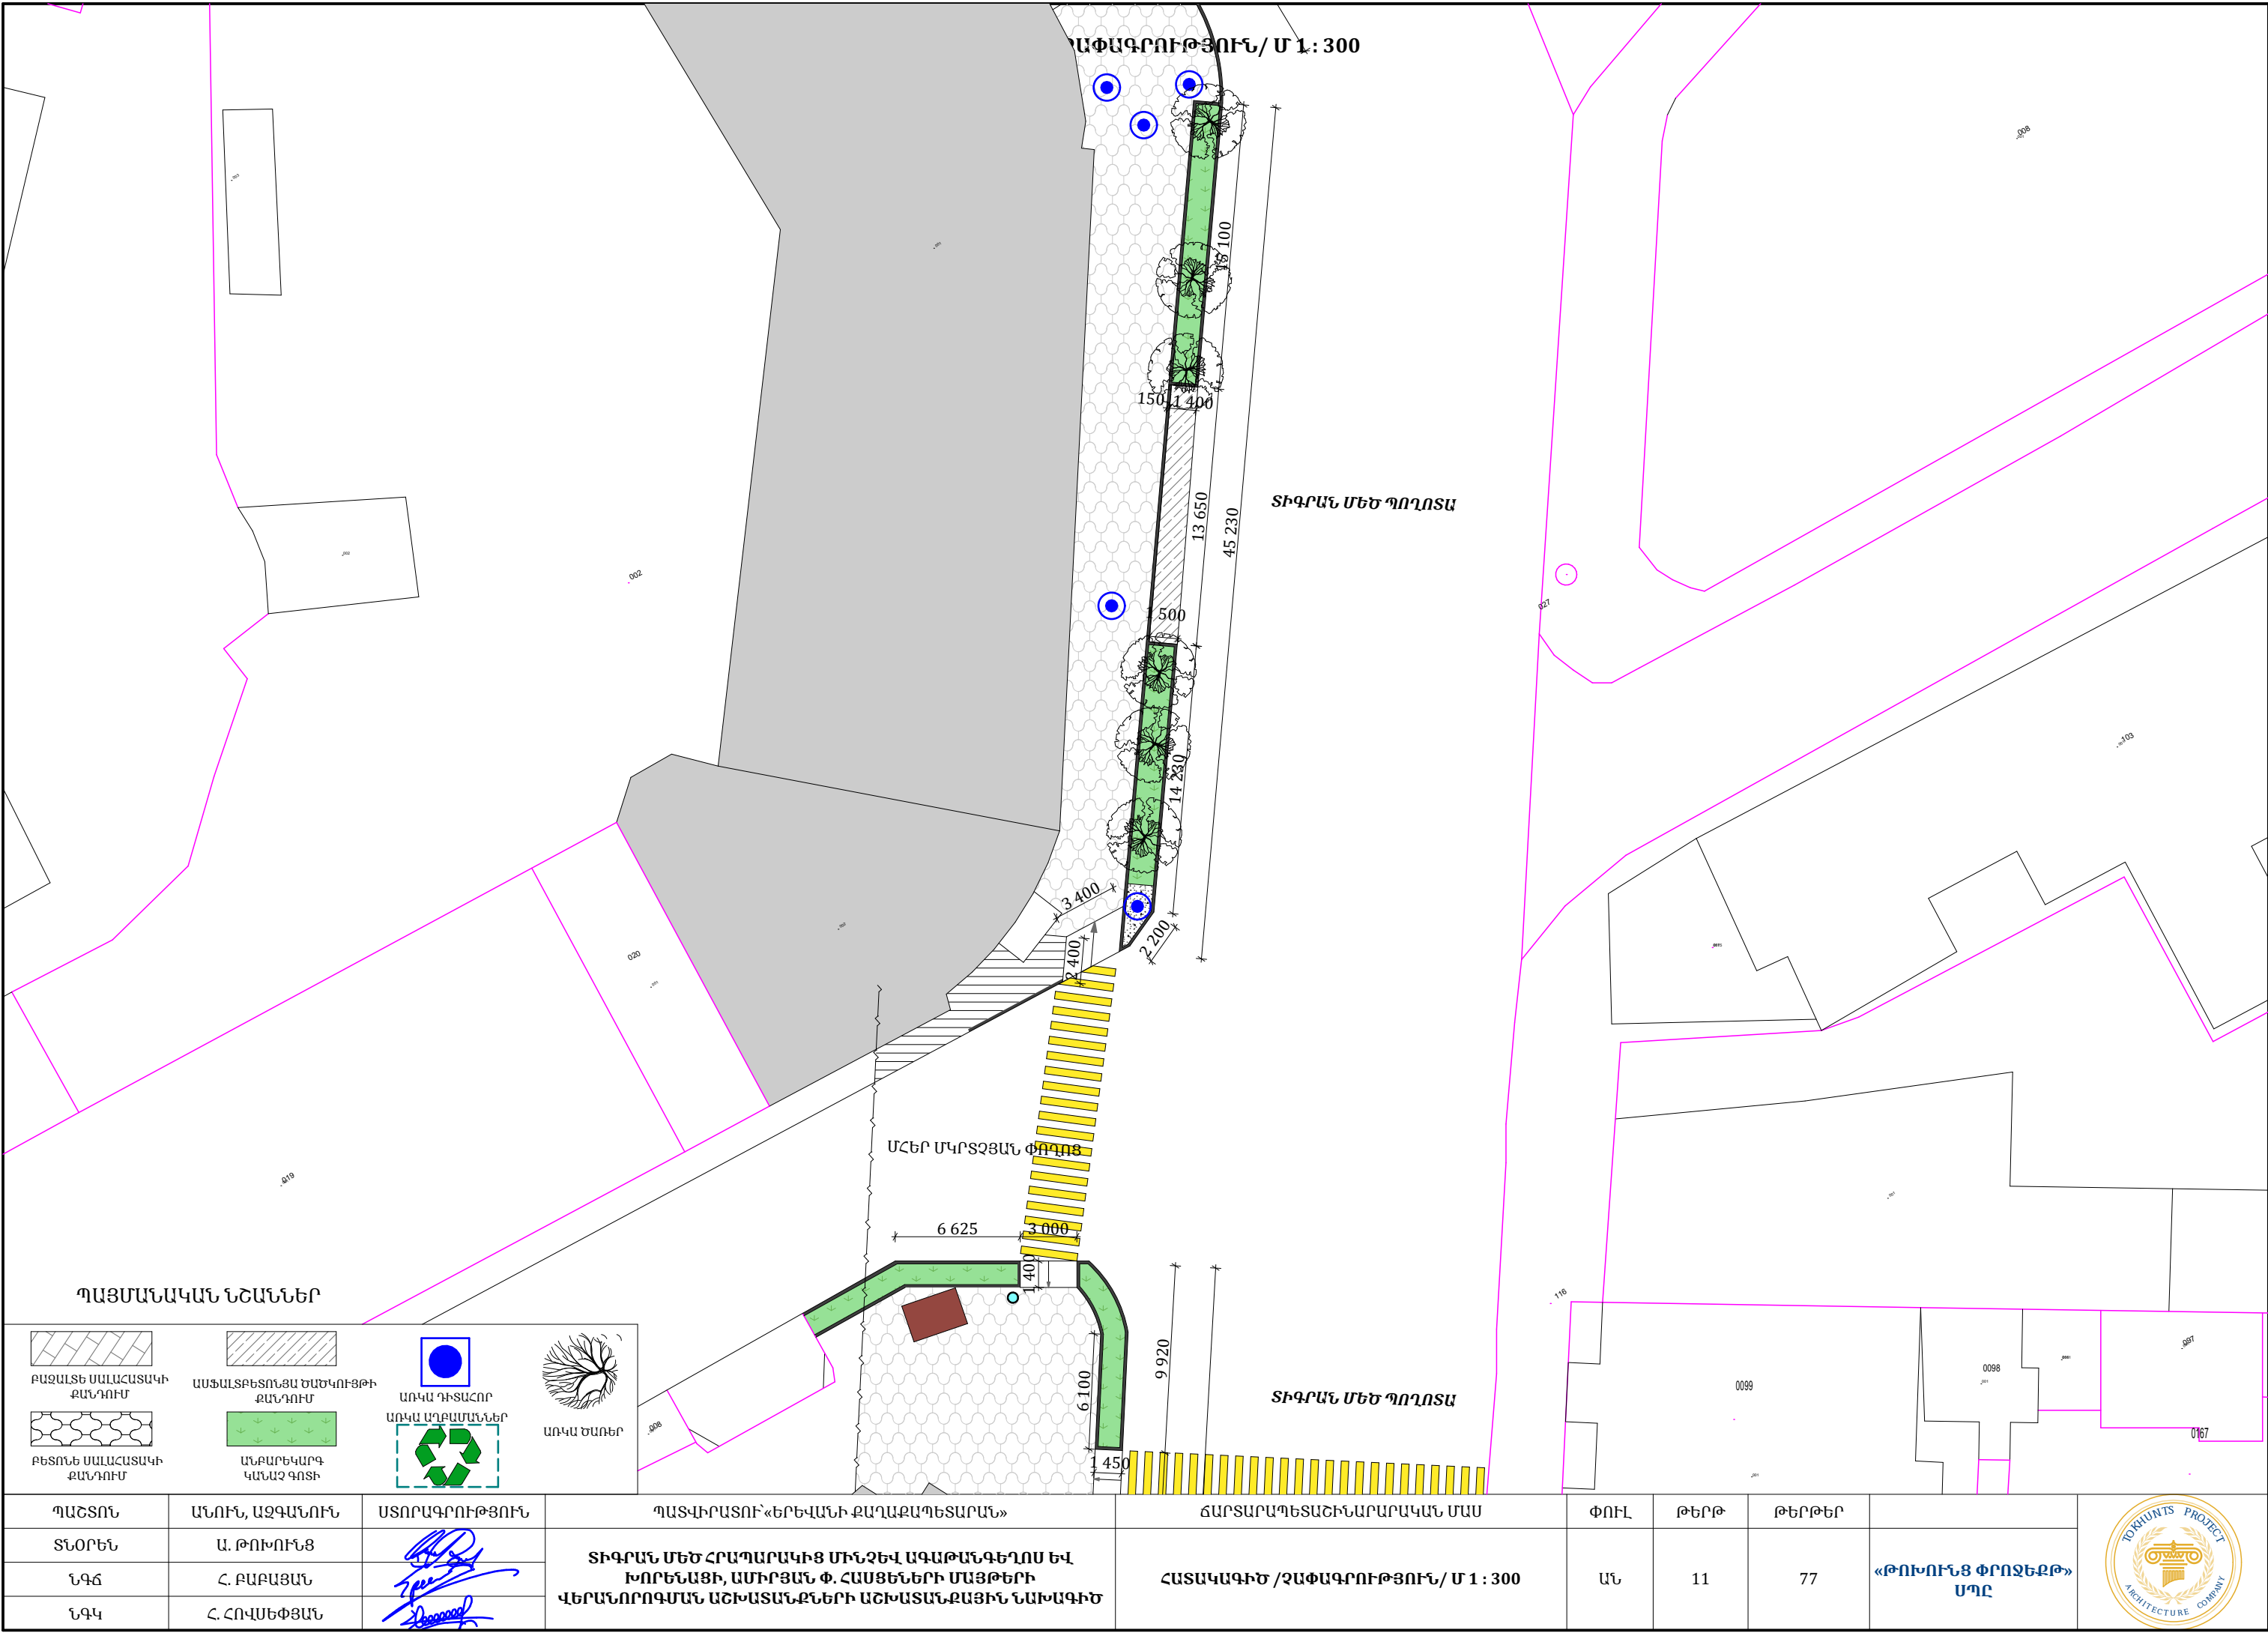


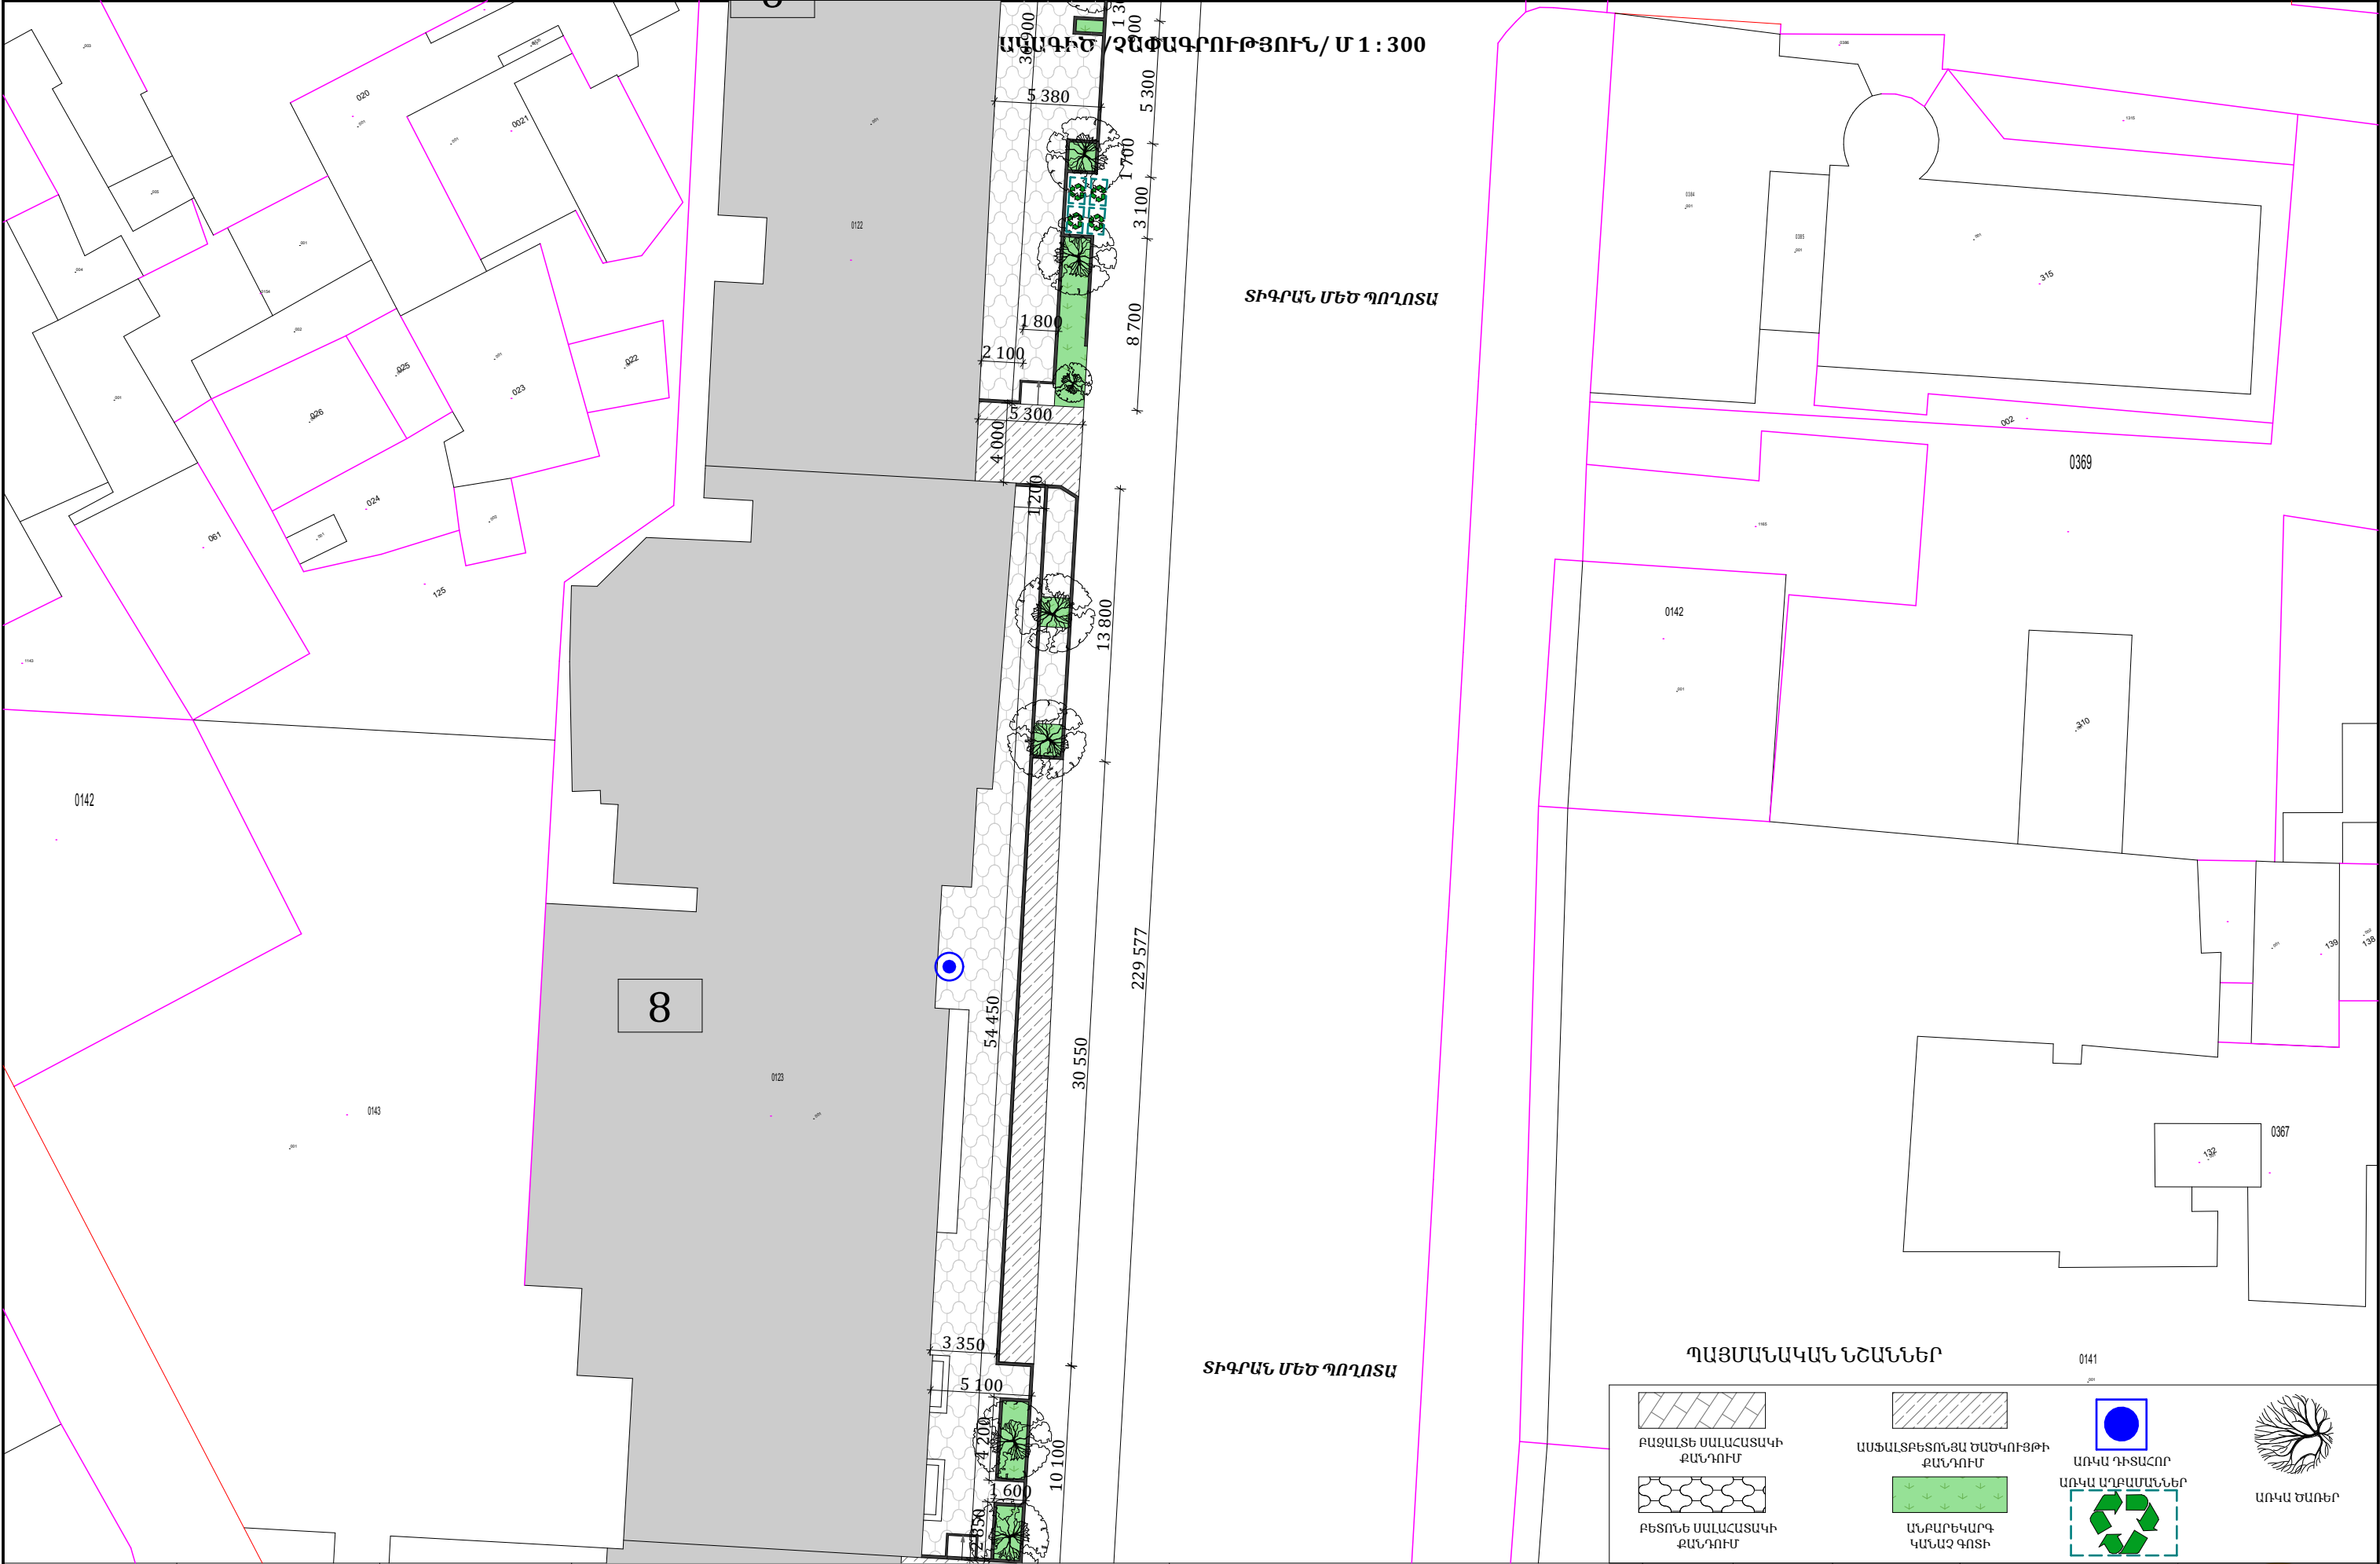


ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1 : 300	ԱՆ	13	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԶԹ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

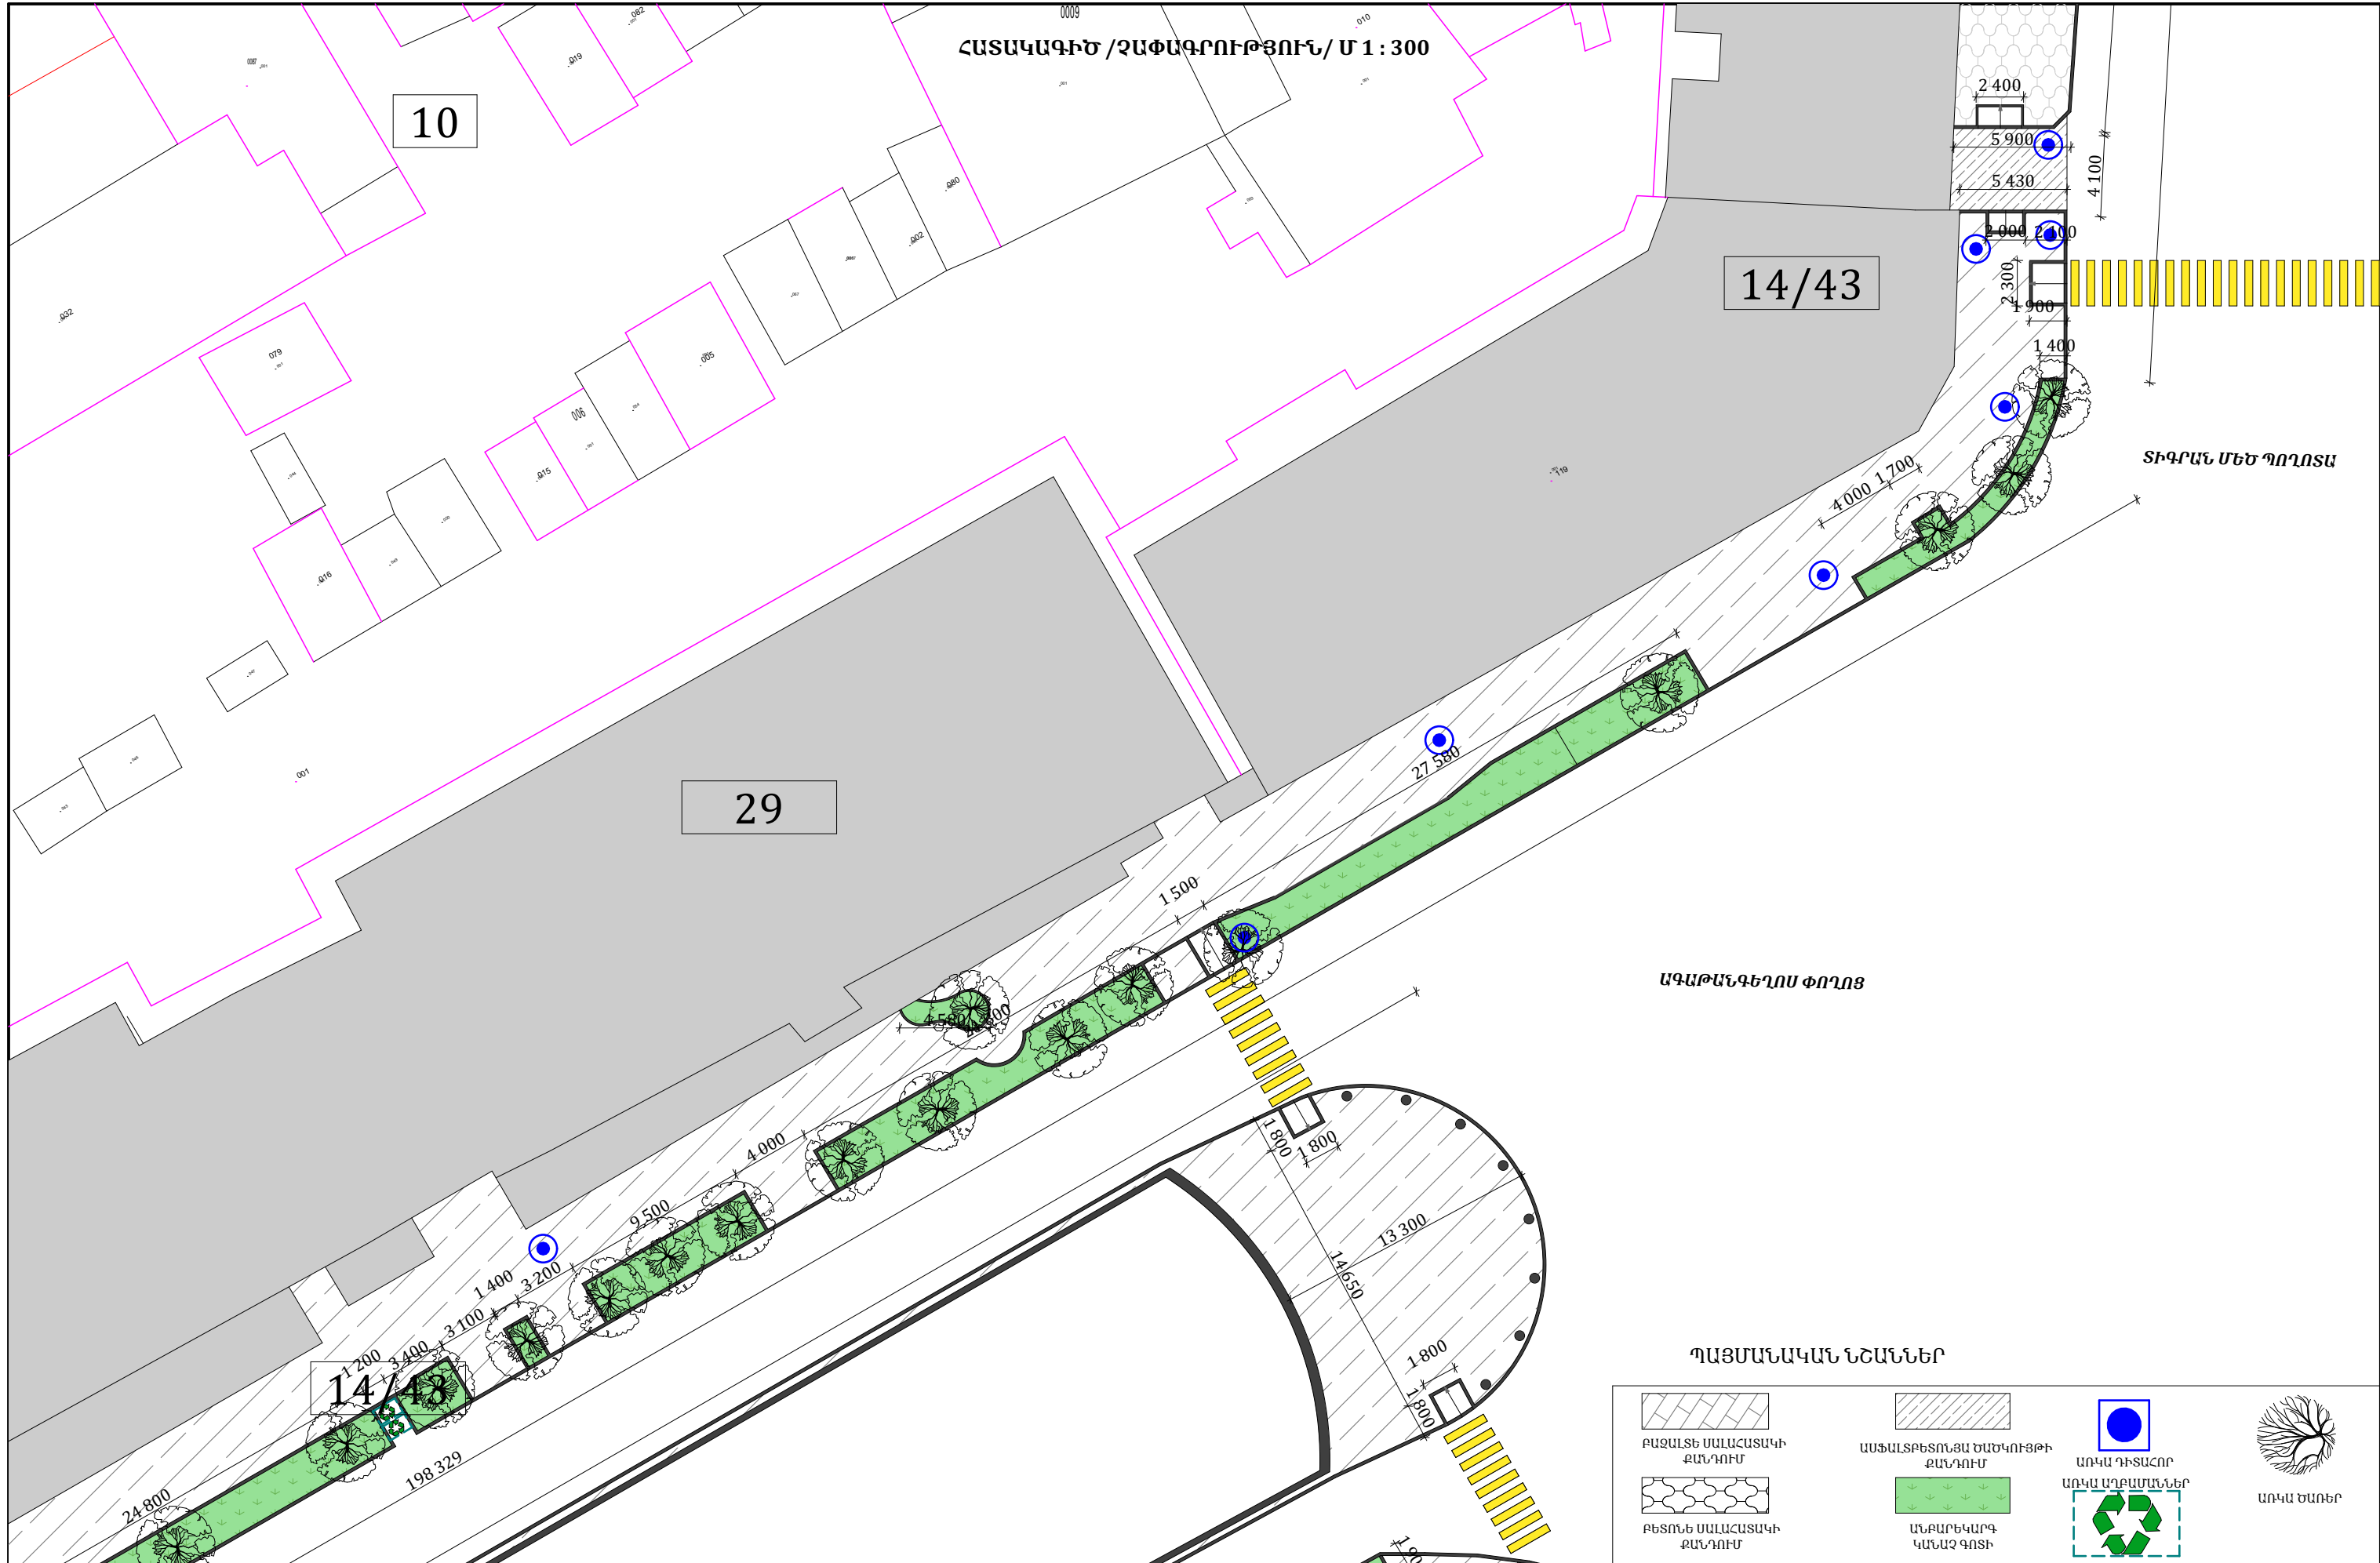


ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	15	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԶՔ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՅԵԹՅԱՆ								

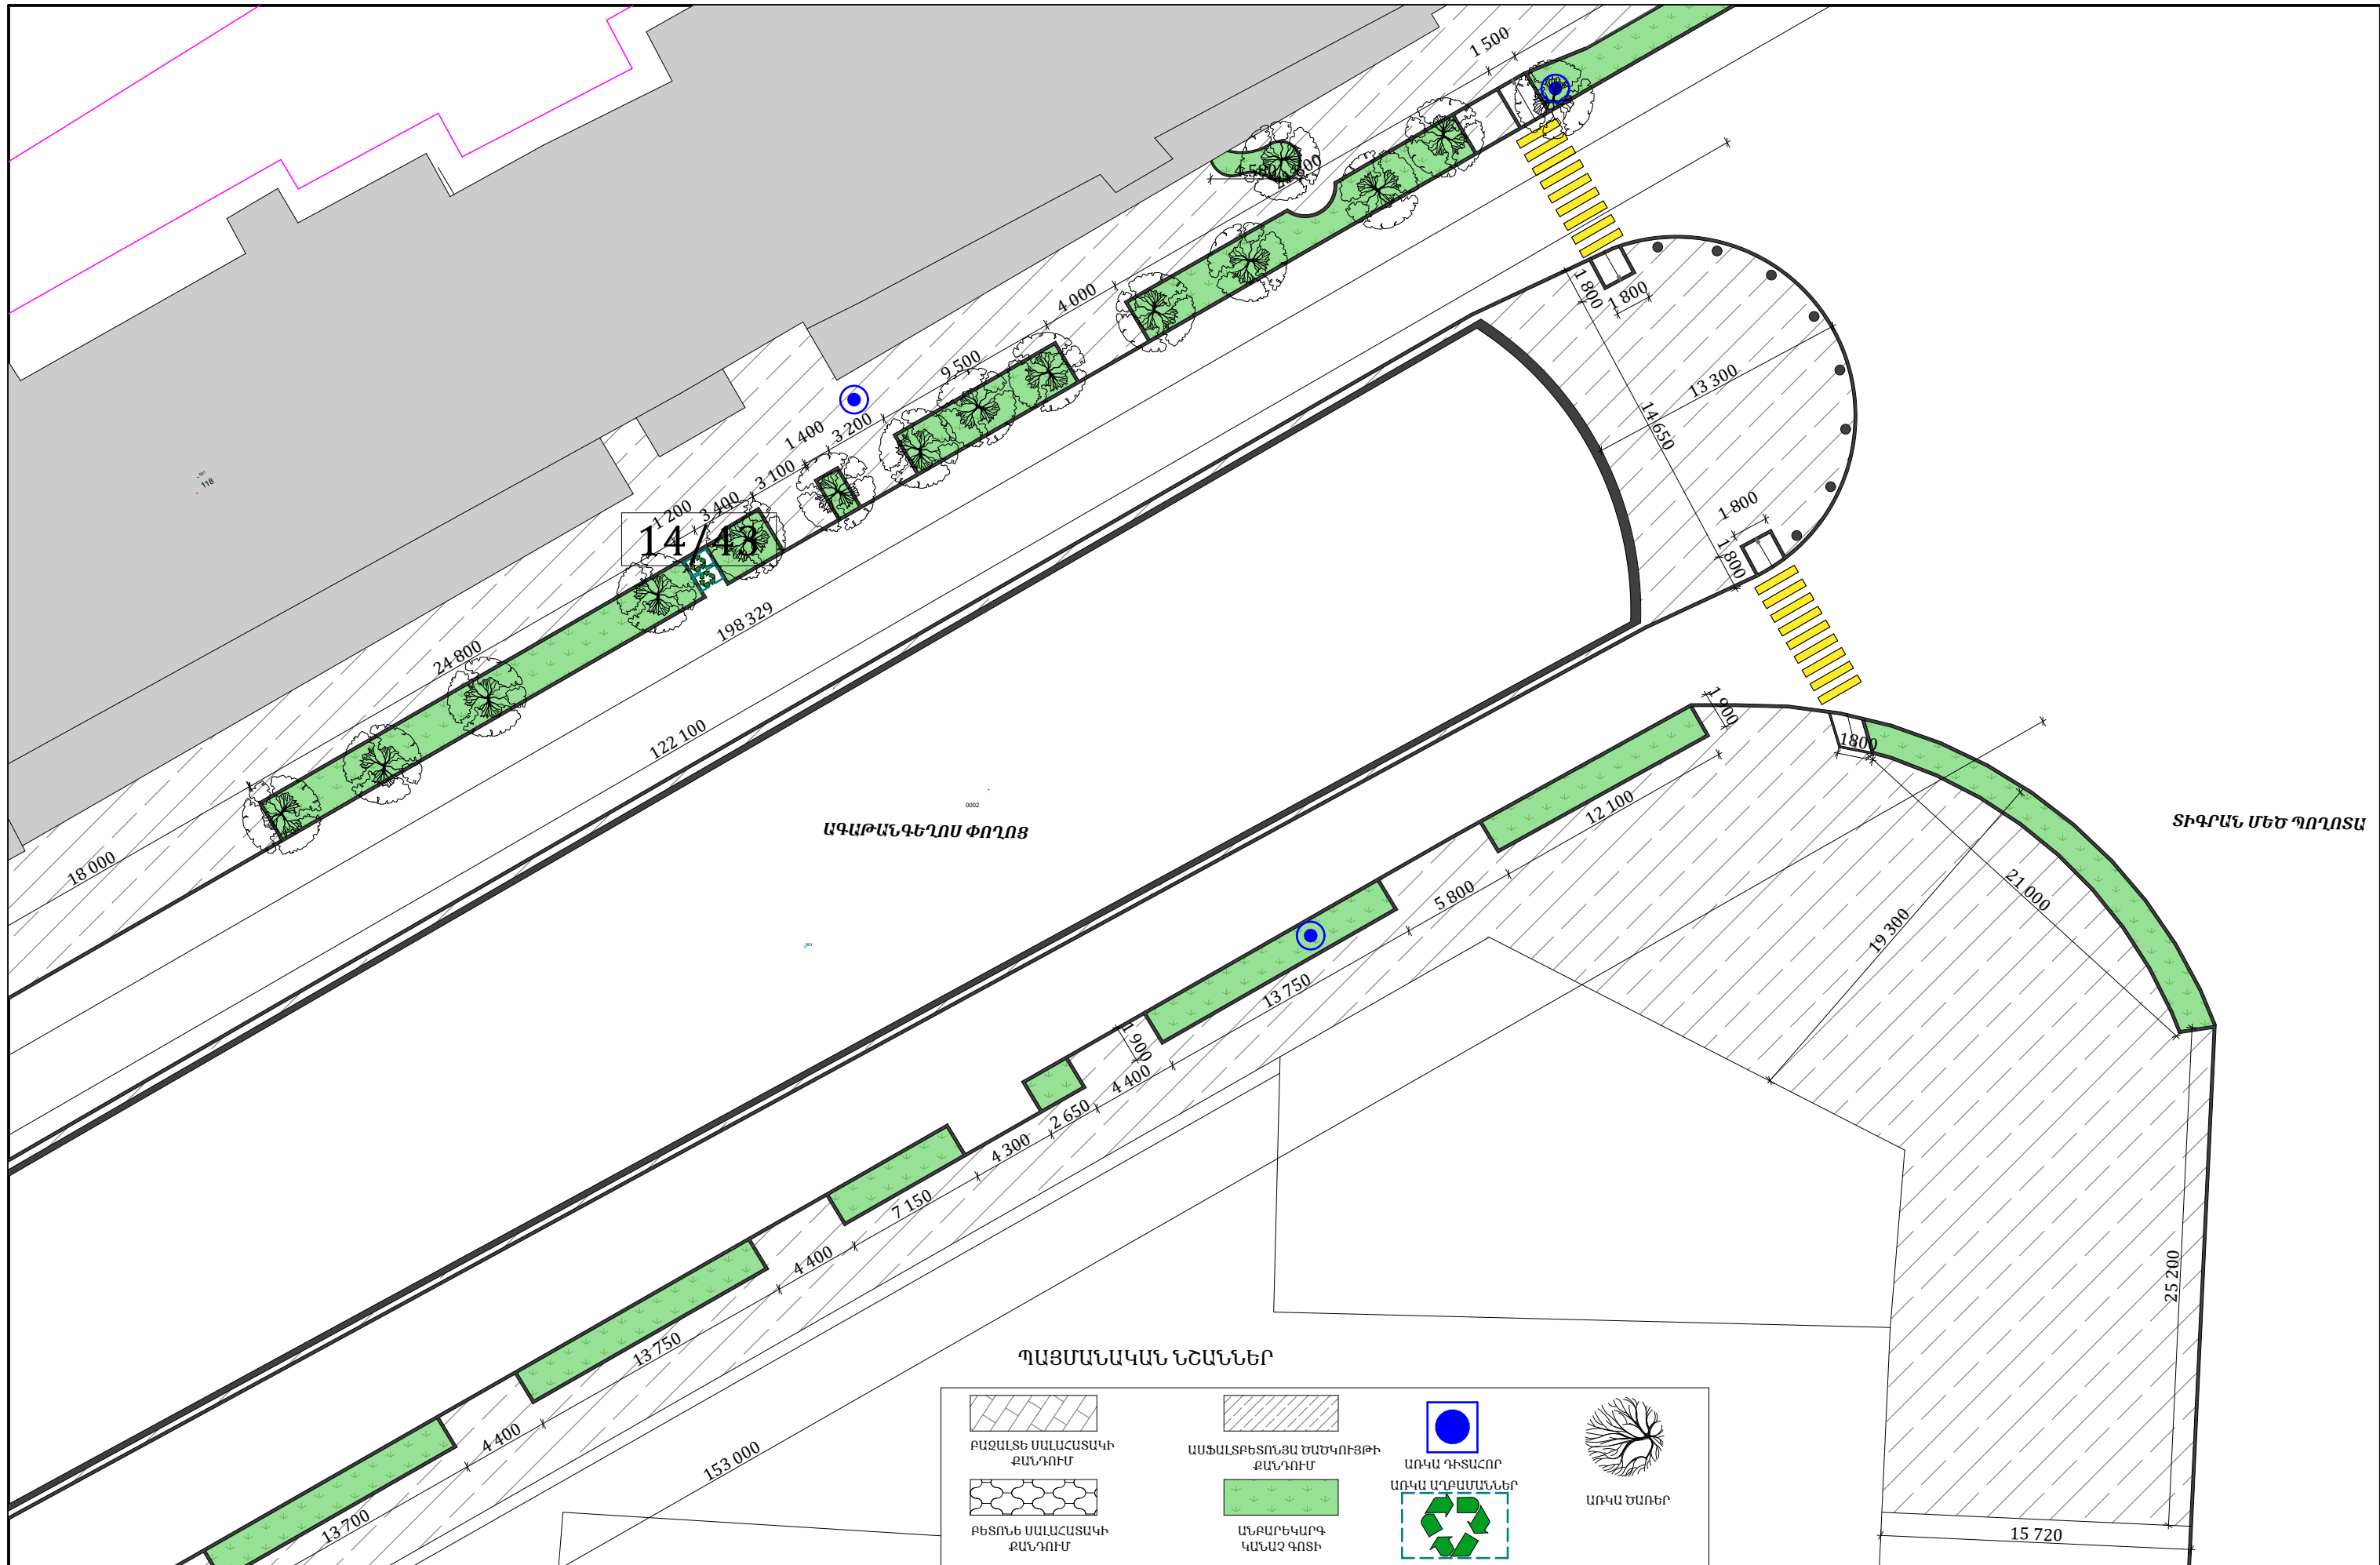

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	16	77	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՅԷՓՅԱՆ								

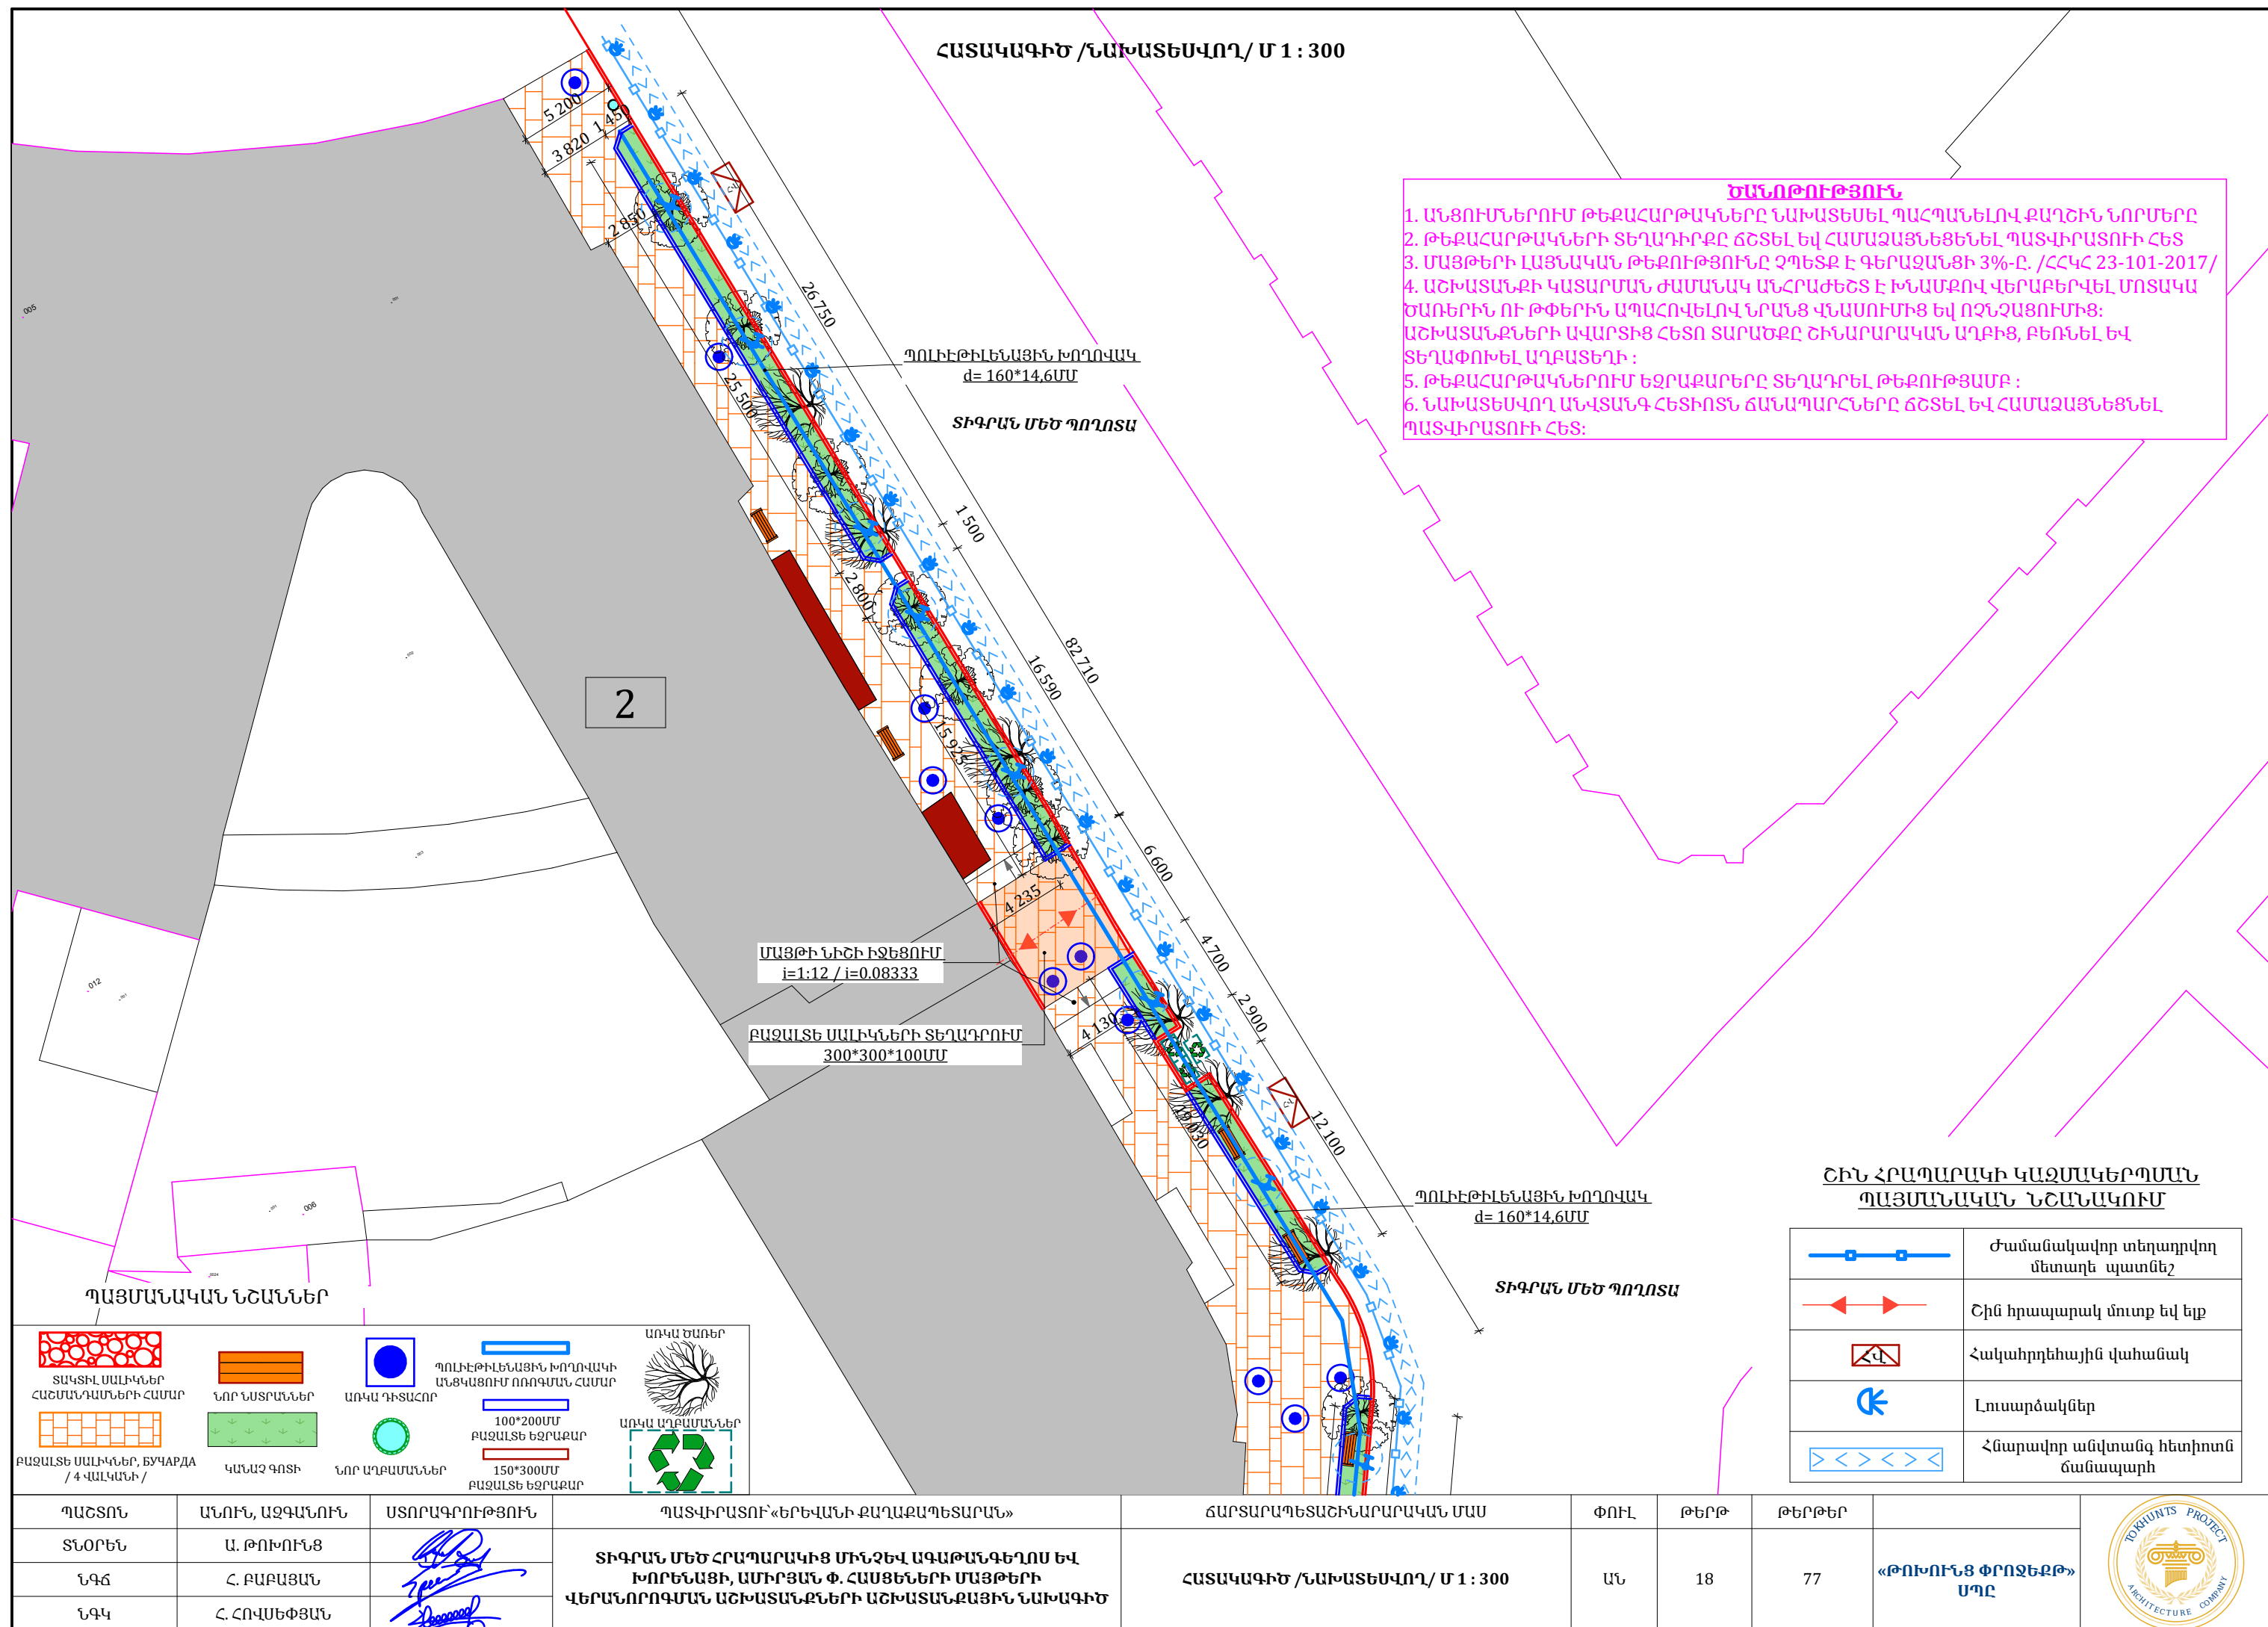

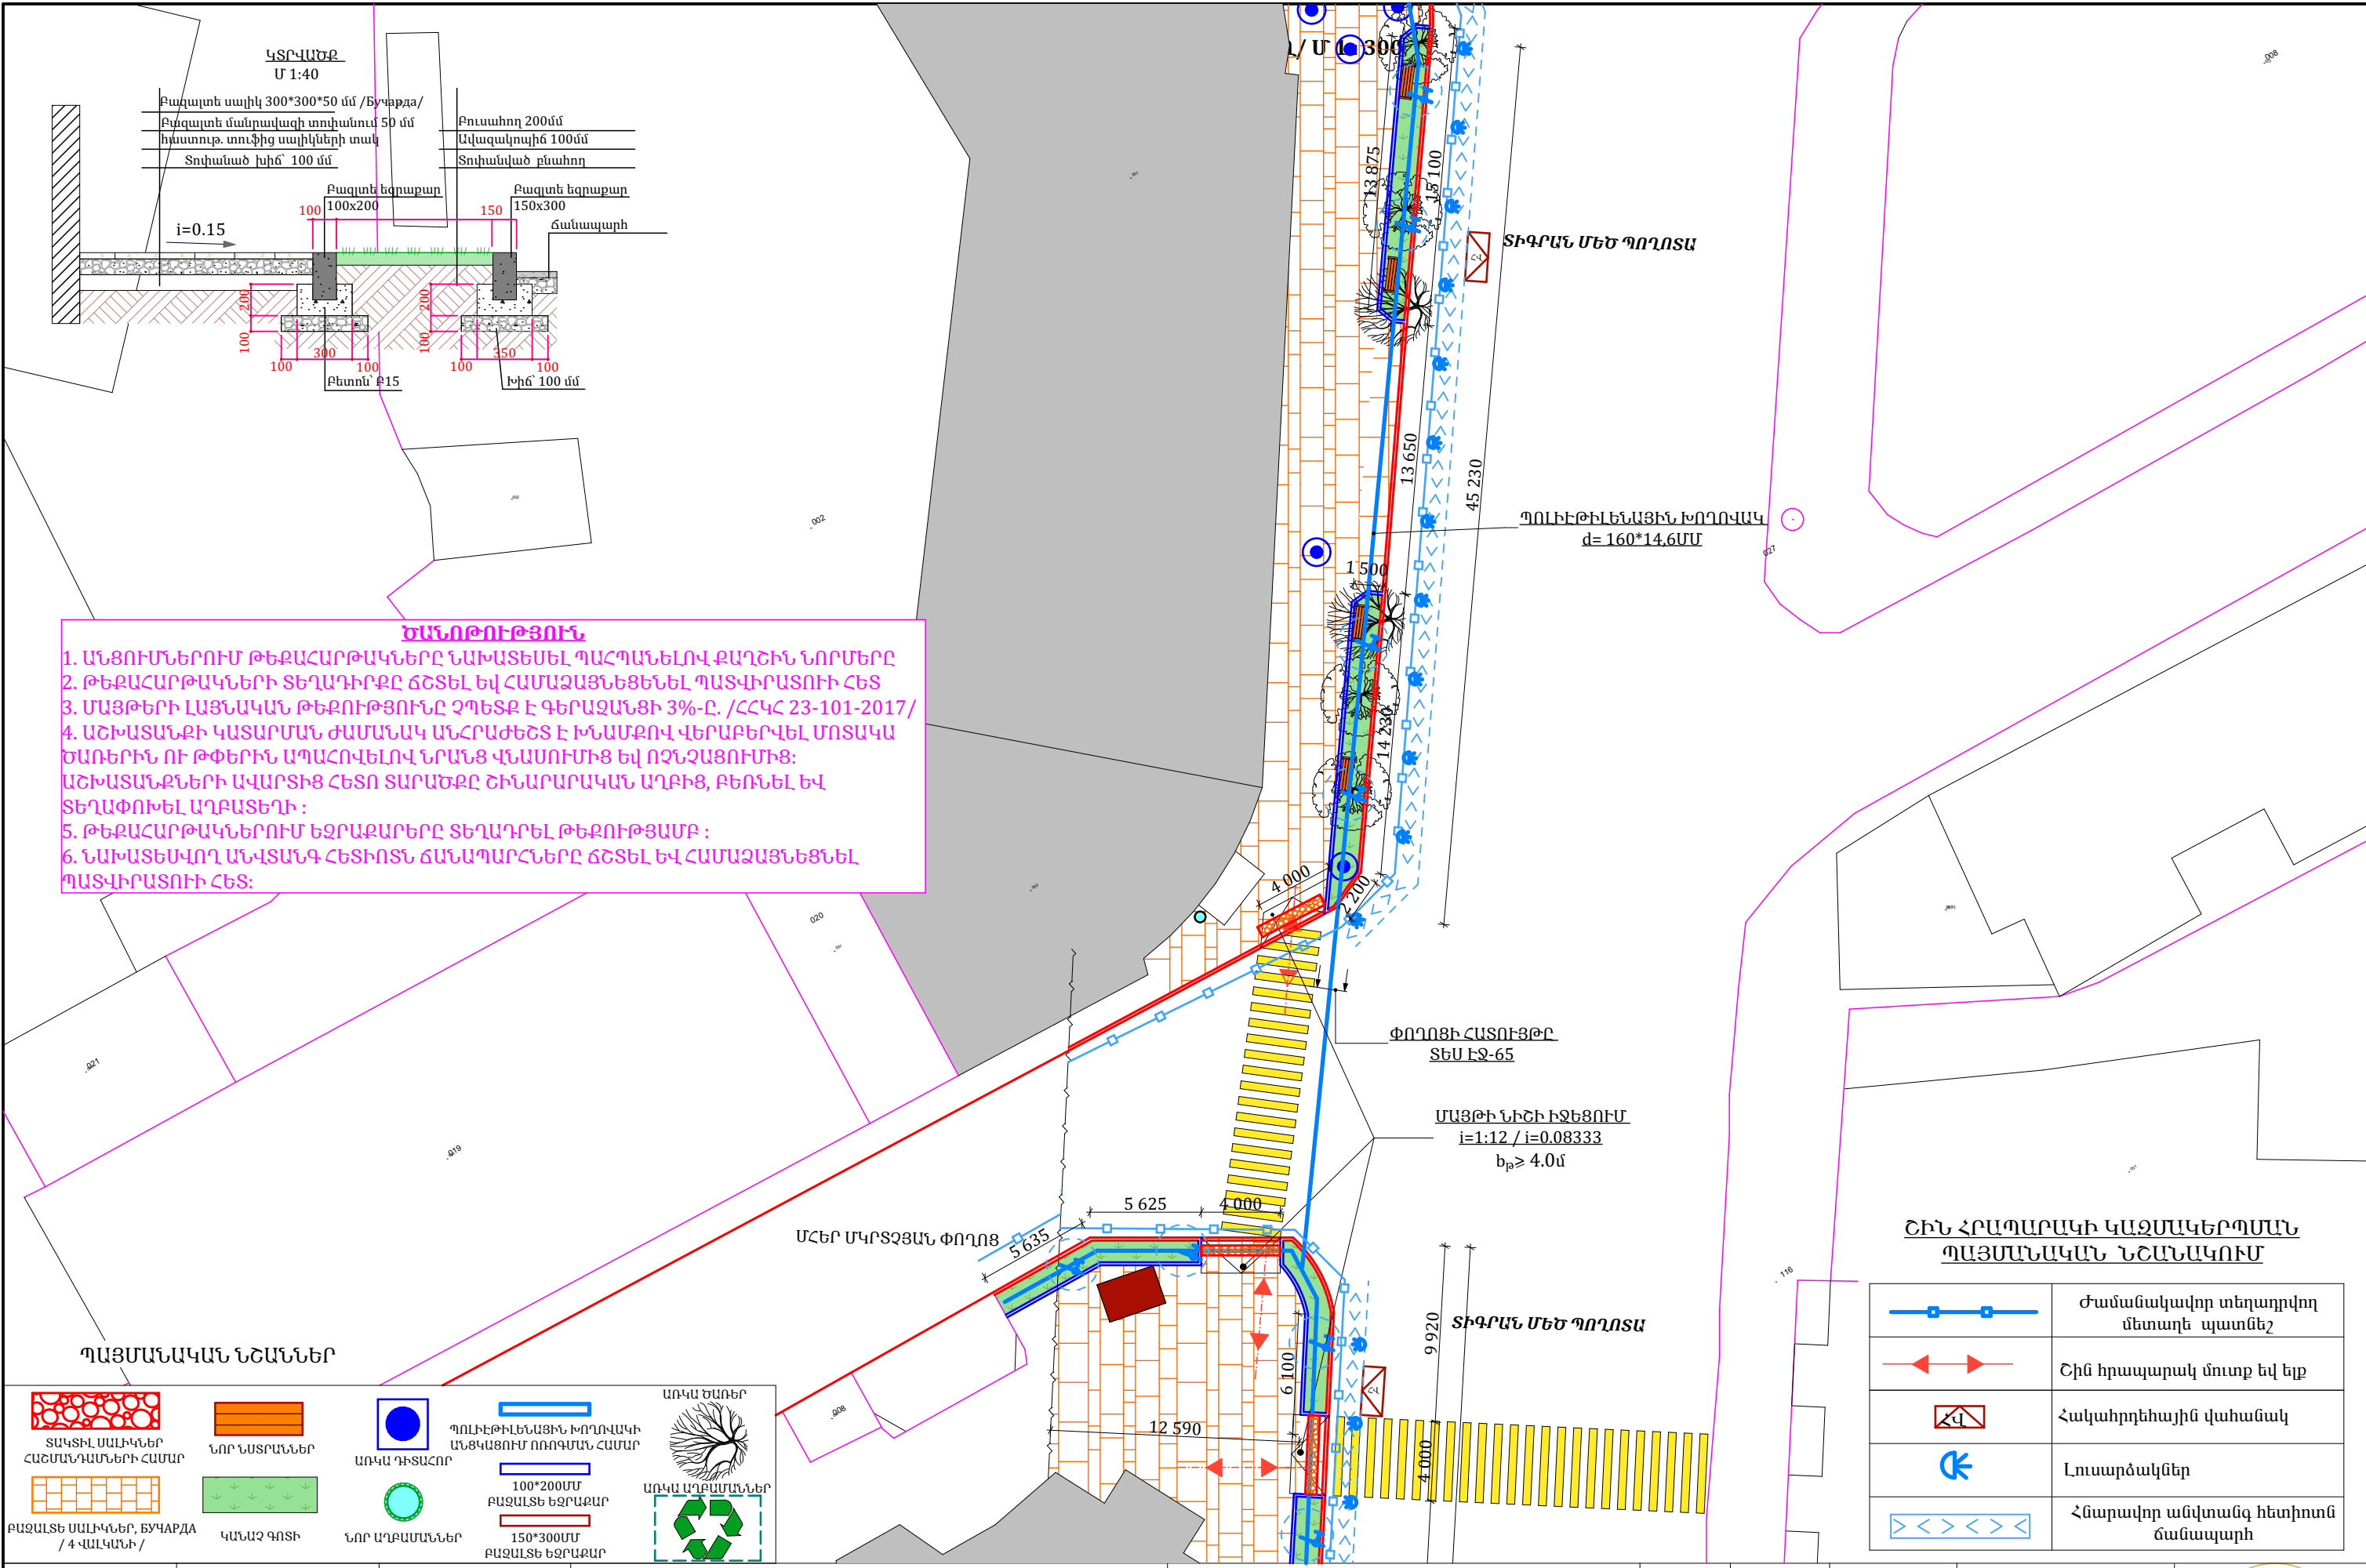

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
2. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
3. ՄԱՑԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԻՑ:
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱԺՈՒՆԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
5. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴԻՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ:
6. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ
ՀԱՇՄՆԻԿԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ

ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ
ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

100*200ՄՄ
ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ

150*300ՄՄ
ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ

ԱՌԿԱ ԾԱՌՈՒՐ

ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ

ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ, ԵՄԿԱՐՃԱ
/ 4 ՎԱԼԿԱՆԻ /

ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ

ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	
	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈԼԸ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՑԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1 : 300	ԱՆ	19	77		
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								


ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատնեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
300*300*100ՄՄ

ՄԱՅԹԻ ՆԻՇԻ ԻՋԵՑՈՒՄ
i=1:12 / i=0.08333

ՄԱՅԹԻ ՆԻՇԻ ԻՋԵՑՈՒՄ
i=1:12 / i=0.08333
b_p ≥ 4.0մ

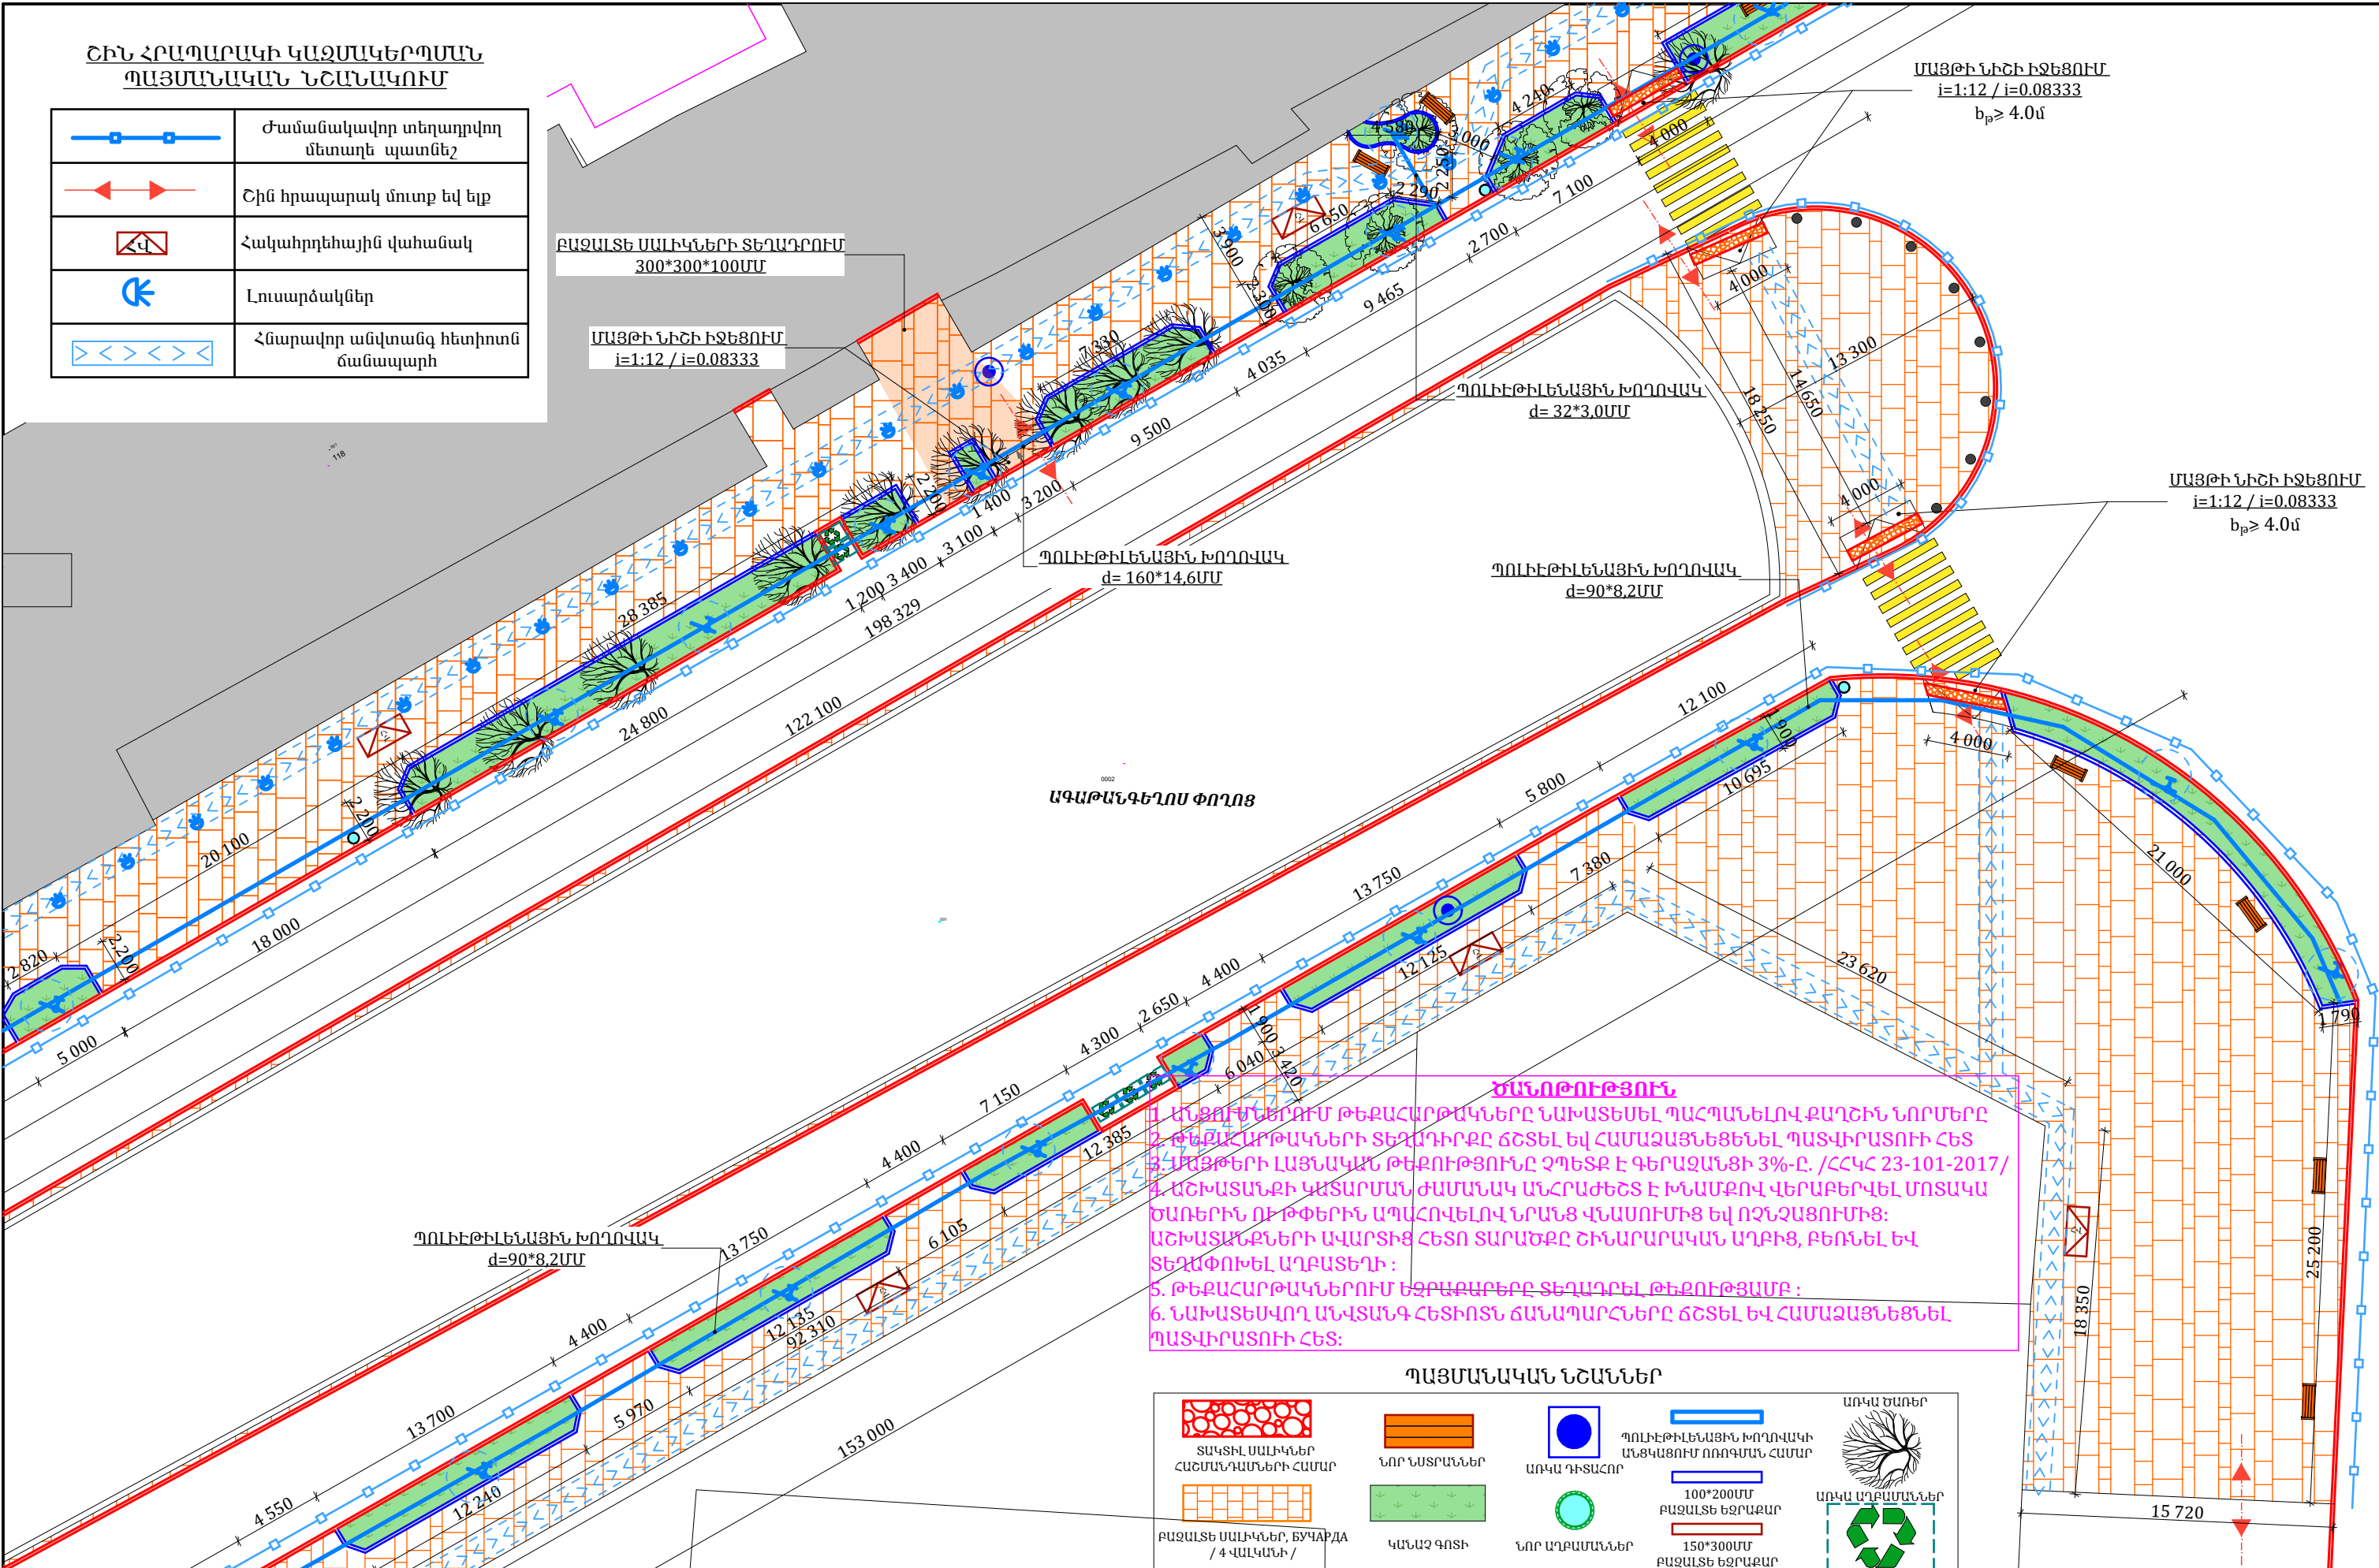


ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ՓՈՂՈՑ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. ԱՆՁՈՒՄԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԲԱՂՇԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
2. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
3. ՎԱՐՈՋԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱԶԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՍՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ
ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԻՑ:
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ
ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
5. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱԲԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ:
6. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


	ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ		ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ		ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ		ՊՈԼԻԹԵԽՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ		ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ
	ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ, ԵՄԿԱՐԴԱ / 4 ՎԱԿԱՆԻ /		ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻ		ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ		100*200ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱԲԱՐ		ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ
							150*300ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱԲԱՐ		

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՐՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻՏ	ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	24	77	«ԹՈՒՈՒՐՆՑ ՓՐՈԶԵԶՐ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳՎ	Հ. ՀՈՎԱՆԵՓՅԱՆ								

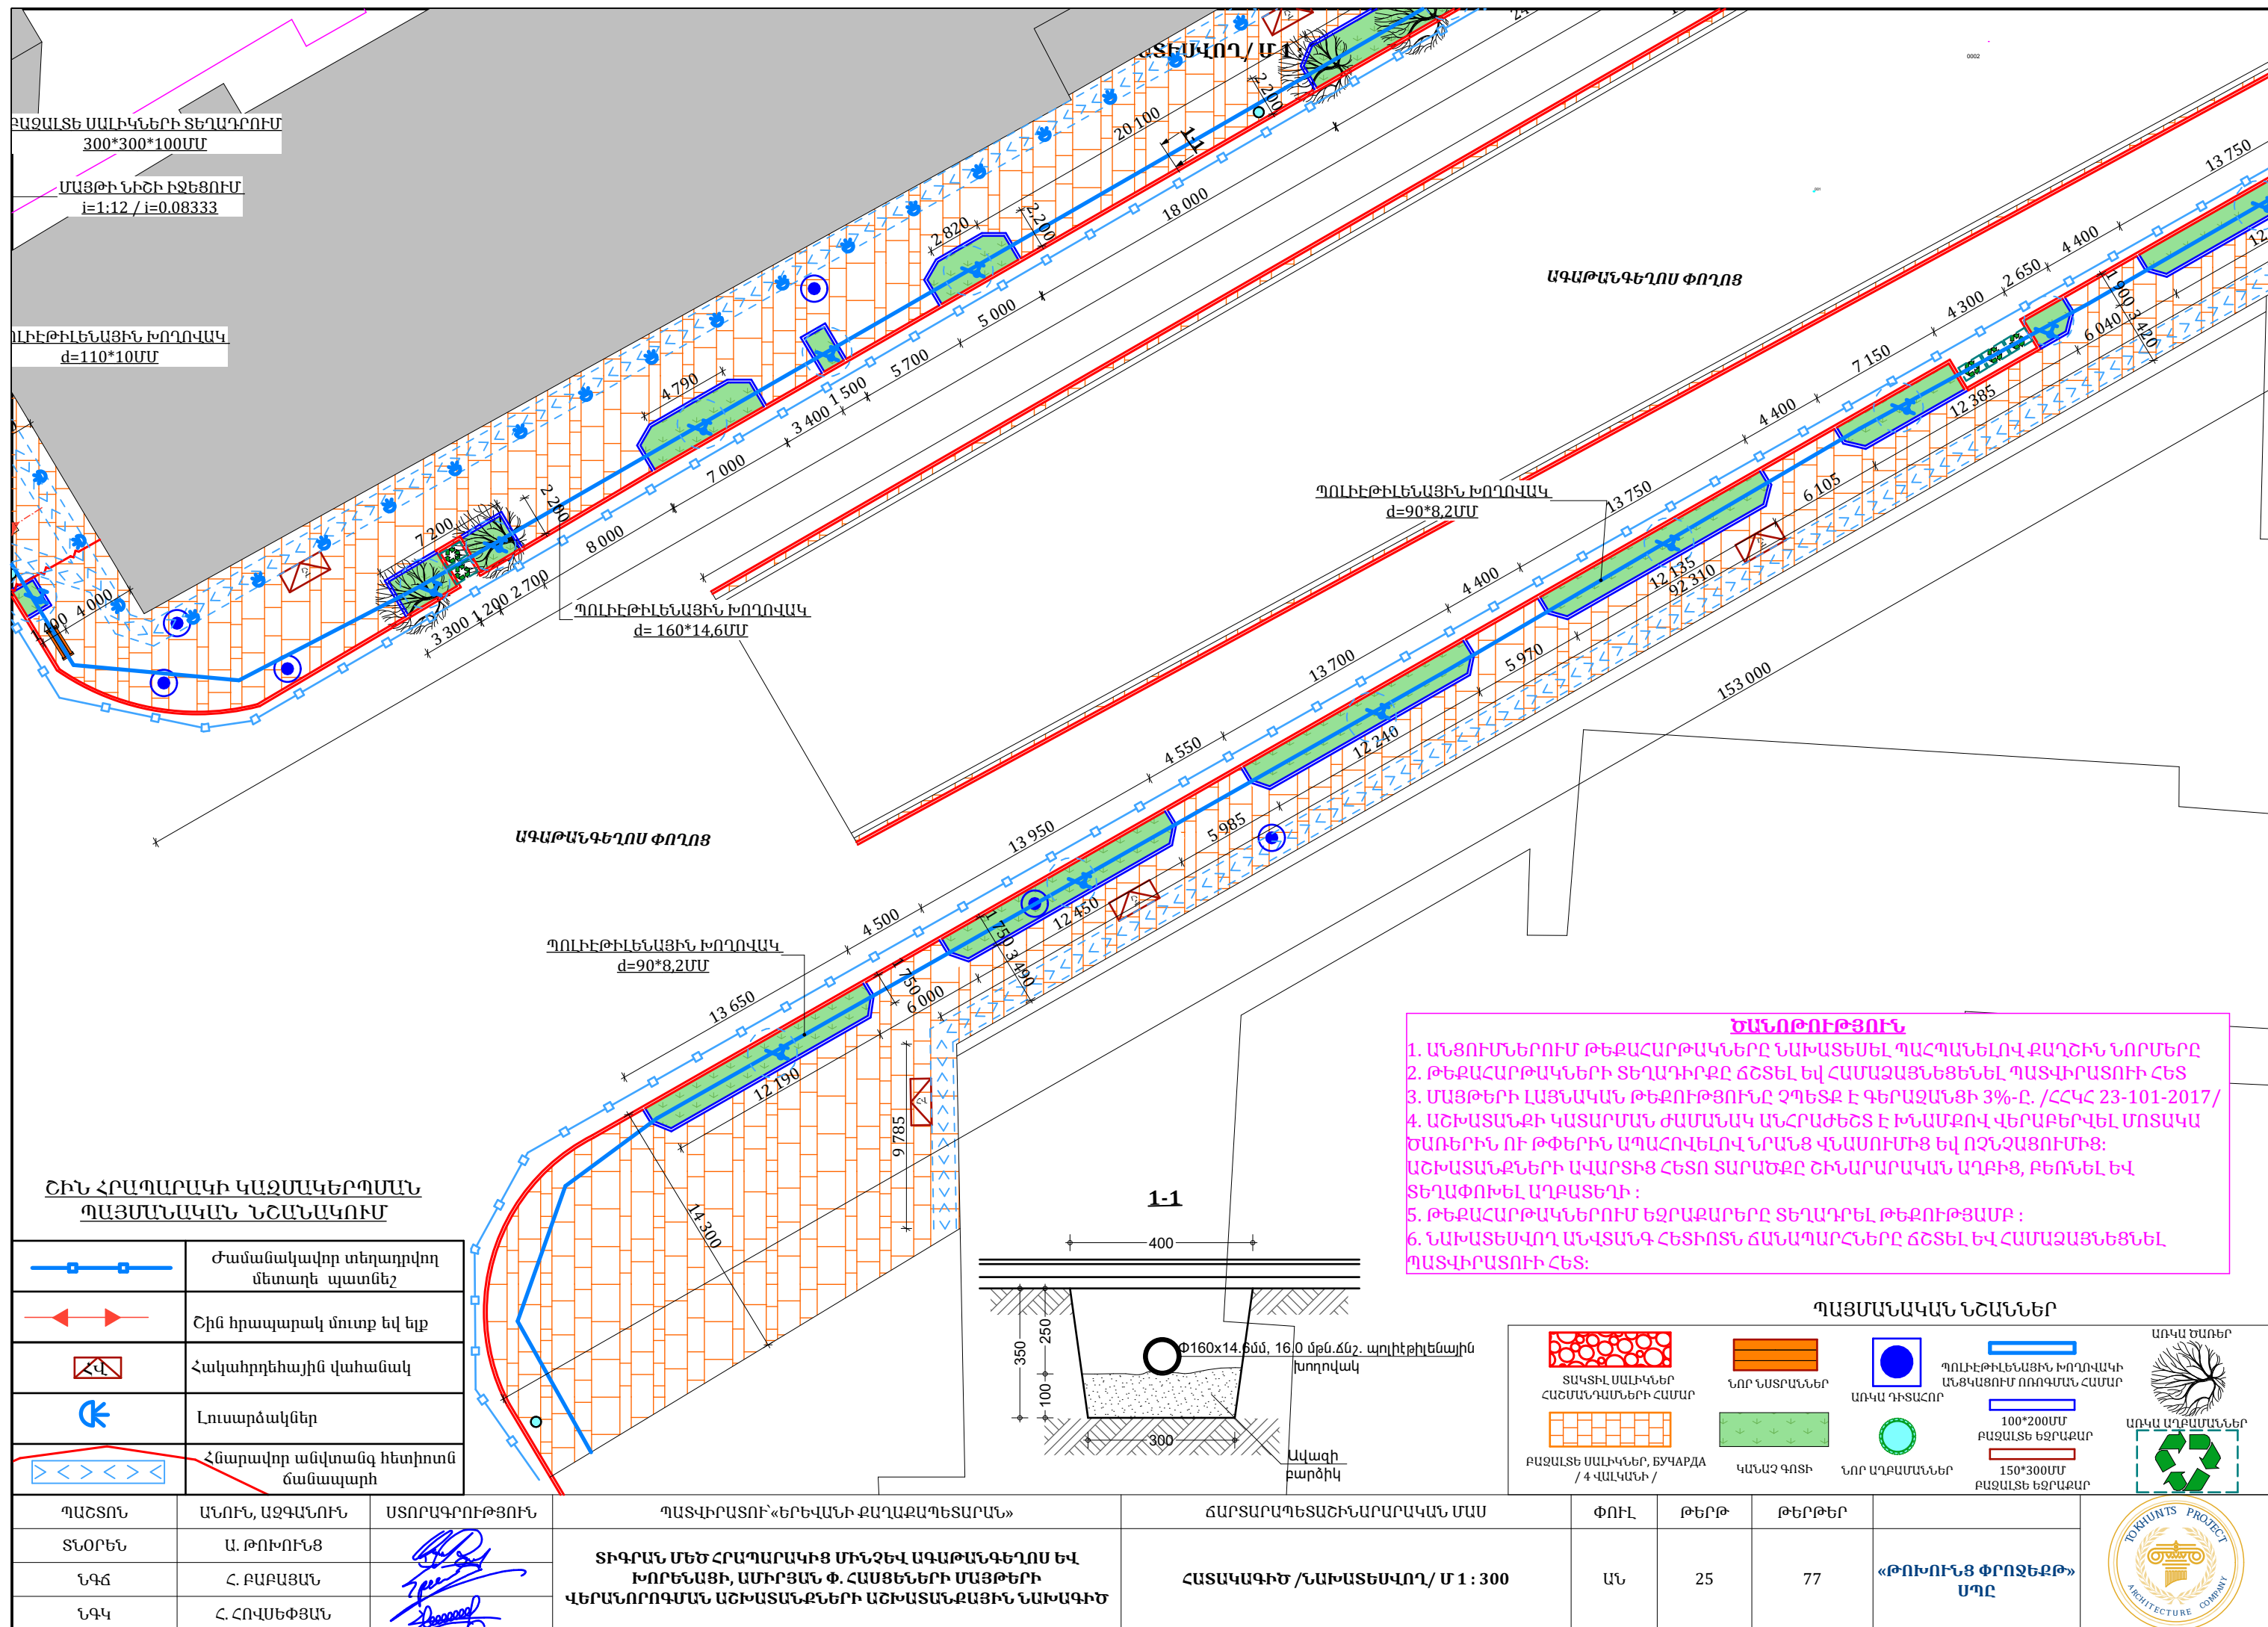



ԽՈՐԵՆԱՑԻ ՓՈՂՈՑ
ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ




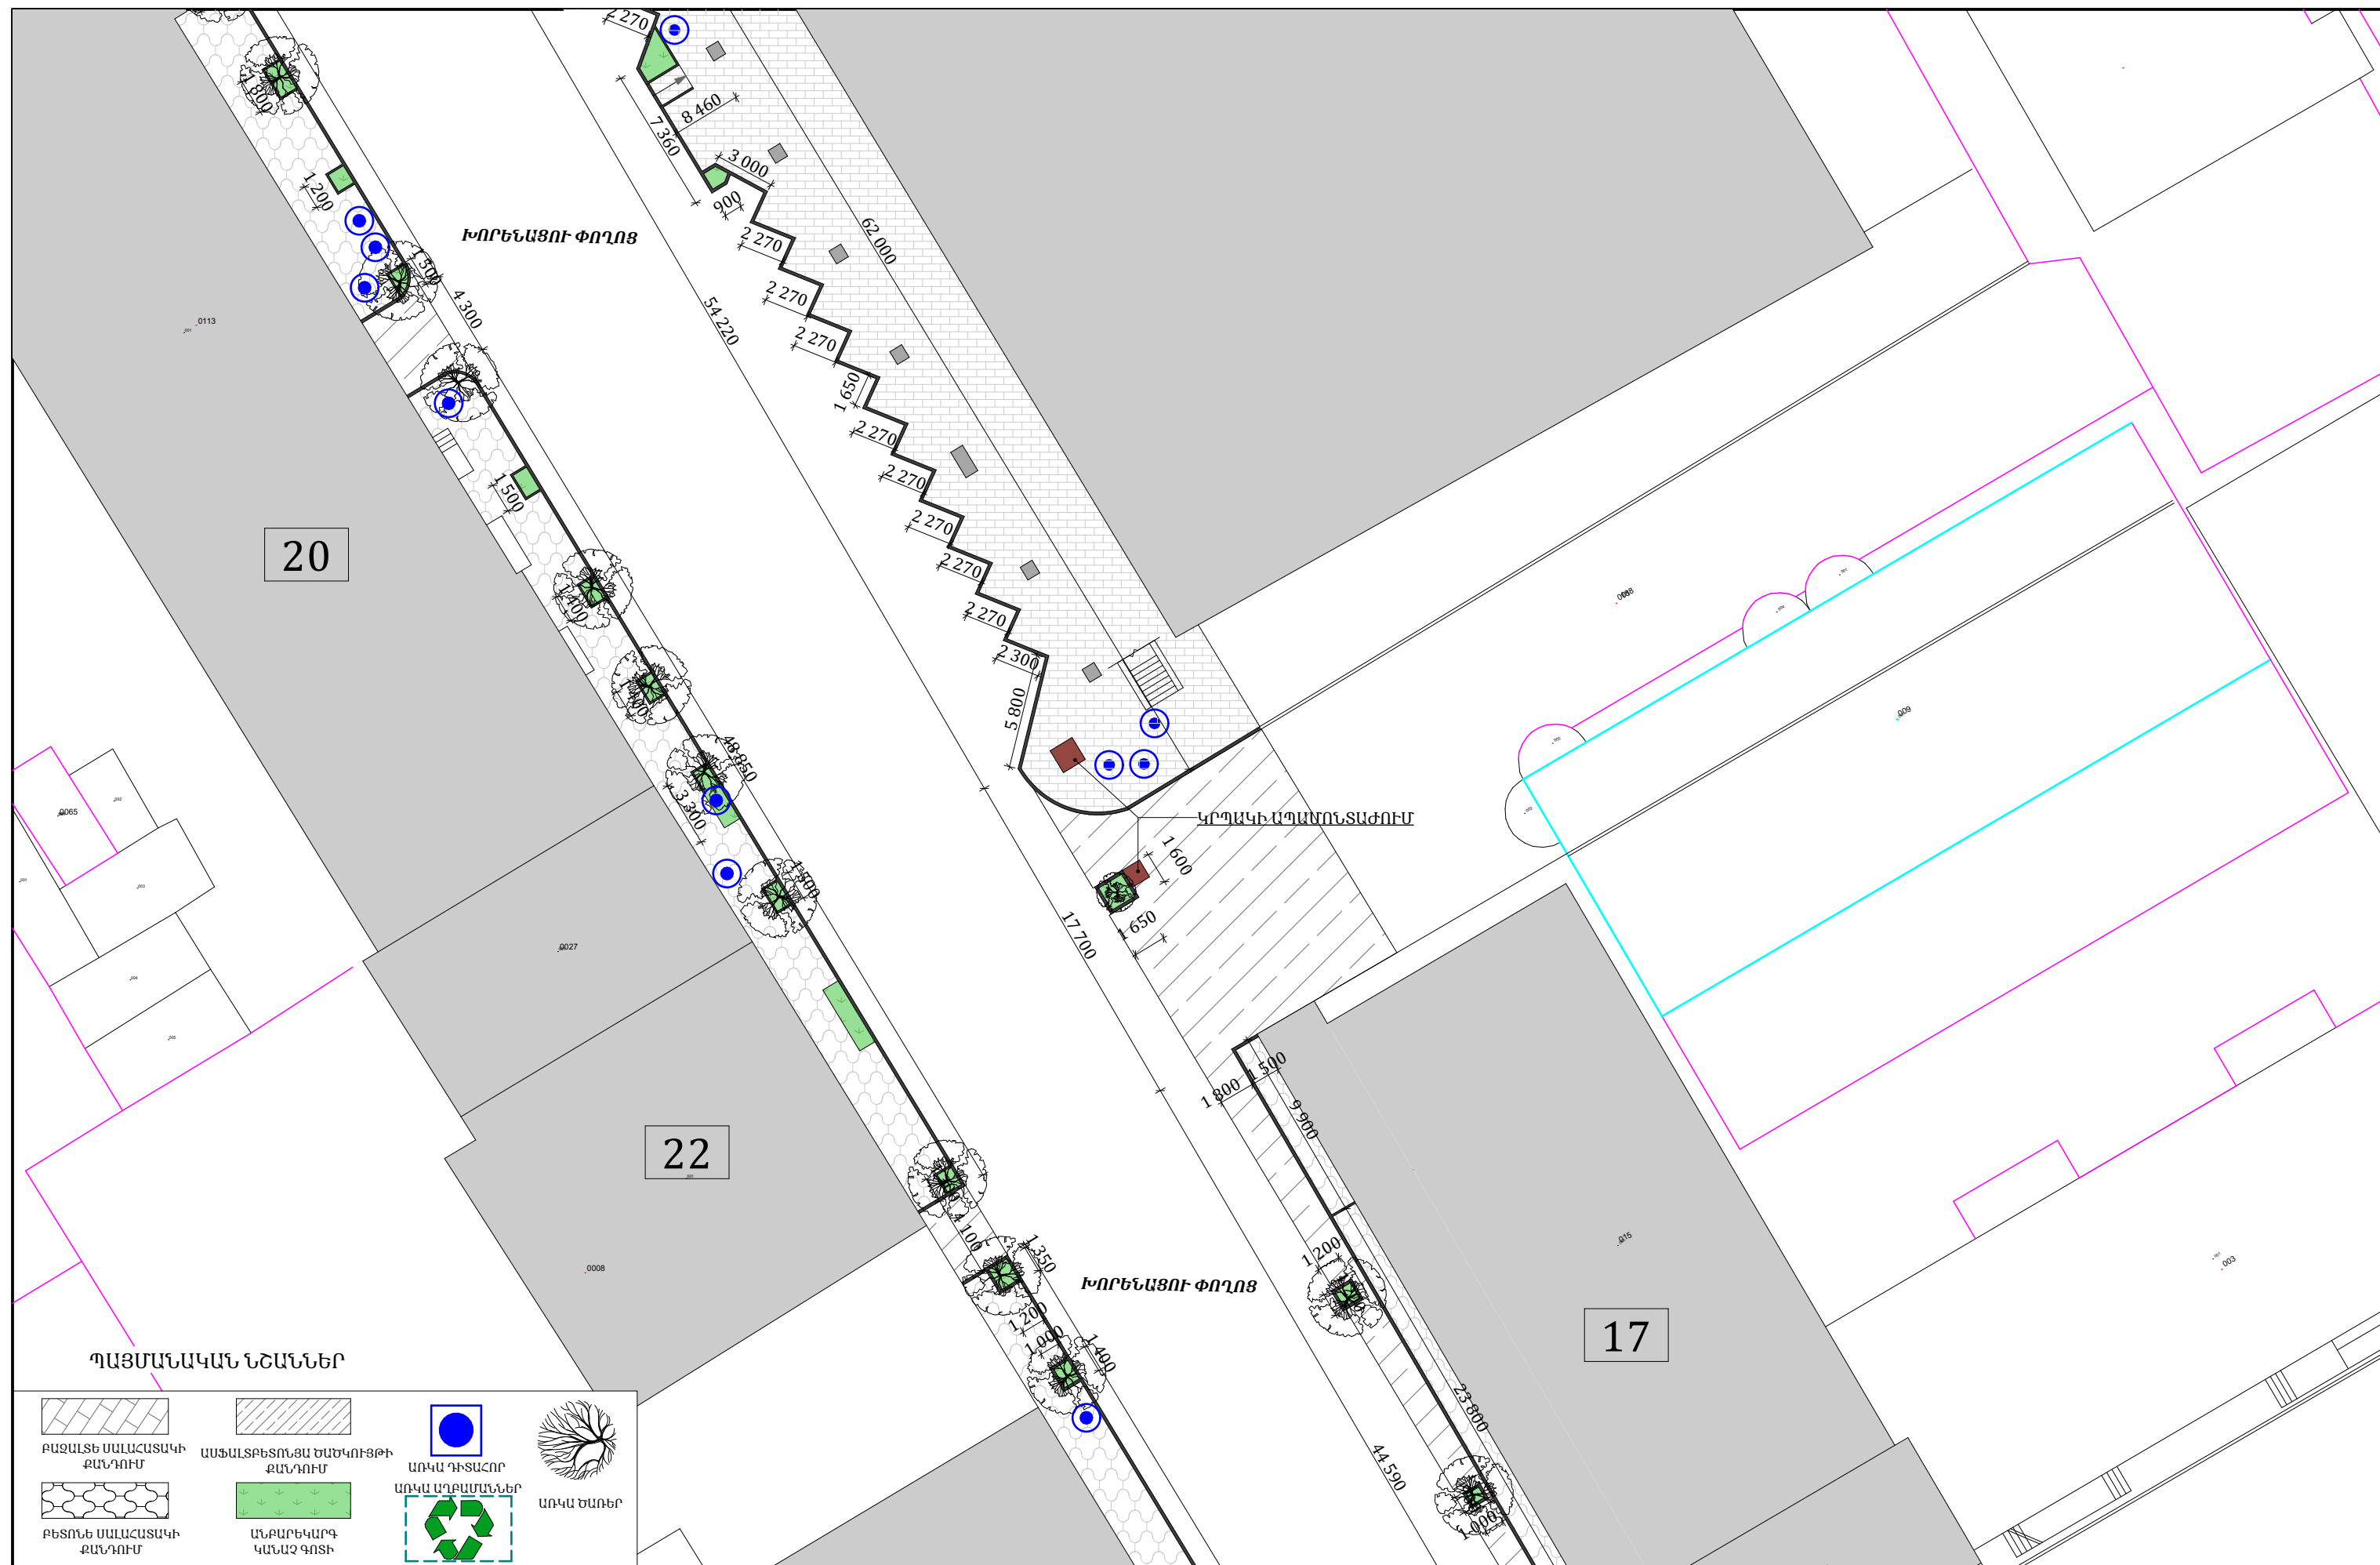

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԺԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՅ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	30	77	«ԹՈՒՈՒՆՅ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ								



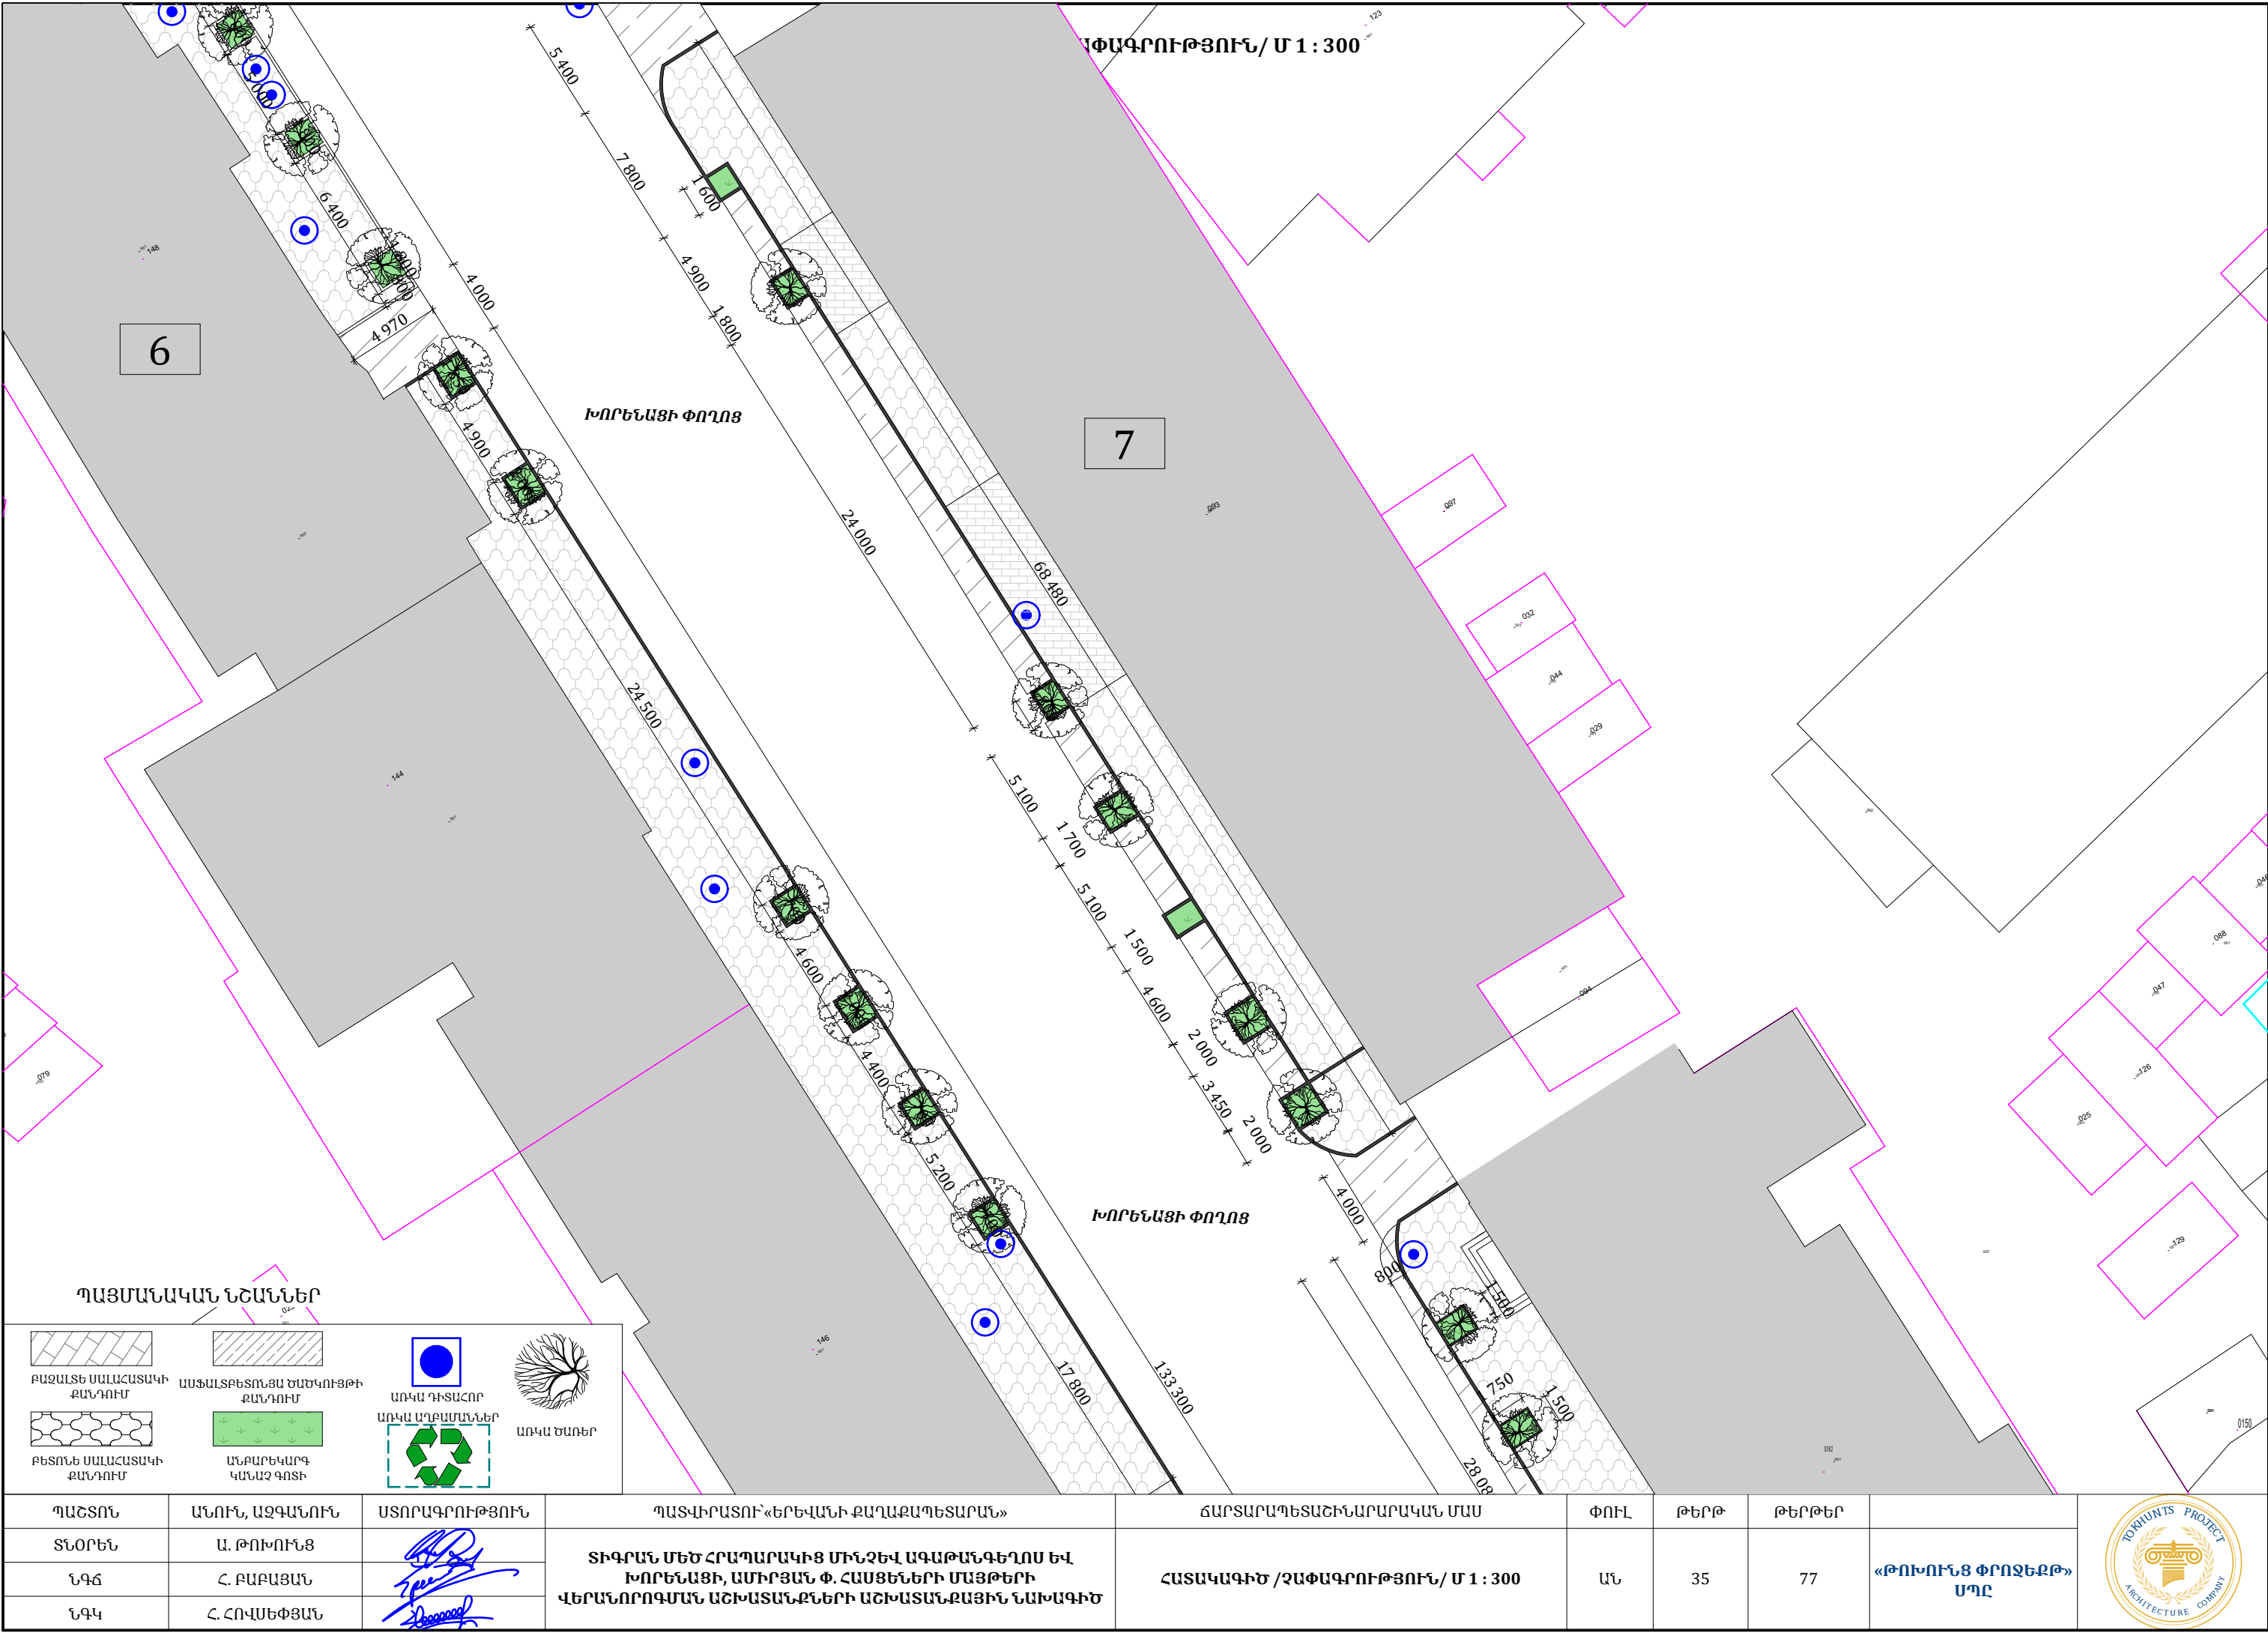

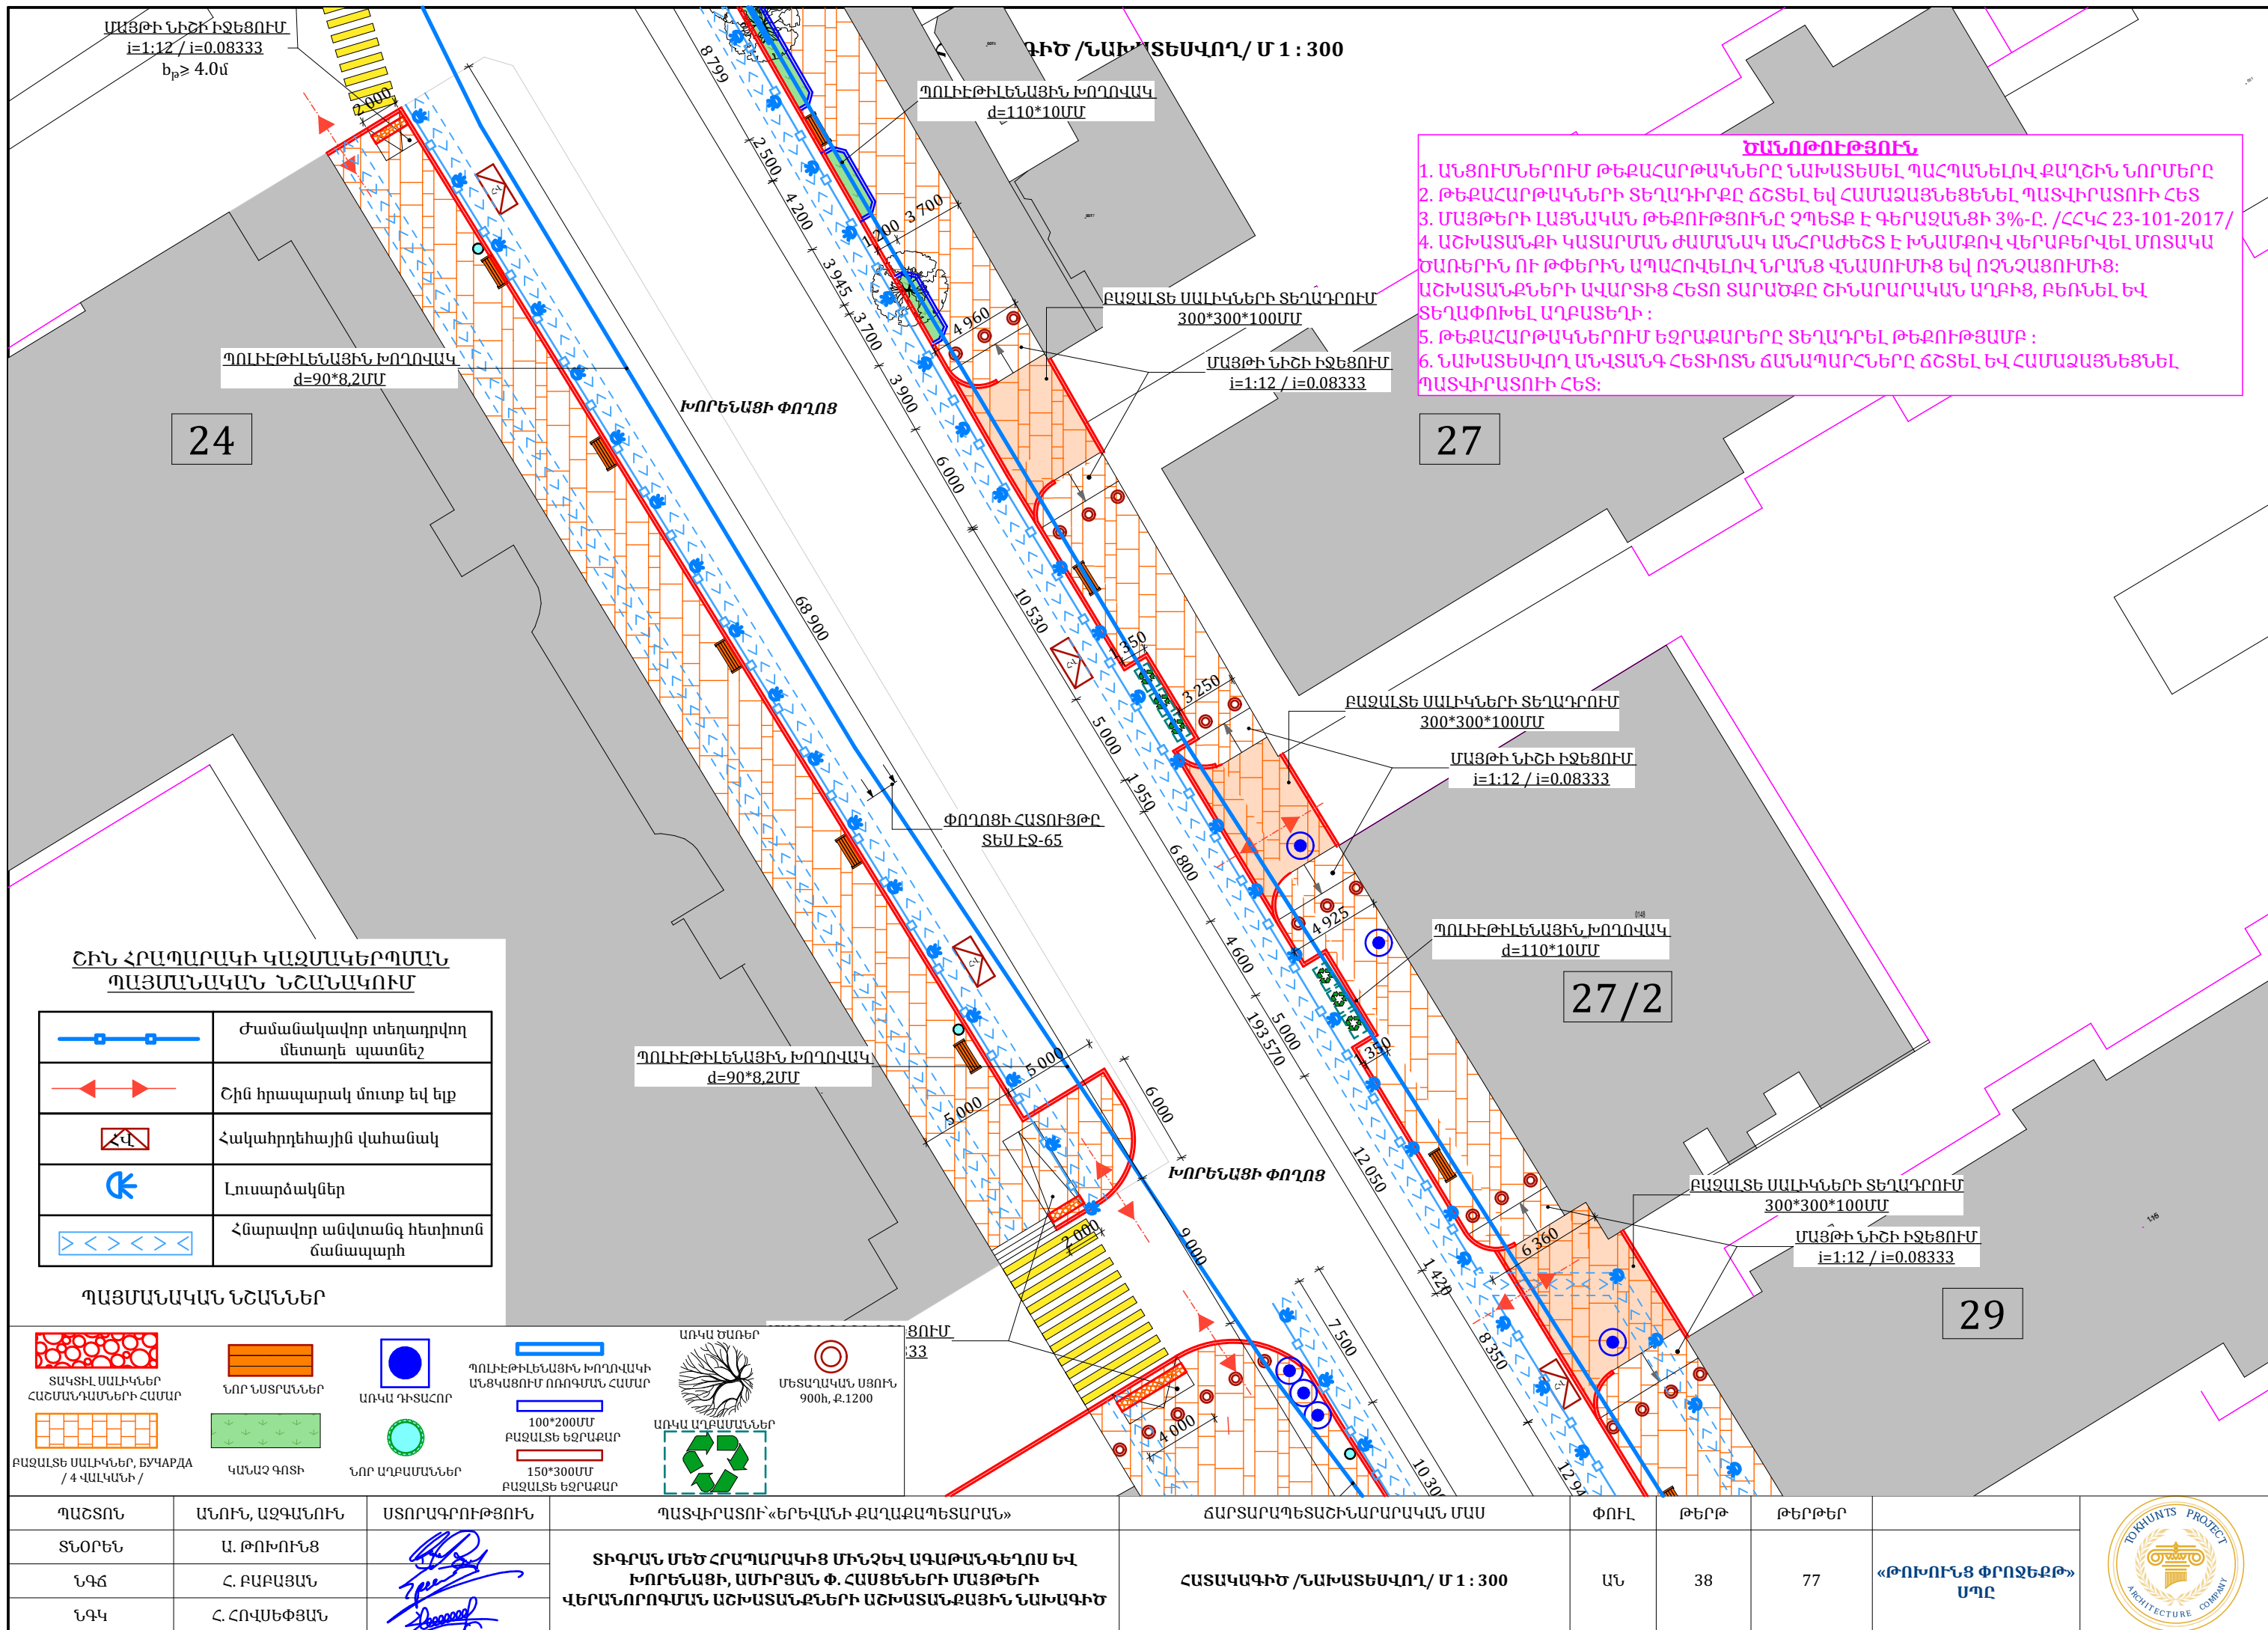

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
- ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵԲԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԸՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 - ԹԵԲԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐԸ ԸՃՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 - ՄԱՑԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏԶ Է ԳԵՐԱԶԱՆՑԻ 3%-Ը, /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆԱՑՈՒՄԻՑ:
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
 - ԹԵԲԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱԶԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴԻՐԵԼ ԹԵԲՈՒԹՅԱՄԲ:
 - ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎԱՆԱԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ԸՃՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ


	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	ՆՈՐ ՆՍՏՐԱՆԵՐ	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ	ՊԼԱՆԻԹԵԼԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԱՆՈՒՄ ՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍՅՈՒՆ 900հ, Բ.1200	ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՏԱՆԵՐ
ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ, ԵՄԿԱՐԺԱ / 4 ՎԱԼԿԱՆԻ /	ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻ	ՆՈՐ ԱՂԲԱՏԱՆԵՐ	100*200ՄՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱԶԱՐ		
			150*300ՄՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱԶԱՐ		

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՑԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՑԻՆ ՆԱԽԱԳԻՏ	ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	38	77	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԺՐ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՆՓՅԱՆ								



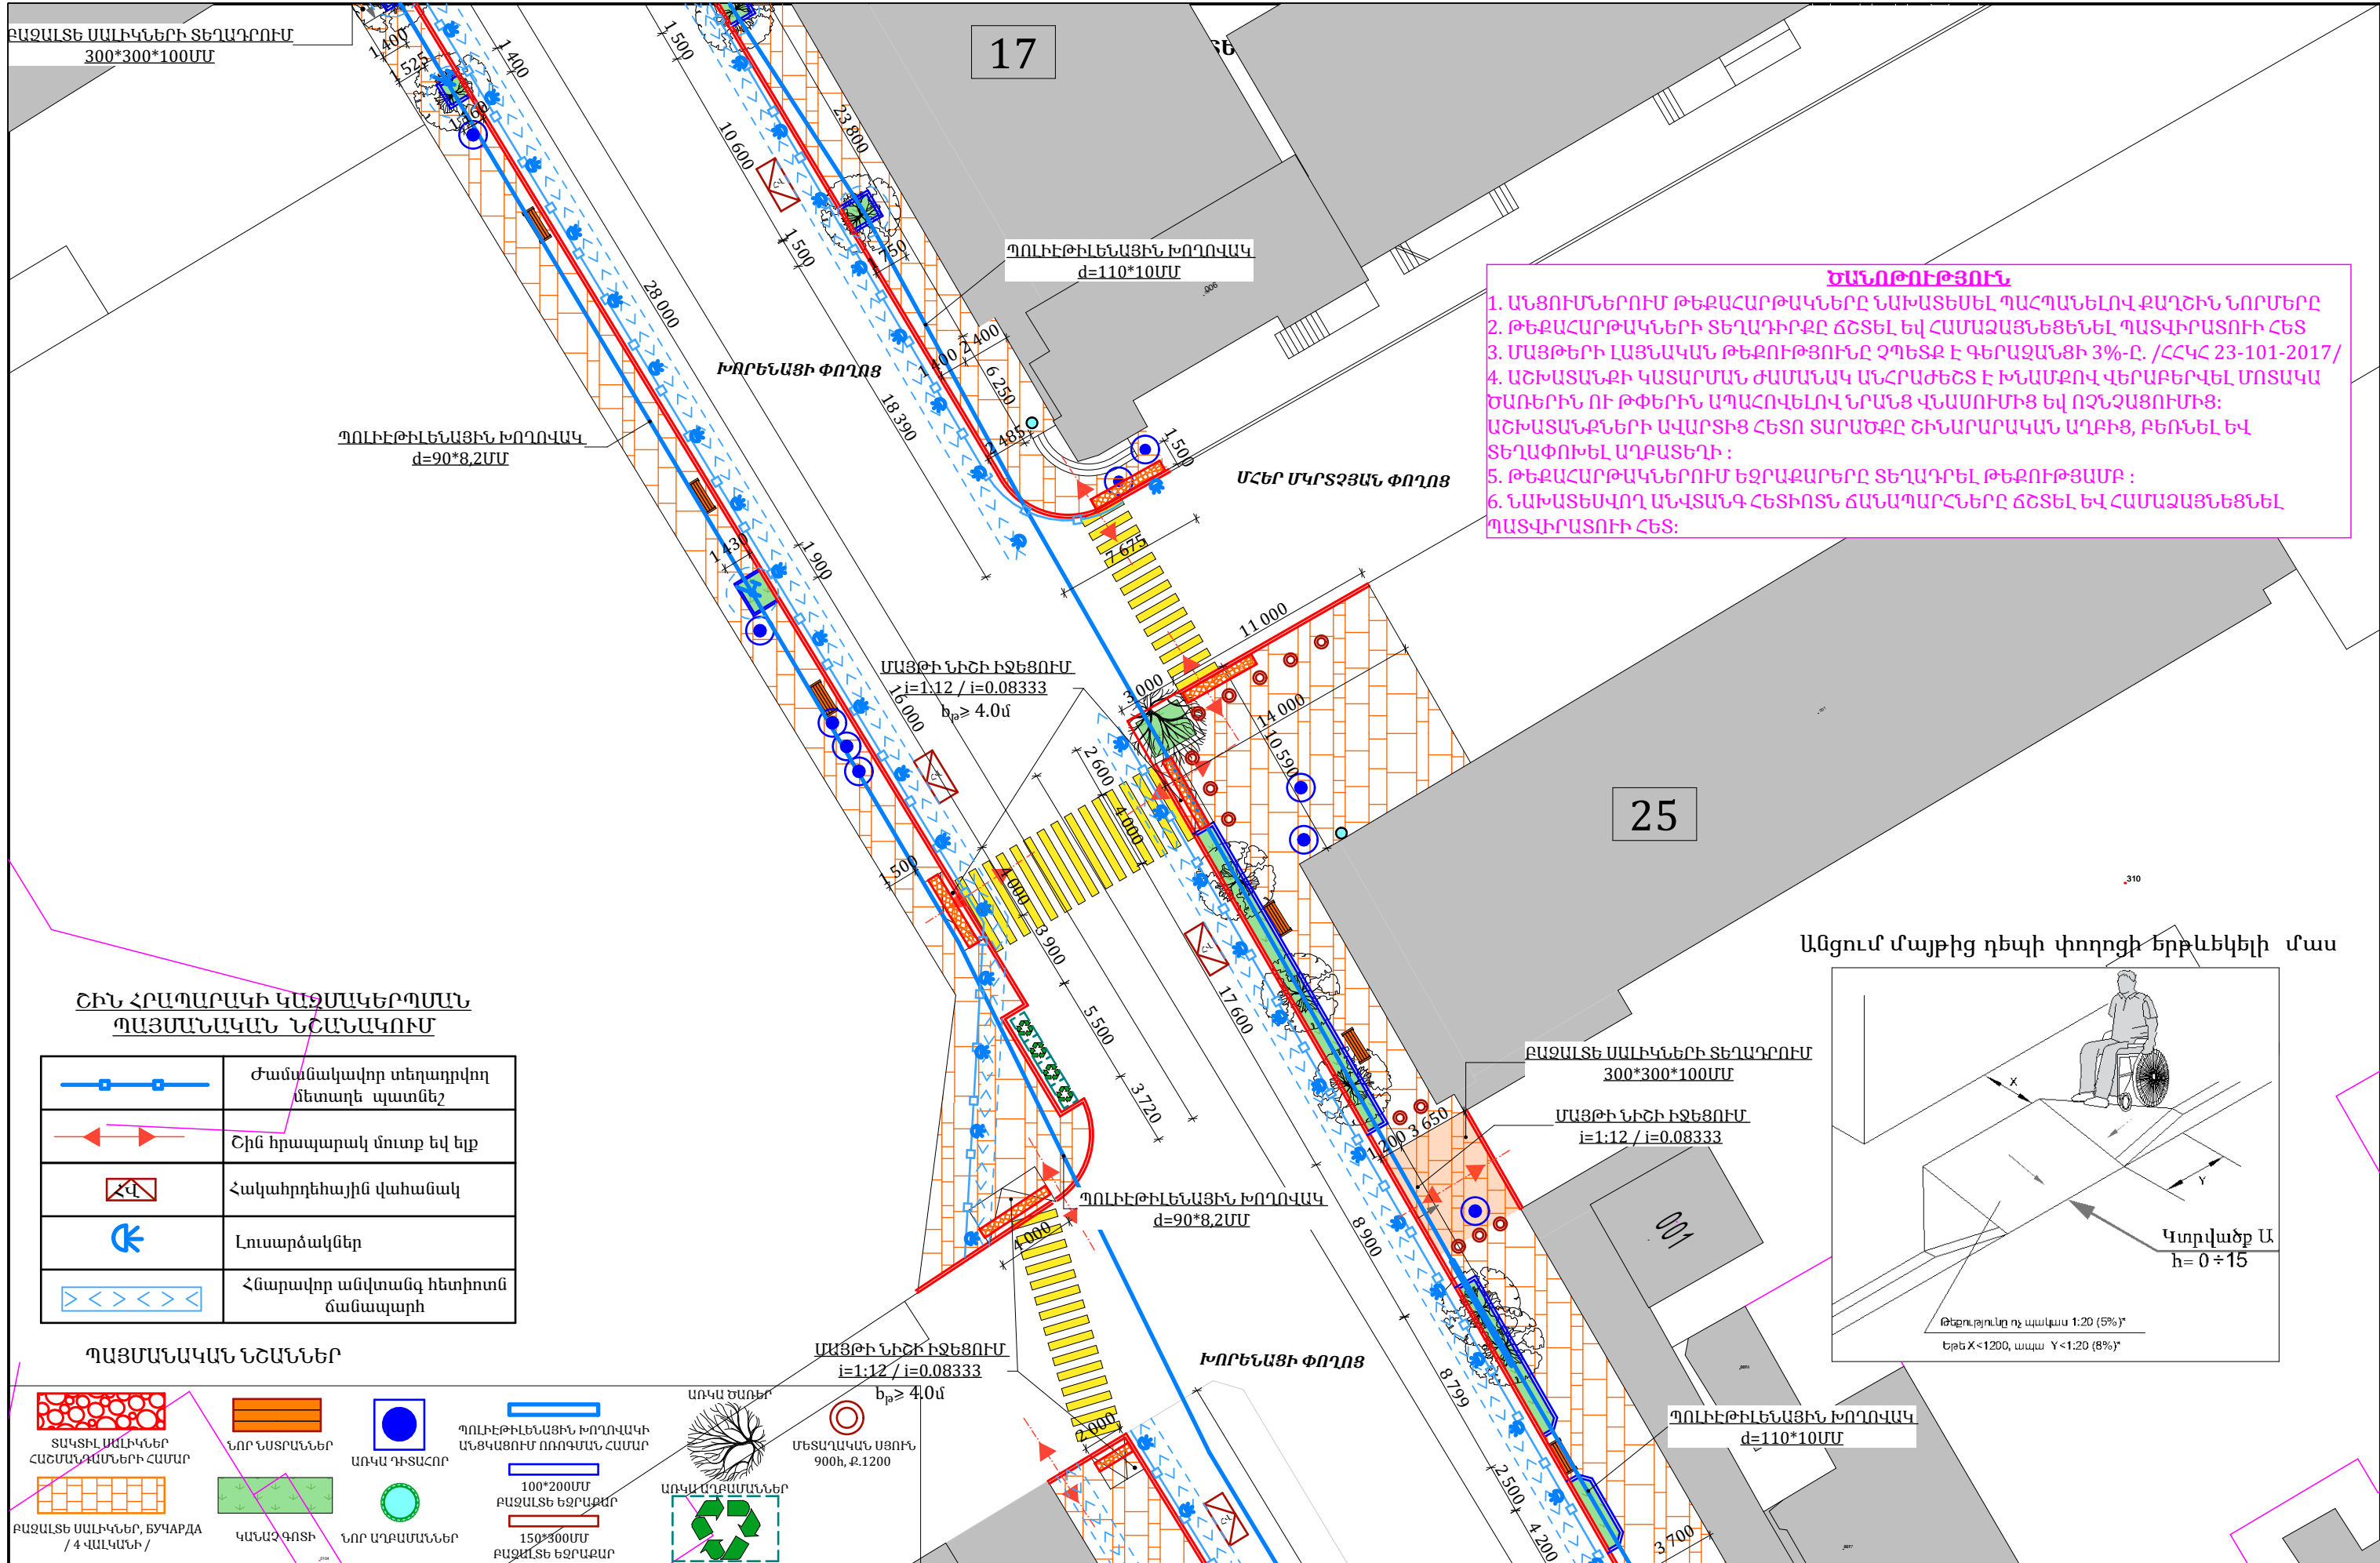

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 2. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՃՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 3. ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆԱՑՈՒՄԻՑ:
 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ :
 6. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՏԱԿՏԻ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆՈՒՄԻ ՇԱՄԱՐ

ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ

ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ

ՊԼԻԲԵԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՒՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԿԱՆԱԶԳՈՏԻ

ՆՈՐ ԱՂԲԱՏԱՆՆԵՐ

100*200ՄՄ ԲԱԶԱՆԵՆ ԵԶՐԱԲԱՐ


150*300ՄՄ ԲԱԶԱՆԵՆ ԵԶՐԱԲԱՐ

ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՏԱՆՆԵՐ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍՑՈՒՆ 900h, Բ.1200


ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՑԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	39	77	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՏԵՓՅԱՆ								



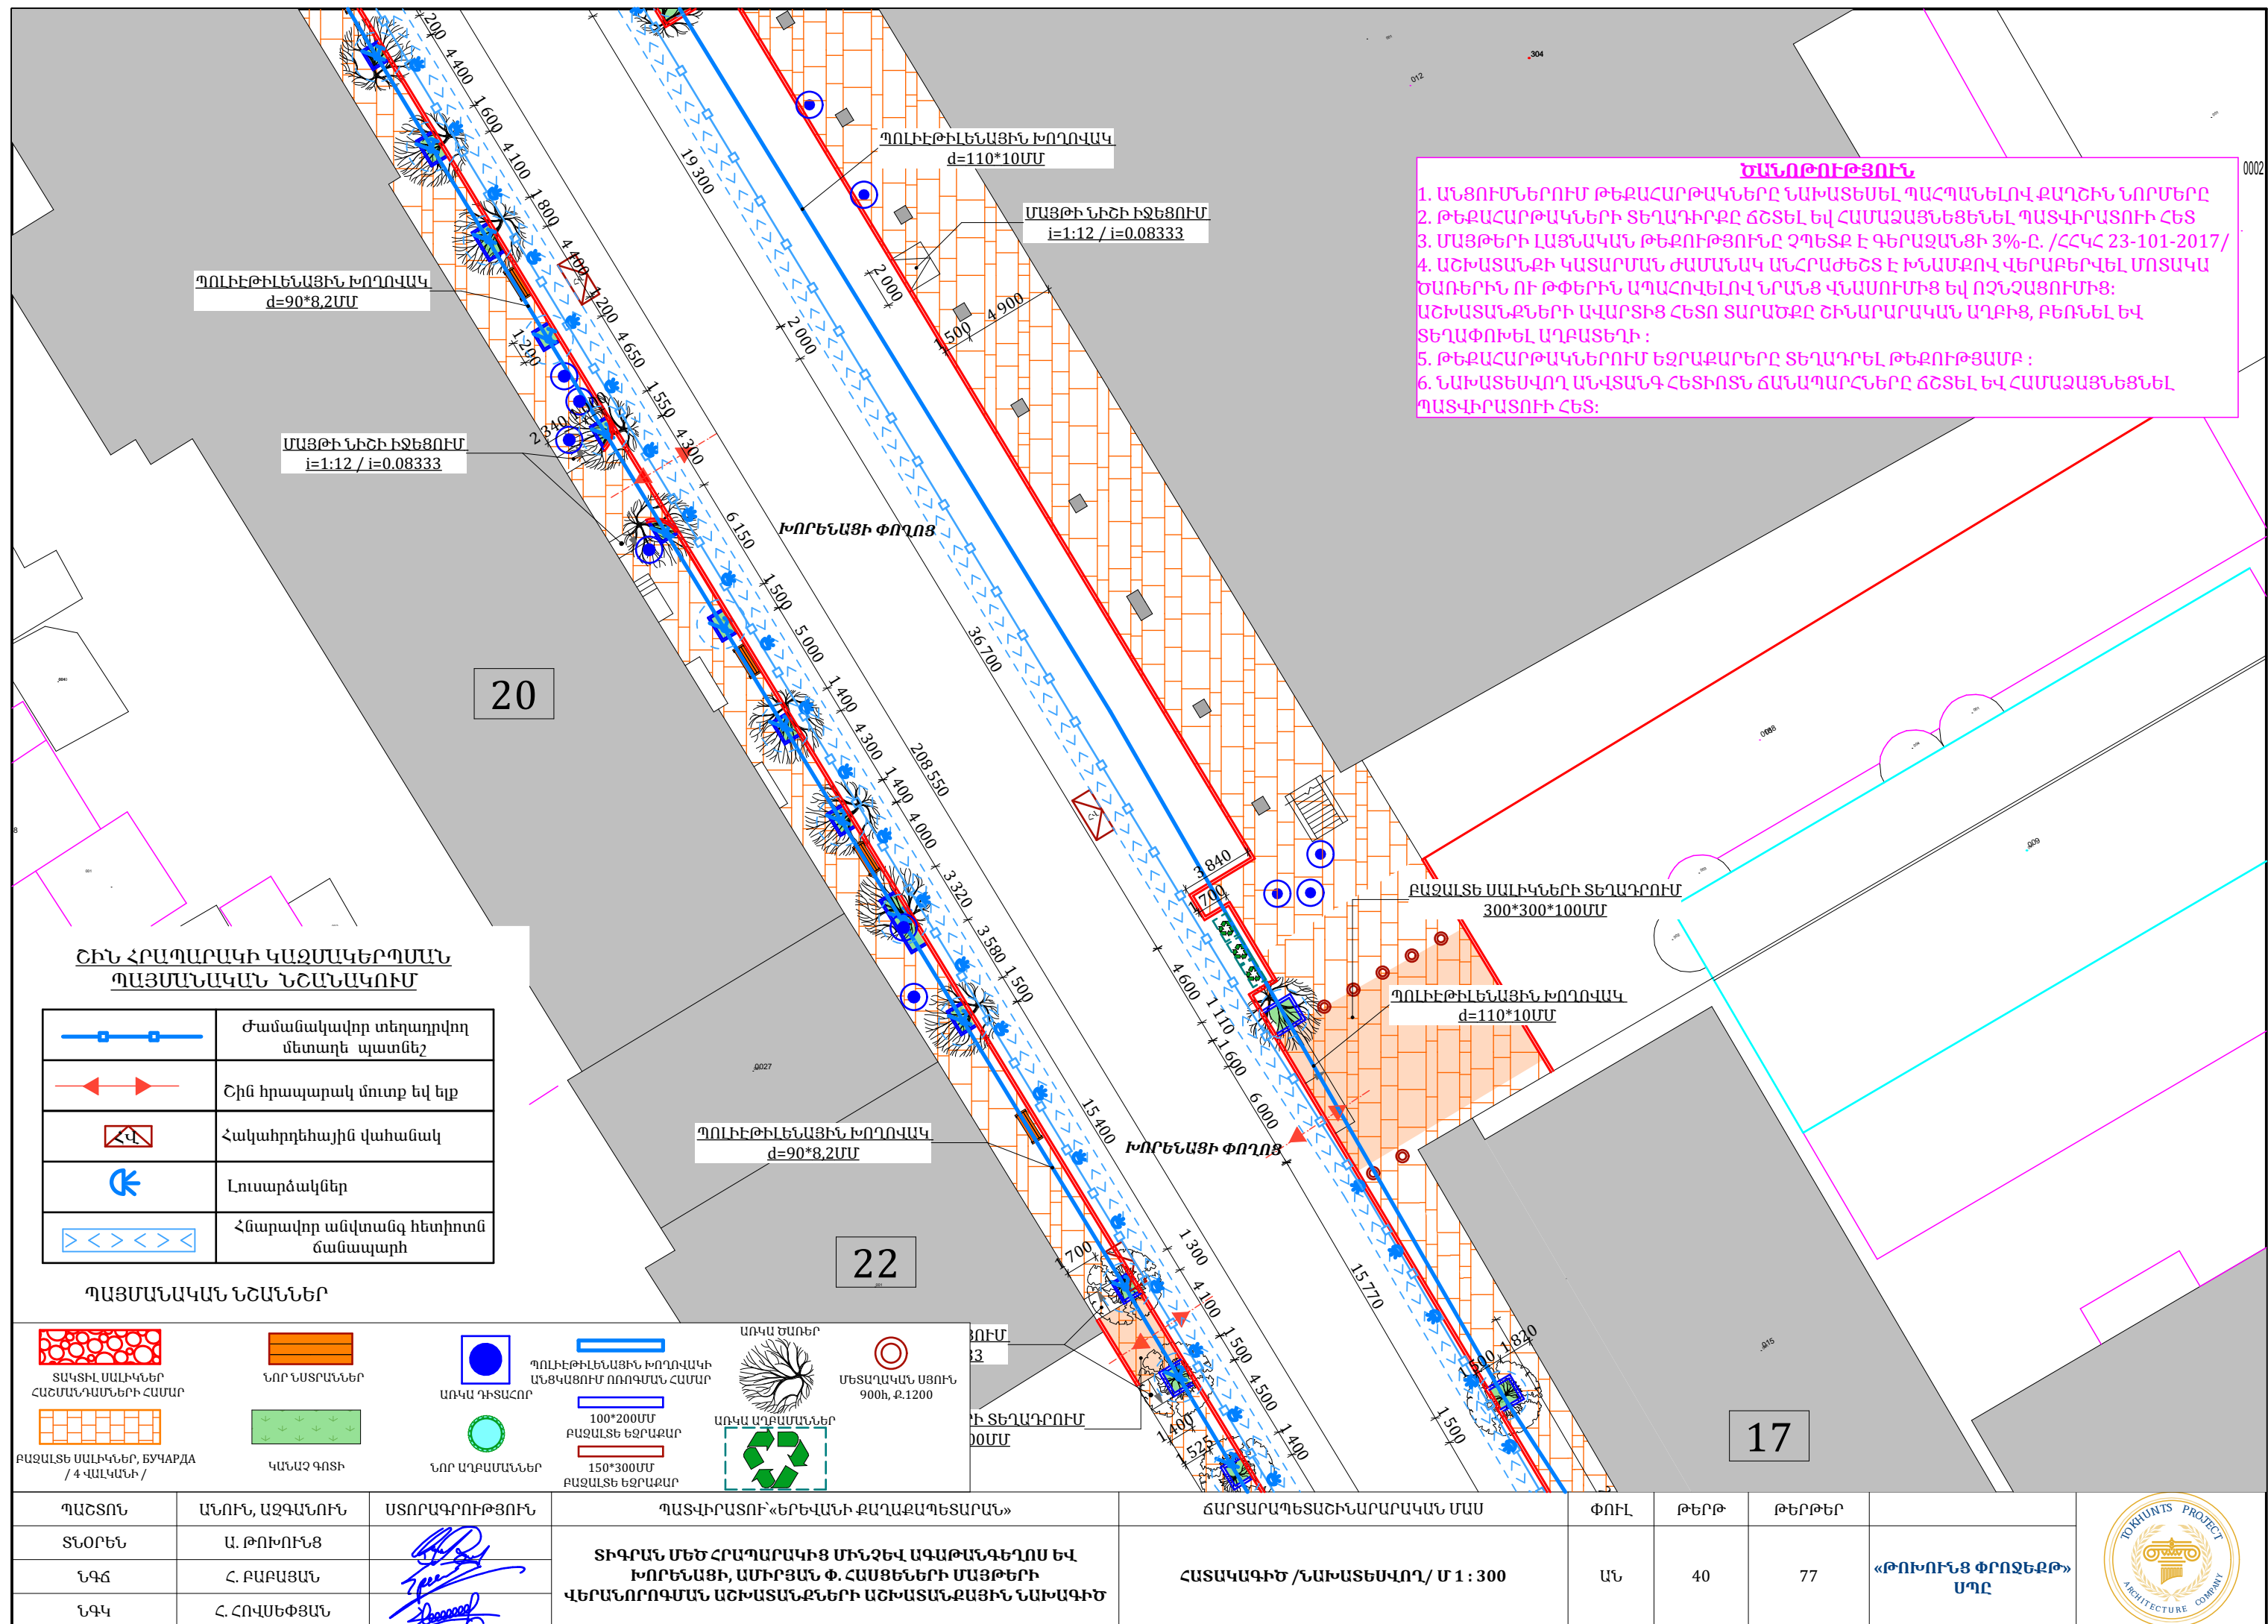

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
- 2. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՑՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
- 3. ՄԱՑԹԵՐԻ ԼԱՑՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
- 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱՔԵՐԿԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԻՑ:
- ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ :
- 5. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴԻՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ :
- 6. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՑՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

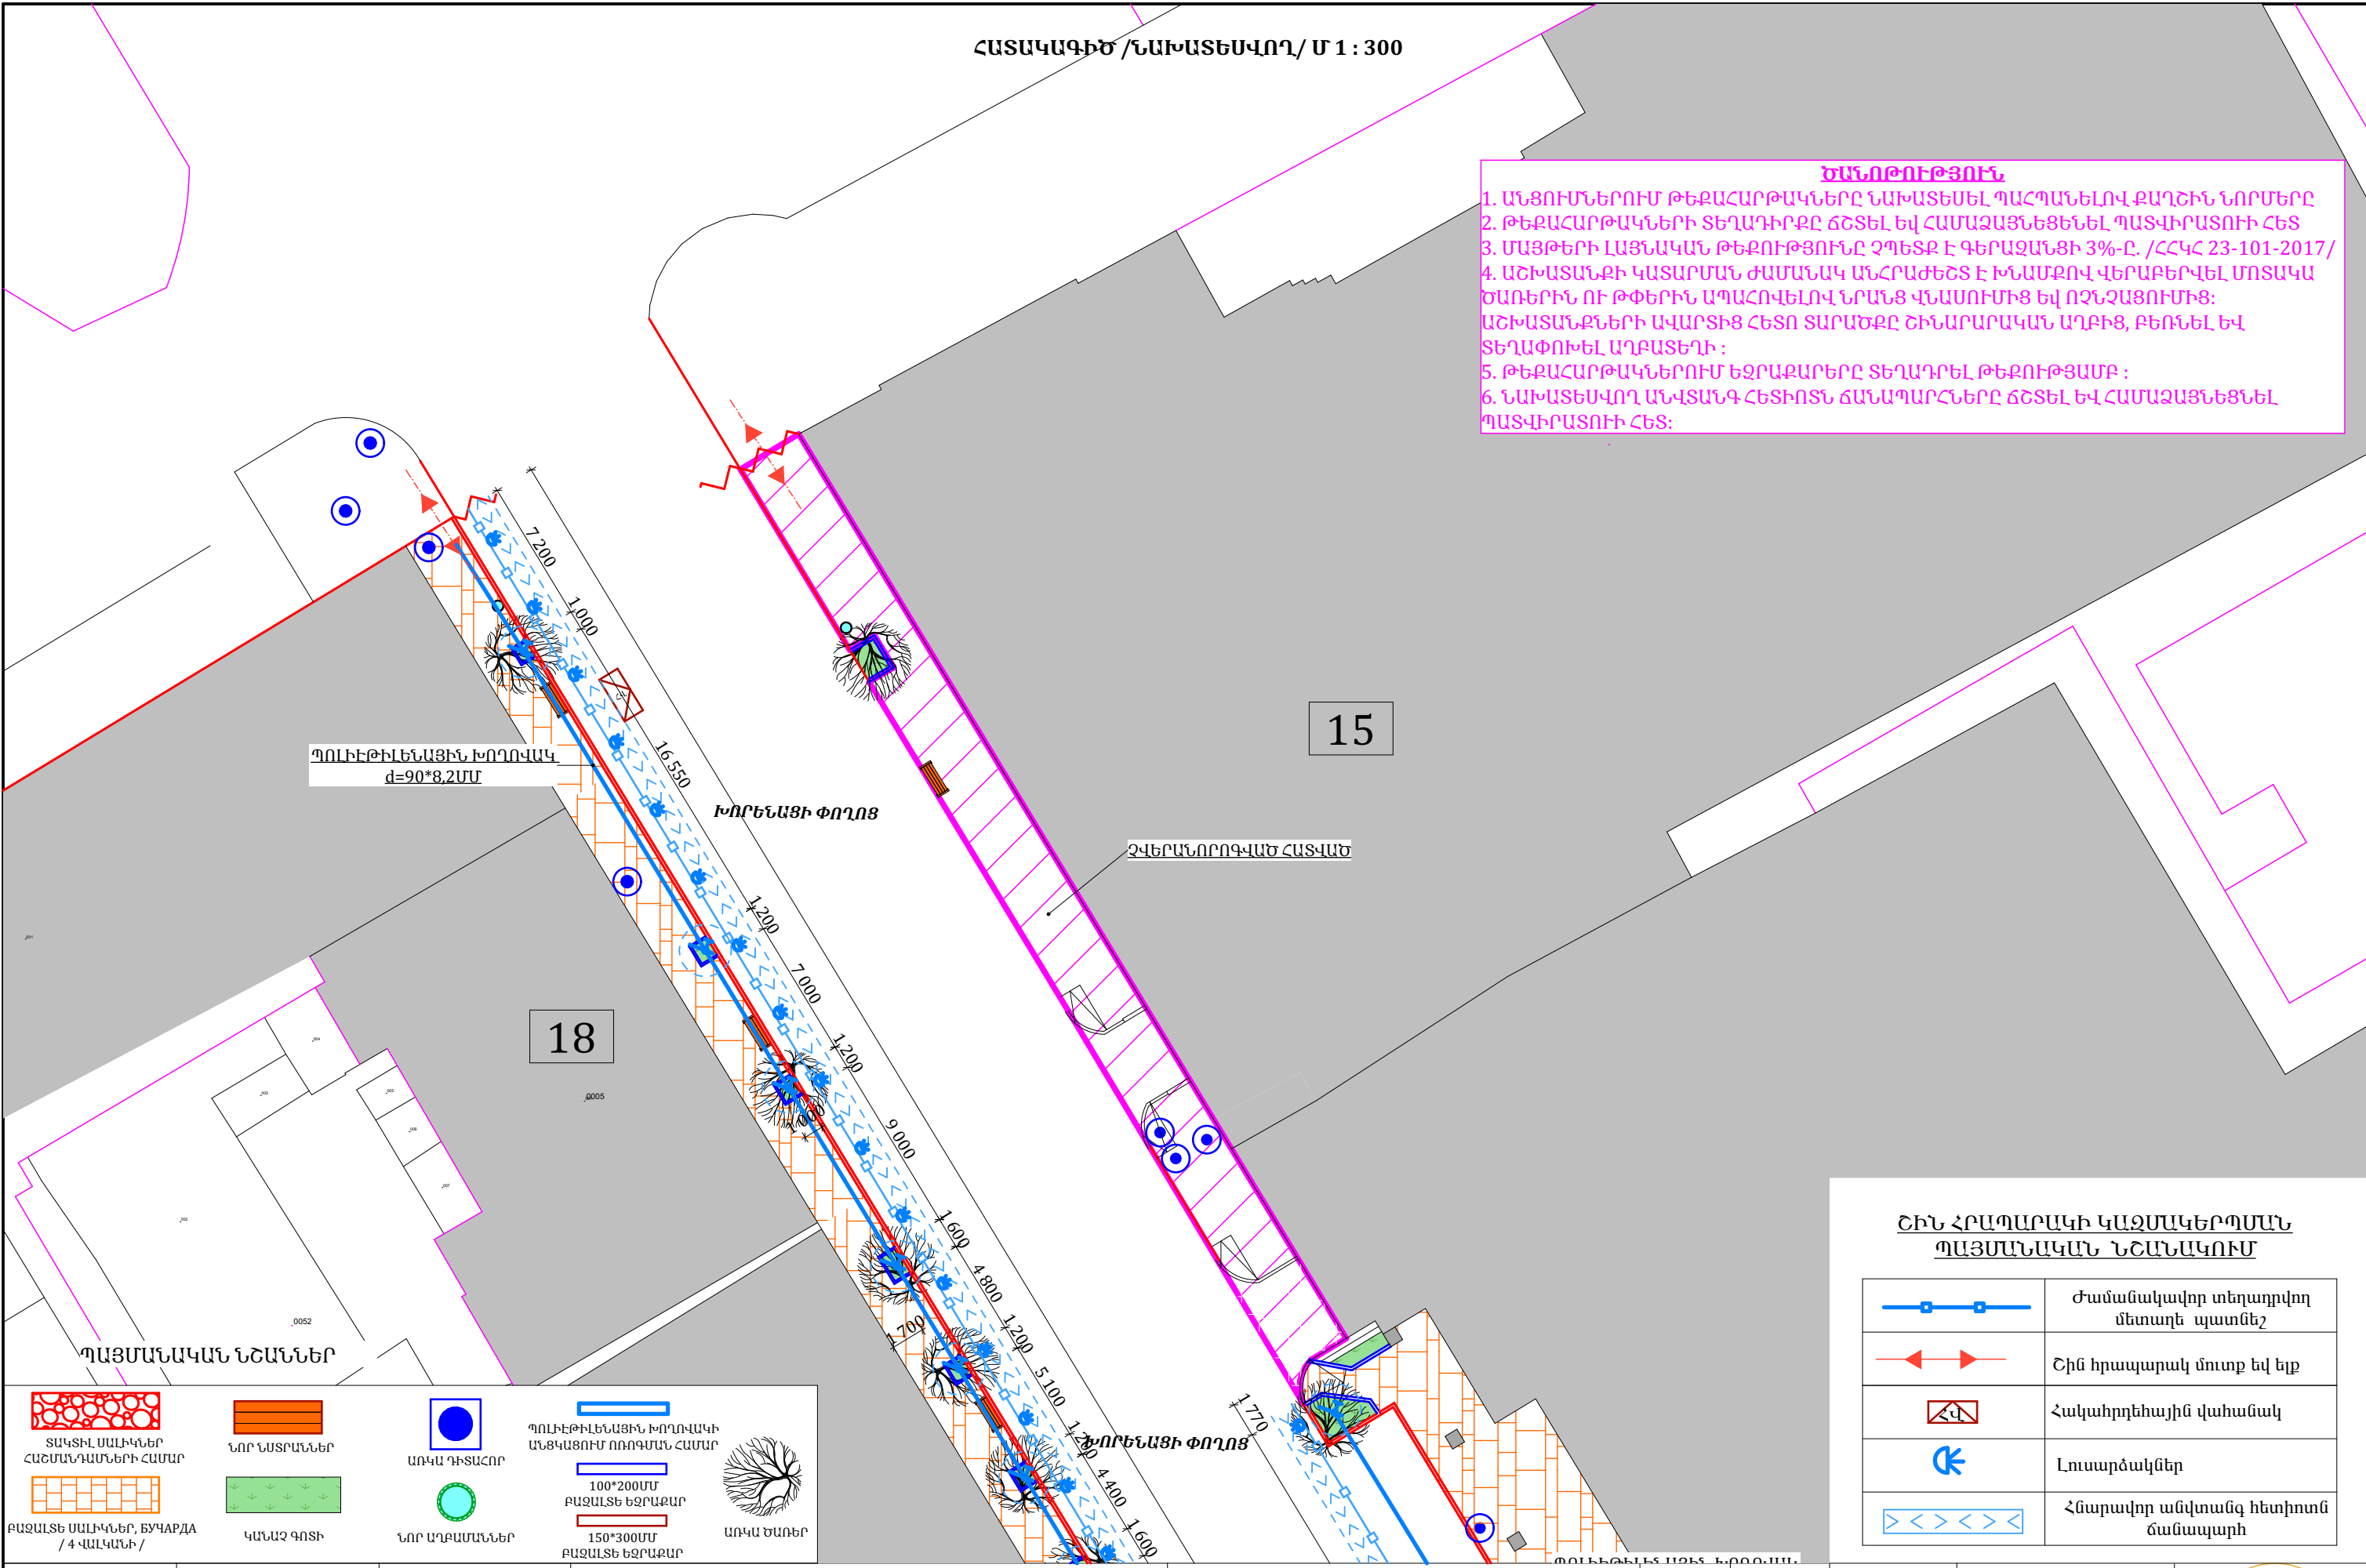

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՏԱԿՏԻ ՍԱԽԿՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆՊԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ

ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ

ՊՈՒԽԵԹԻԼԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԽԿՆԵՐ, ԵՄԿԱՐԴԱ / 4 ՎԱԼԿԱՆԻ /

ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ


ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ


100*200ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ

ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ

150*300ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՐՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՑԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՑԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	41	77	«ԹՈՒՈՒՐՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՏԵՓՅԱՆ								

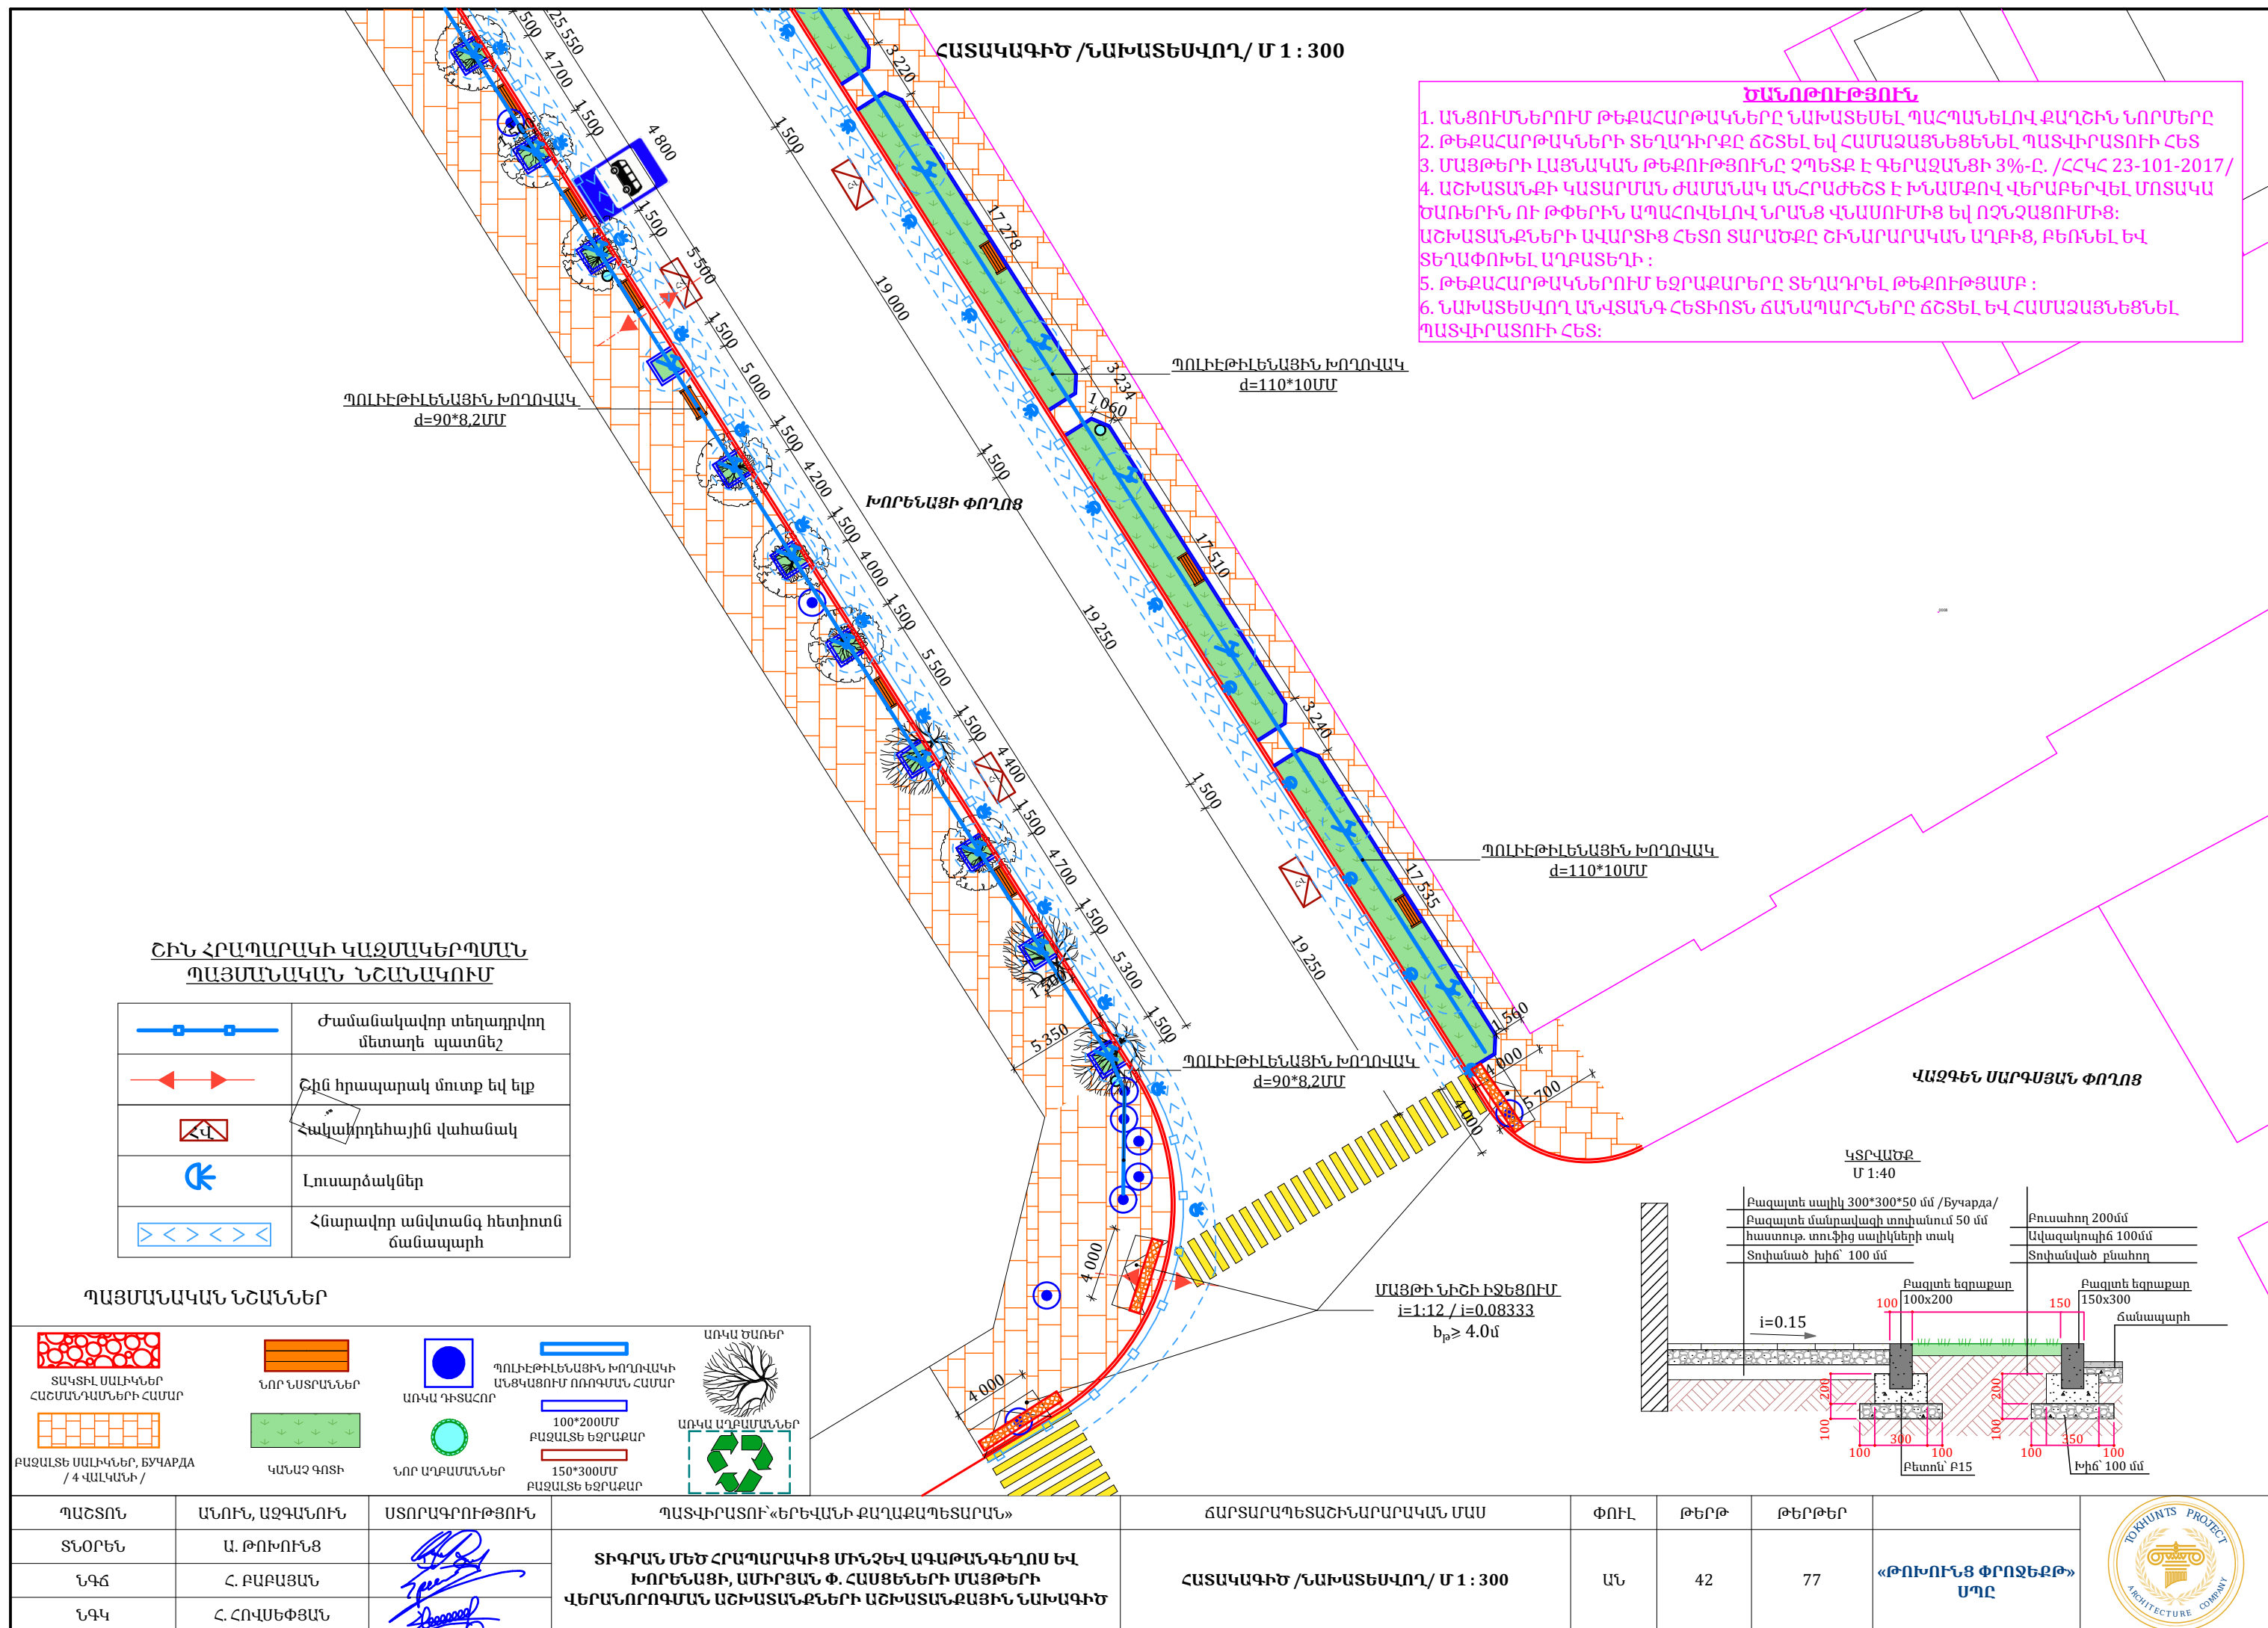

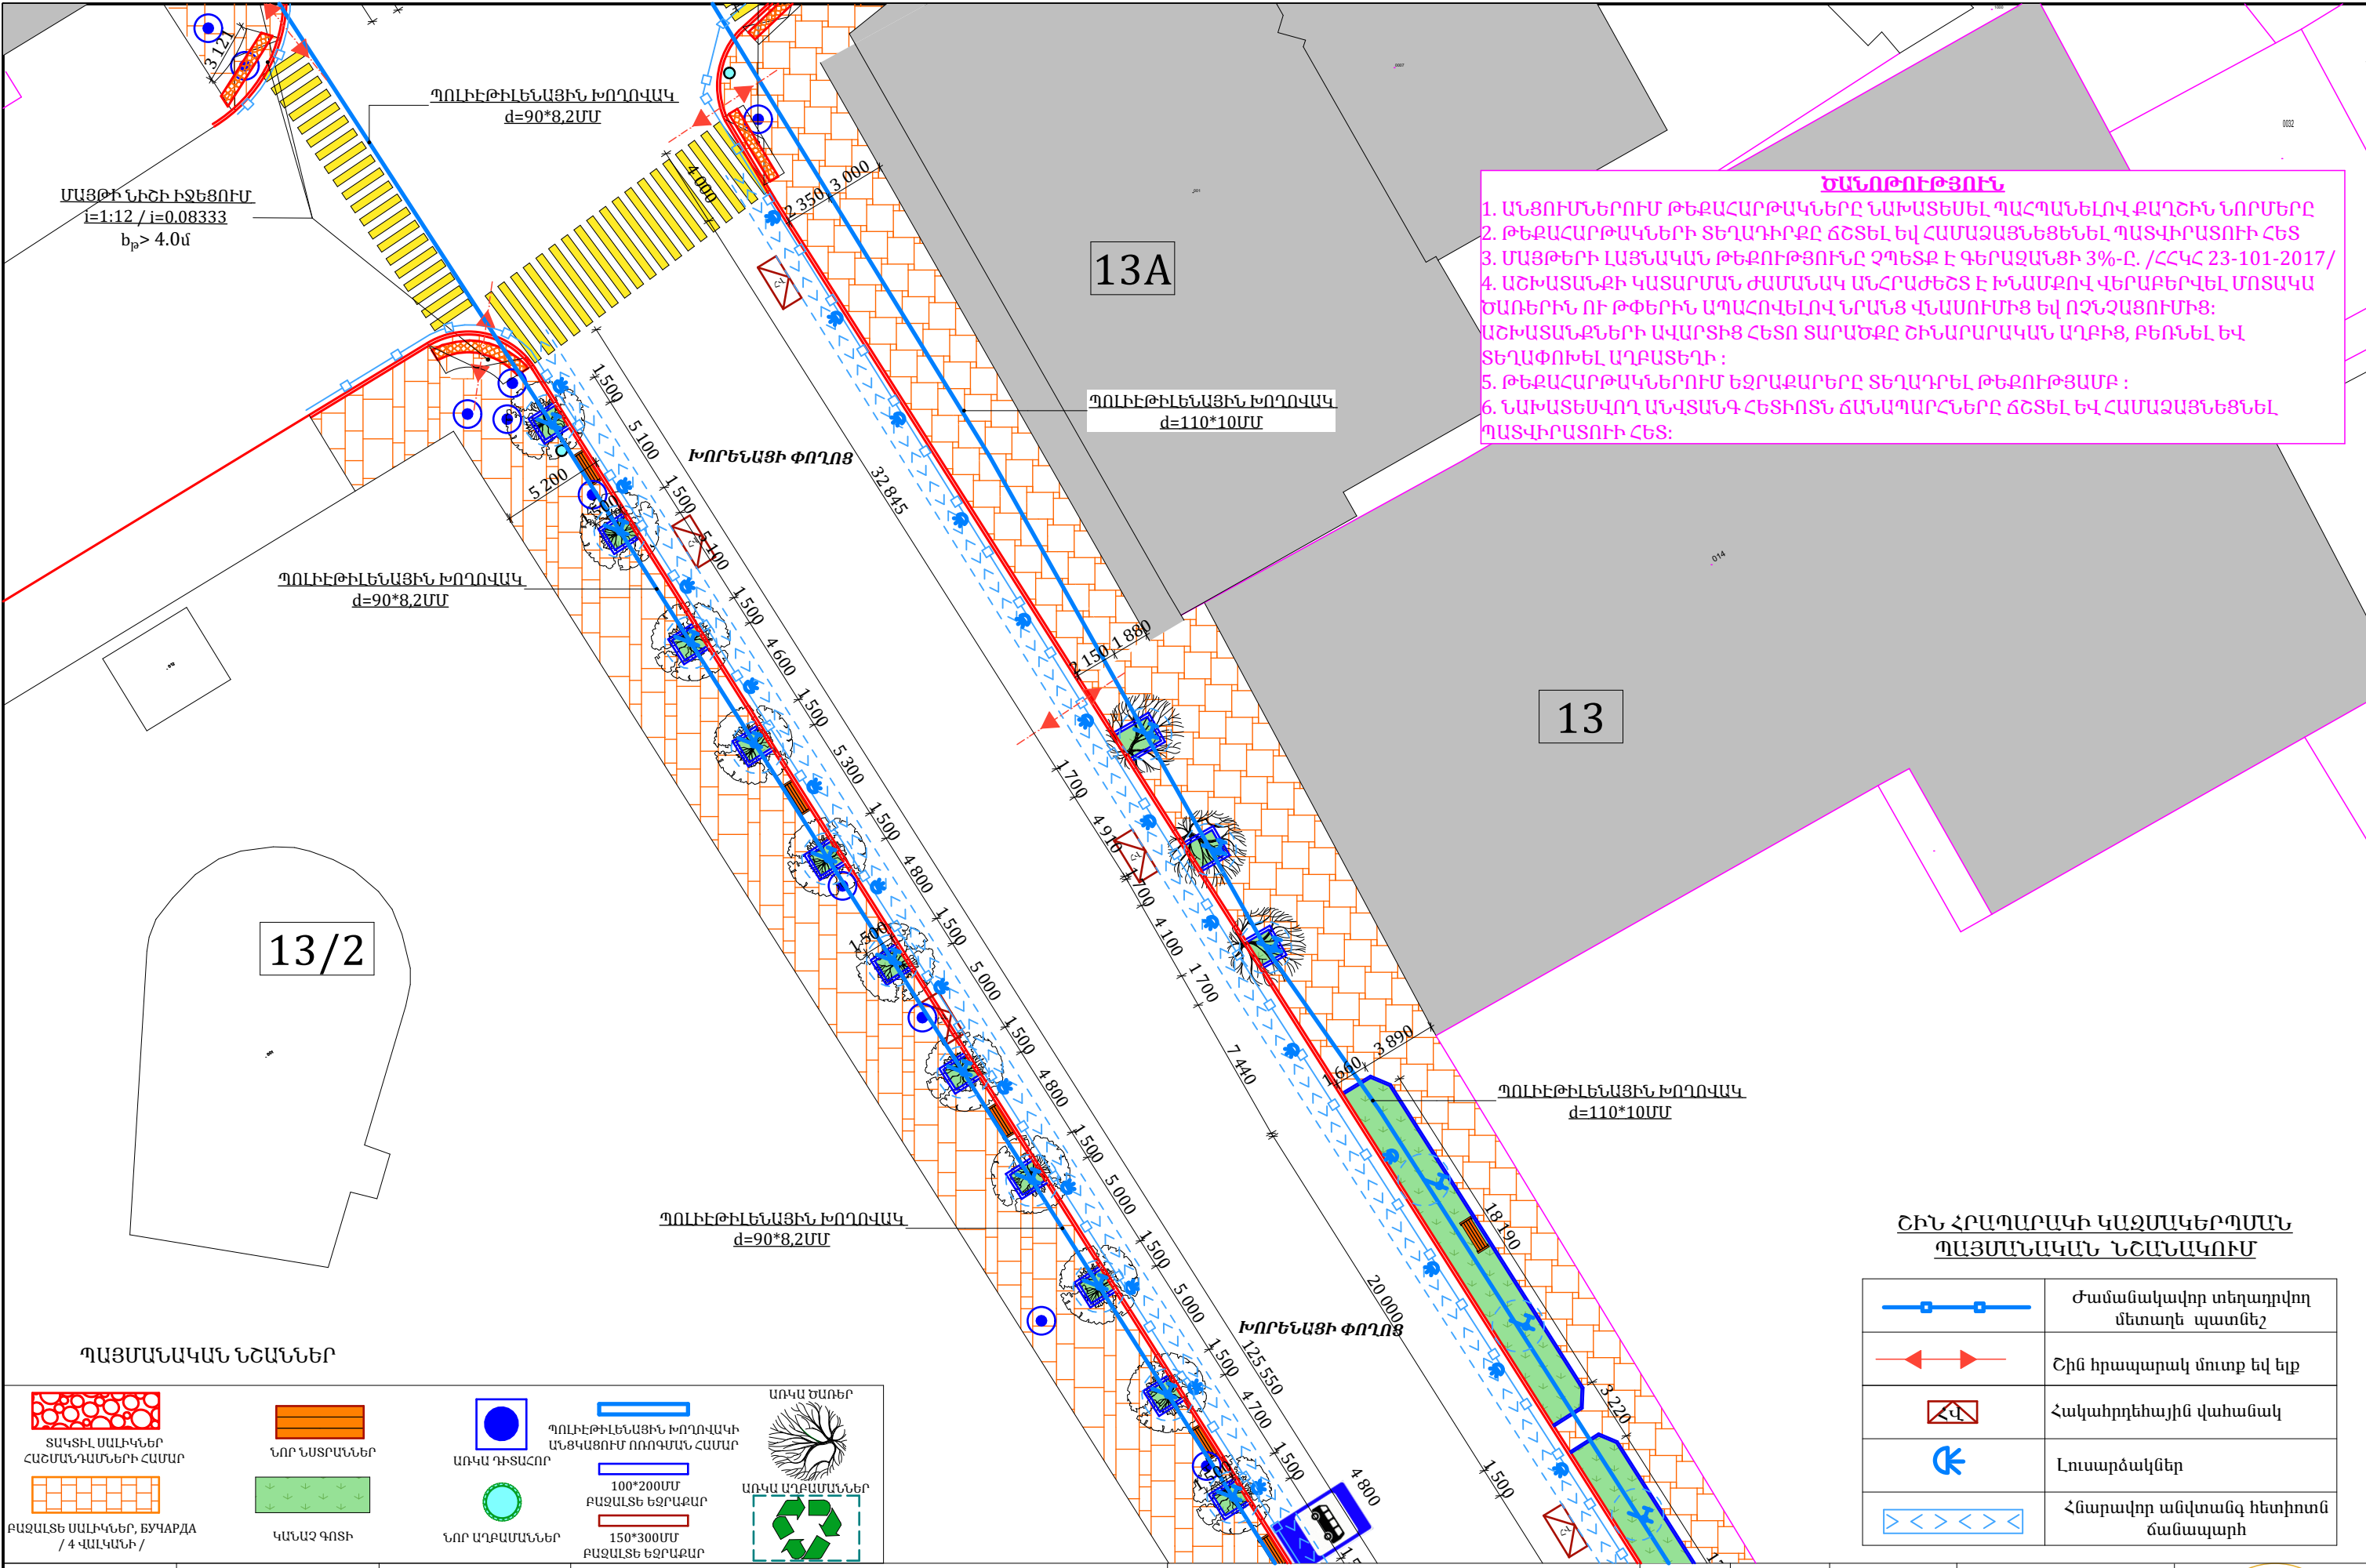



- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 2. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐԸ ԾՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 3. ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏԶ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆԱՑՈՒՄԻՑ:
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾԸ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ :
 5. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱԶԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ :
 6. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ԾՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	 ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ	 ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ	 ՊՈԼԻԹԵԽՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	 ԱՌԿԱ ԾԱՌՈՐ
 ԲԱԶԱՆՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ, ԵՍԿԱՐԴԱ / 4 ՎԱԼԿԱՆԻ /	 ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ	 ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ	 100*200ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱԶԱՐ	 ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ
			 150*300ՄՄ ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱԶԱՐ	

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	
	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահիդրոէկային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	43	77		
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՏԵՓՅԱՆ								

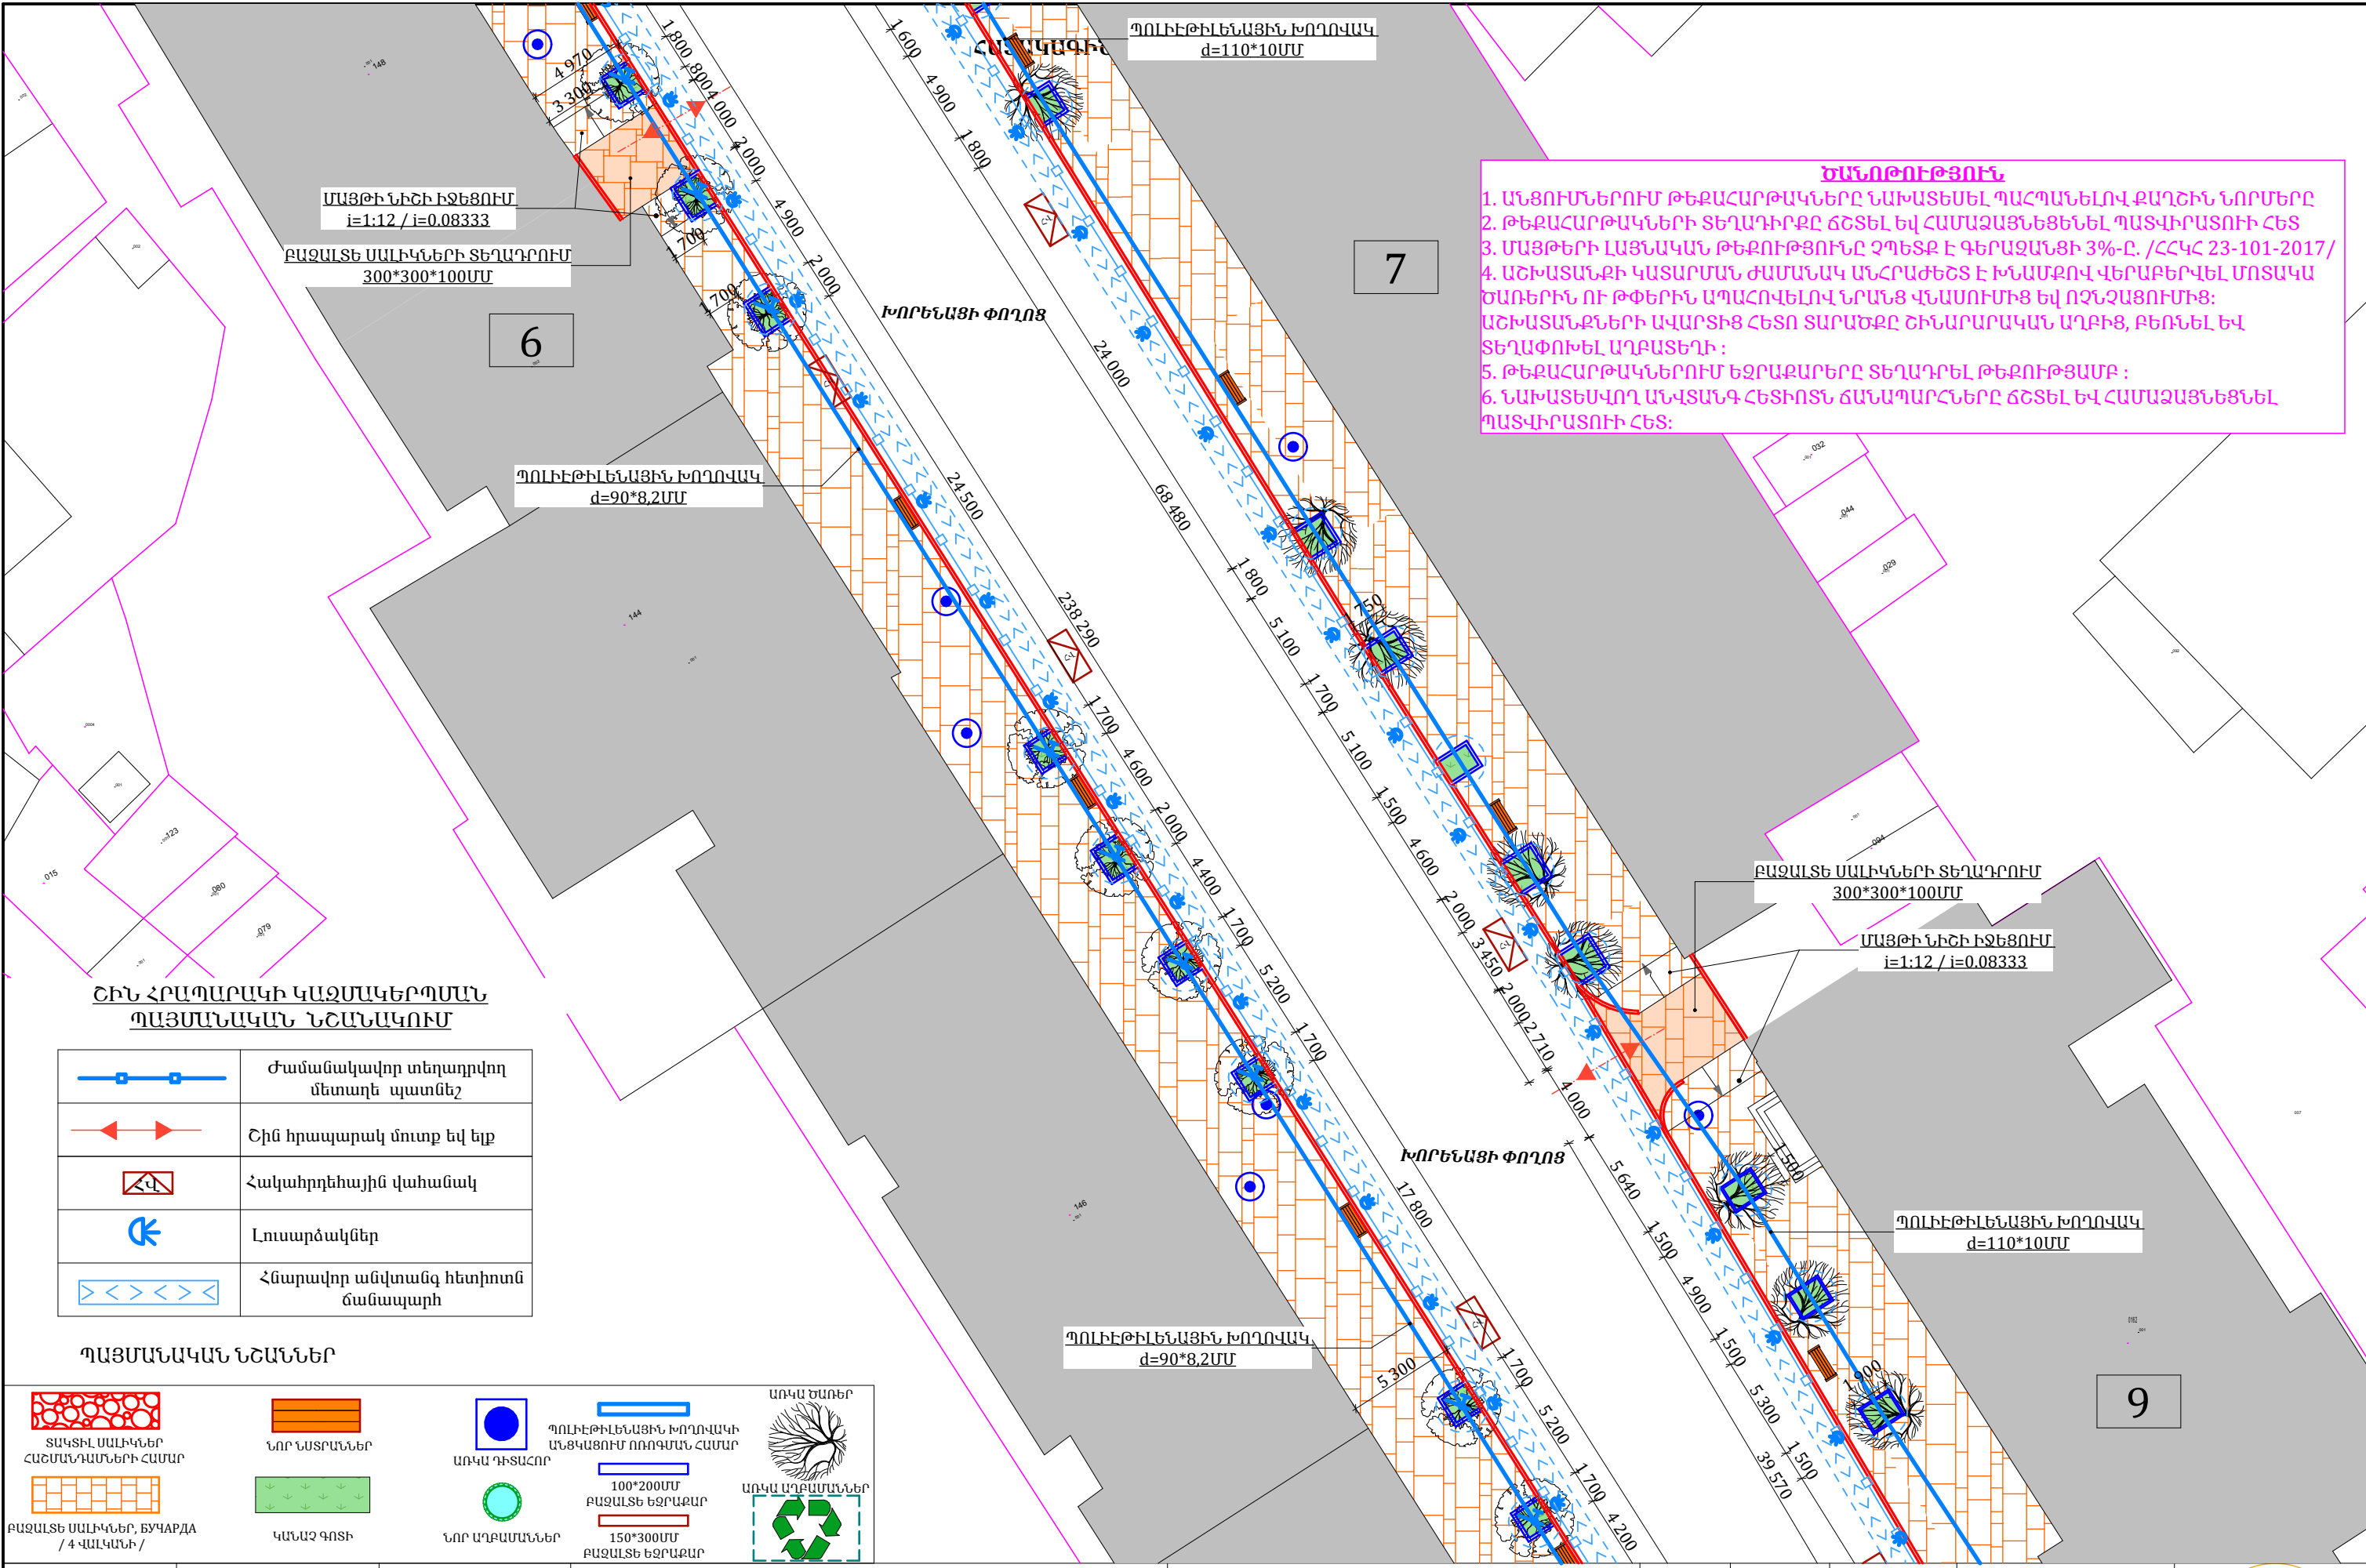

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
- ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 - ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՔԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՑՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 - ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՆԱԽԱՐՈՎ ՎԵՐԱՔԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆԱՑՈՒՄԻՑ:
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
 - ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ:
 - ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՑՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿԵՐ ՀԱՇՄԱՆՊԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ	ՊՈԼԻԹԵԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	ԱՌԿԱ ԾԱՌՈՐ
ԲԱԶԱԼԻՏԵ ՍԱԼԻԿԵՐ, ԵՄԿԱՐԴԱ / 4 ՎԱԼԿԱՆԻ /	ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ	ՆՈՐ ԱՂԲԱՏՄԱՆՆԵՐ	100*200ՄՄ ԲԱԶԱԼԻՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ	ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՏՄԱՆՆԵՐ
			150*300ՄՄ ԲԱԶԱԼԻՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ	

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՐՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՑԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ / Մ 1 : 300	ԱՆ	45	77	«ԹՈՒՈՒՐՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳՎ	Հ. ՀՈՎԱՏԵՓՅԱՆ								

ԱՄԻՐՅԱՆ ՓՈԴՈՑ
ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1 : 300

27

1
1
5

40 000

61 300

ԱՄԻՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ

22

2650 750

1 500

3 100

6 000

27 725

1 000

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ԲԱԶԱՆԵ ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆՅԱ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ	ԱՌԿԱ ԾԱՌՈՐ
ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԱՀԱՏԱԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	ԱՆՔԱՐԵԿԱՐԳ ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻ	ԱՌԿԱ ԱՂՔԱՄԱՆՆԵՐ	

1
1⁶
5


ԱՄԷՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

22

			
ԲԱՋԱՆՏԵ ՍԱՆՎԱՏԱՄԿԻ ՔԱՆՈՒՄ	ԱՍՖԱԼՏՔԵՏՈՆՅԱ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆՈՒՄ	ԱՌԿԱ ԴԵՏԱՆՈՐ	
			
ԲԵՏՈՆԵ ՍԱՆՎԱՏԱՄԿԻ ՔԱՆՈՒՄ	ԱՆՔԱՐԵԿԱՆԳ ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻ	ԱՌԿԱ ԱՐԳԱՄԱՆԻՐ	ԱՌԿԱ ԾԱՌԵՐ


ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՅ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂԱՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՅԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Մ 1 : 300	ԱՆ	49	77	«ԹՈՒՈՒՆՅ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ								

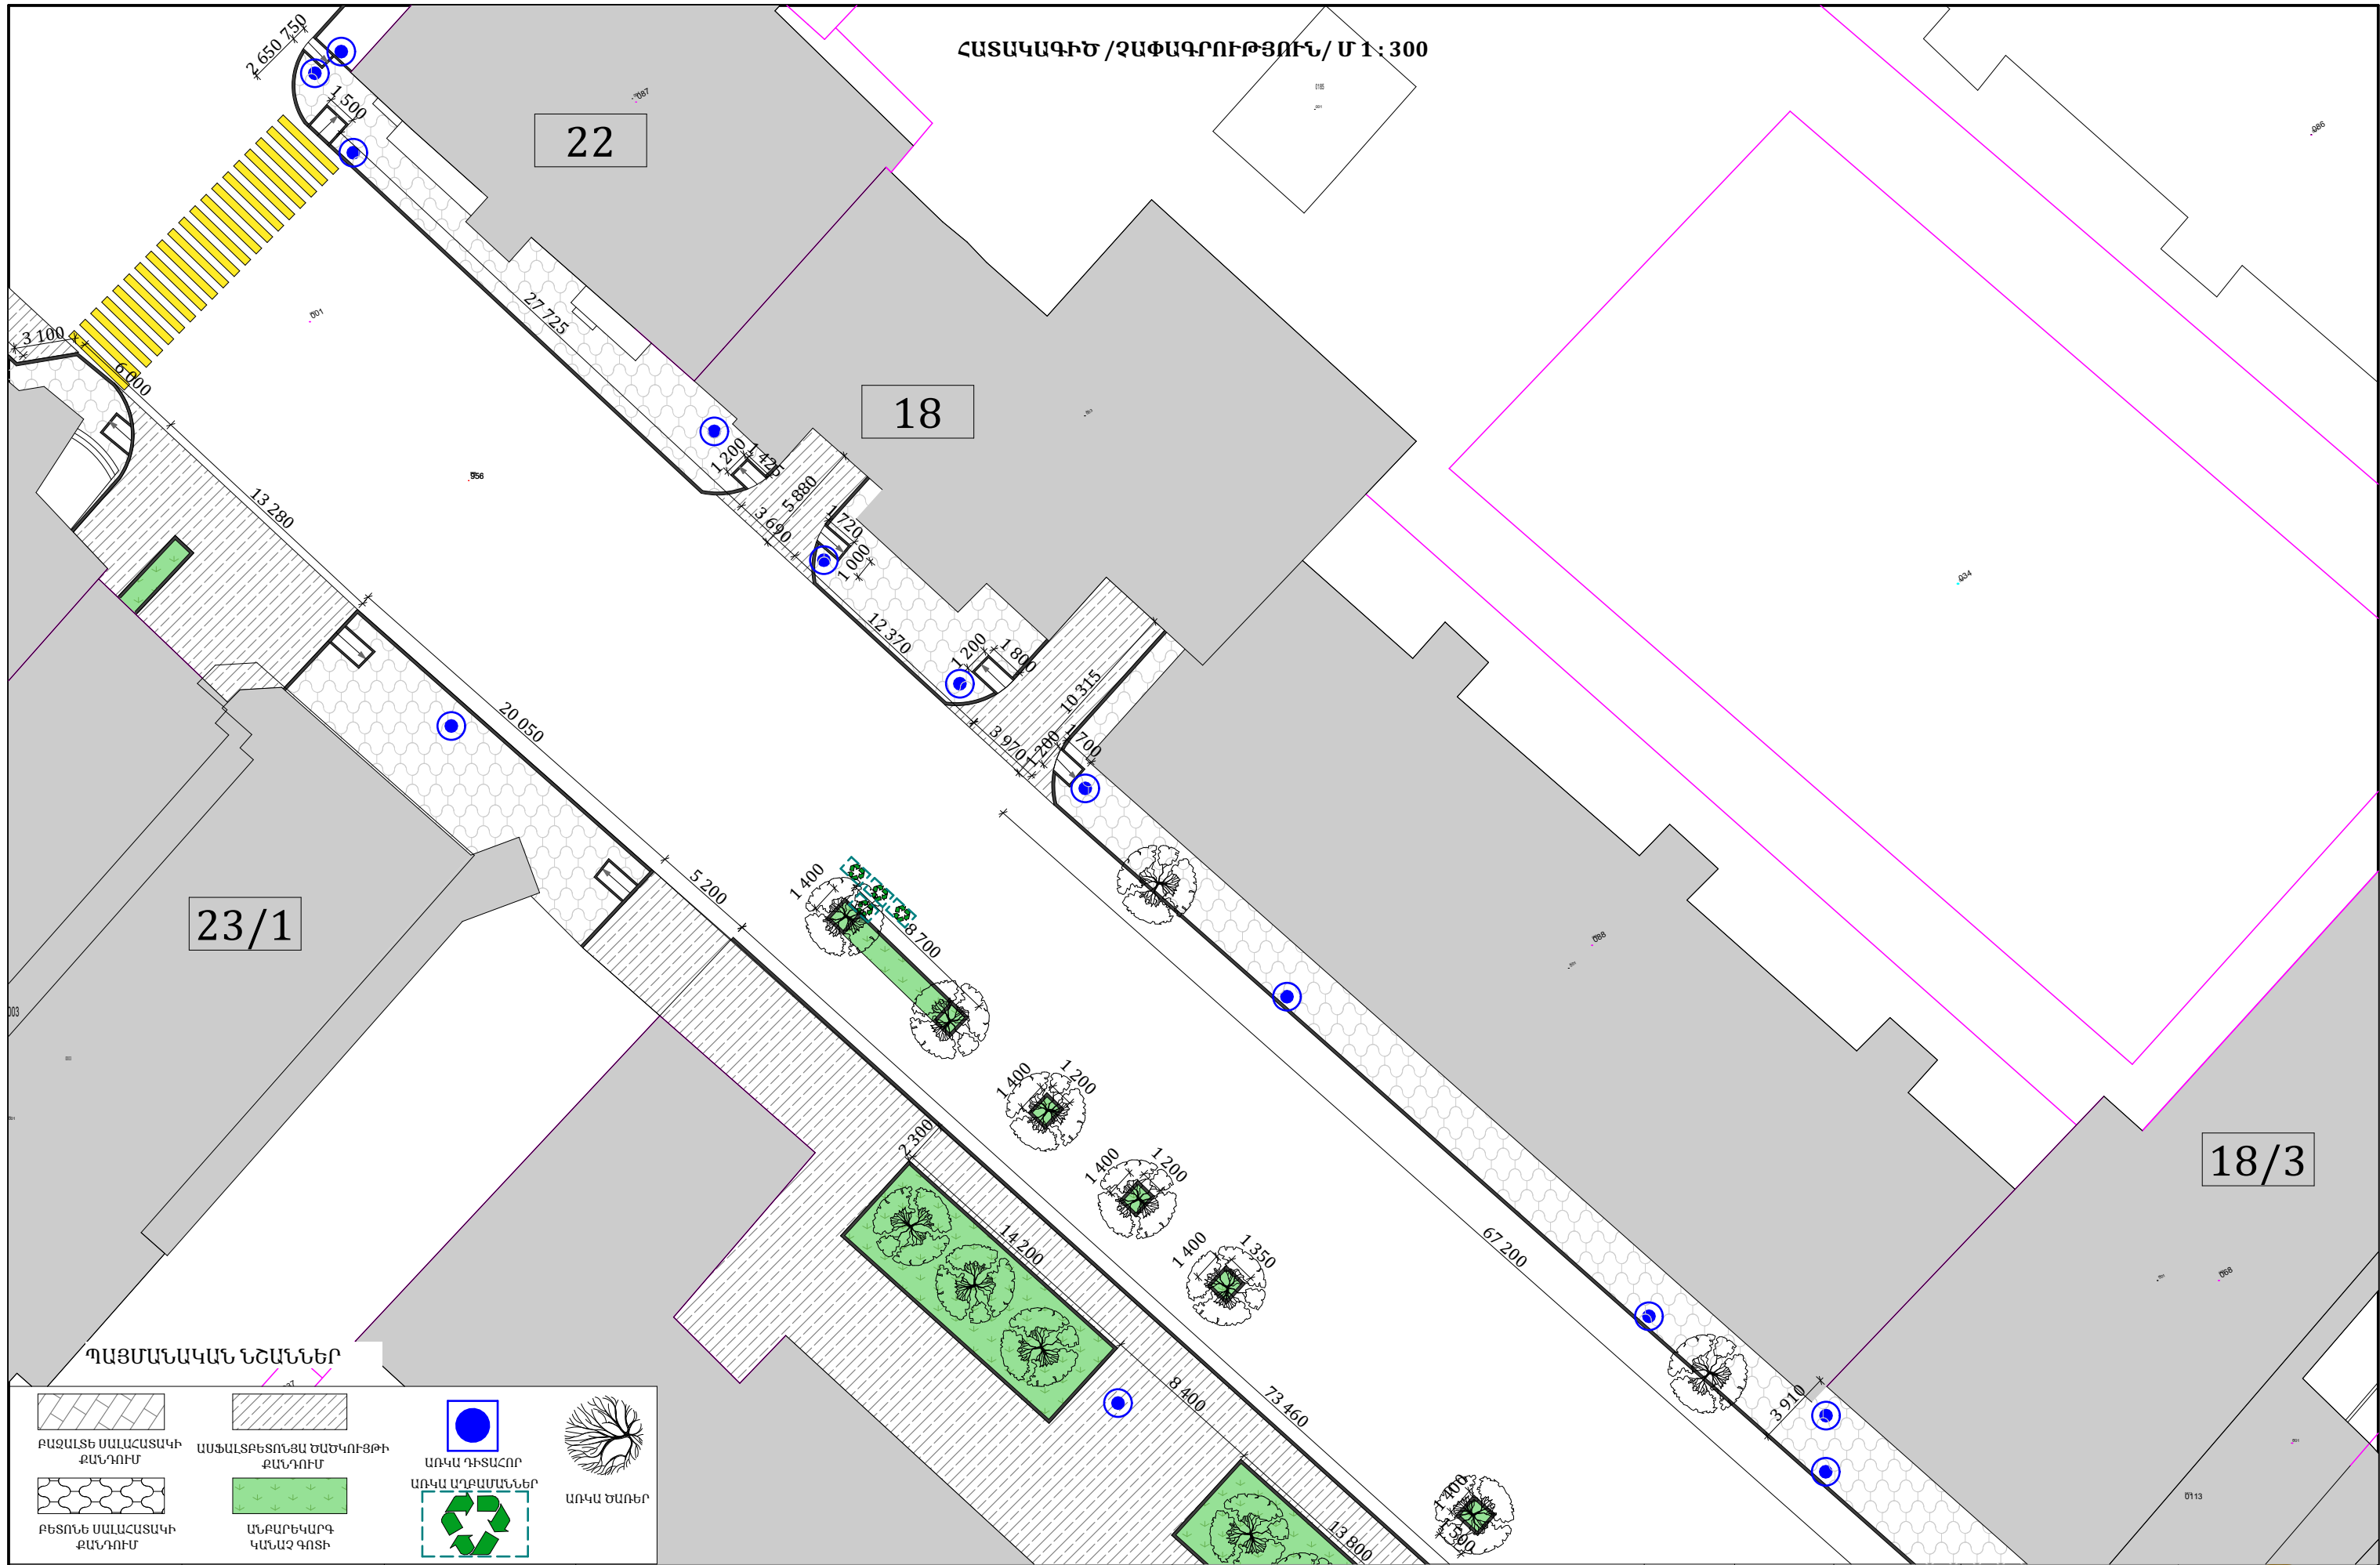

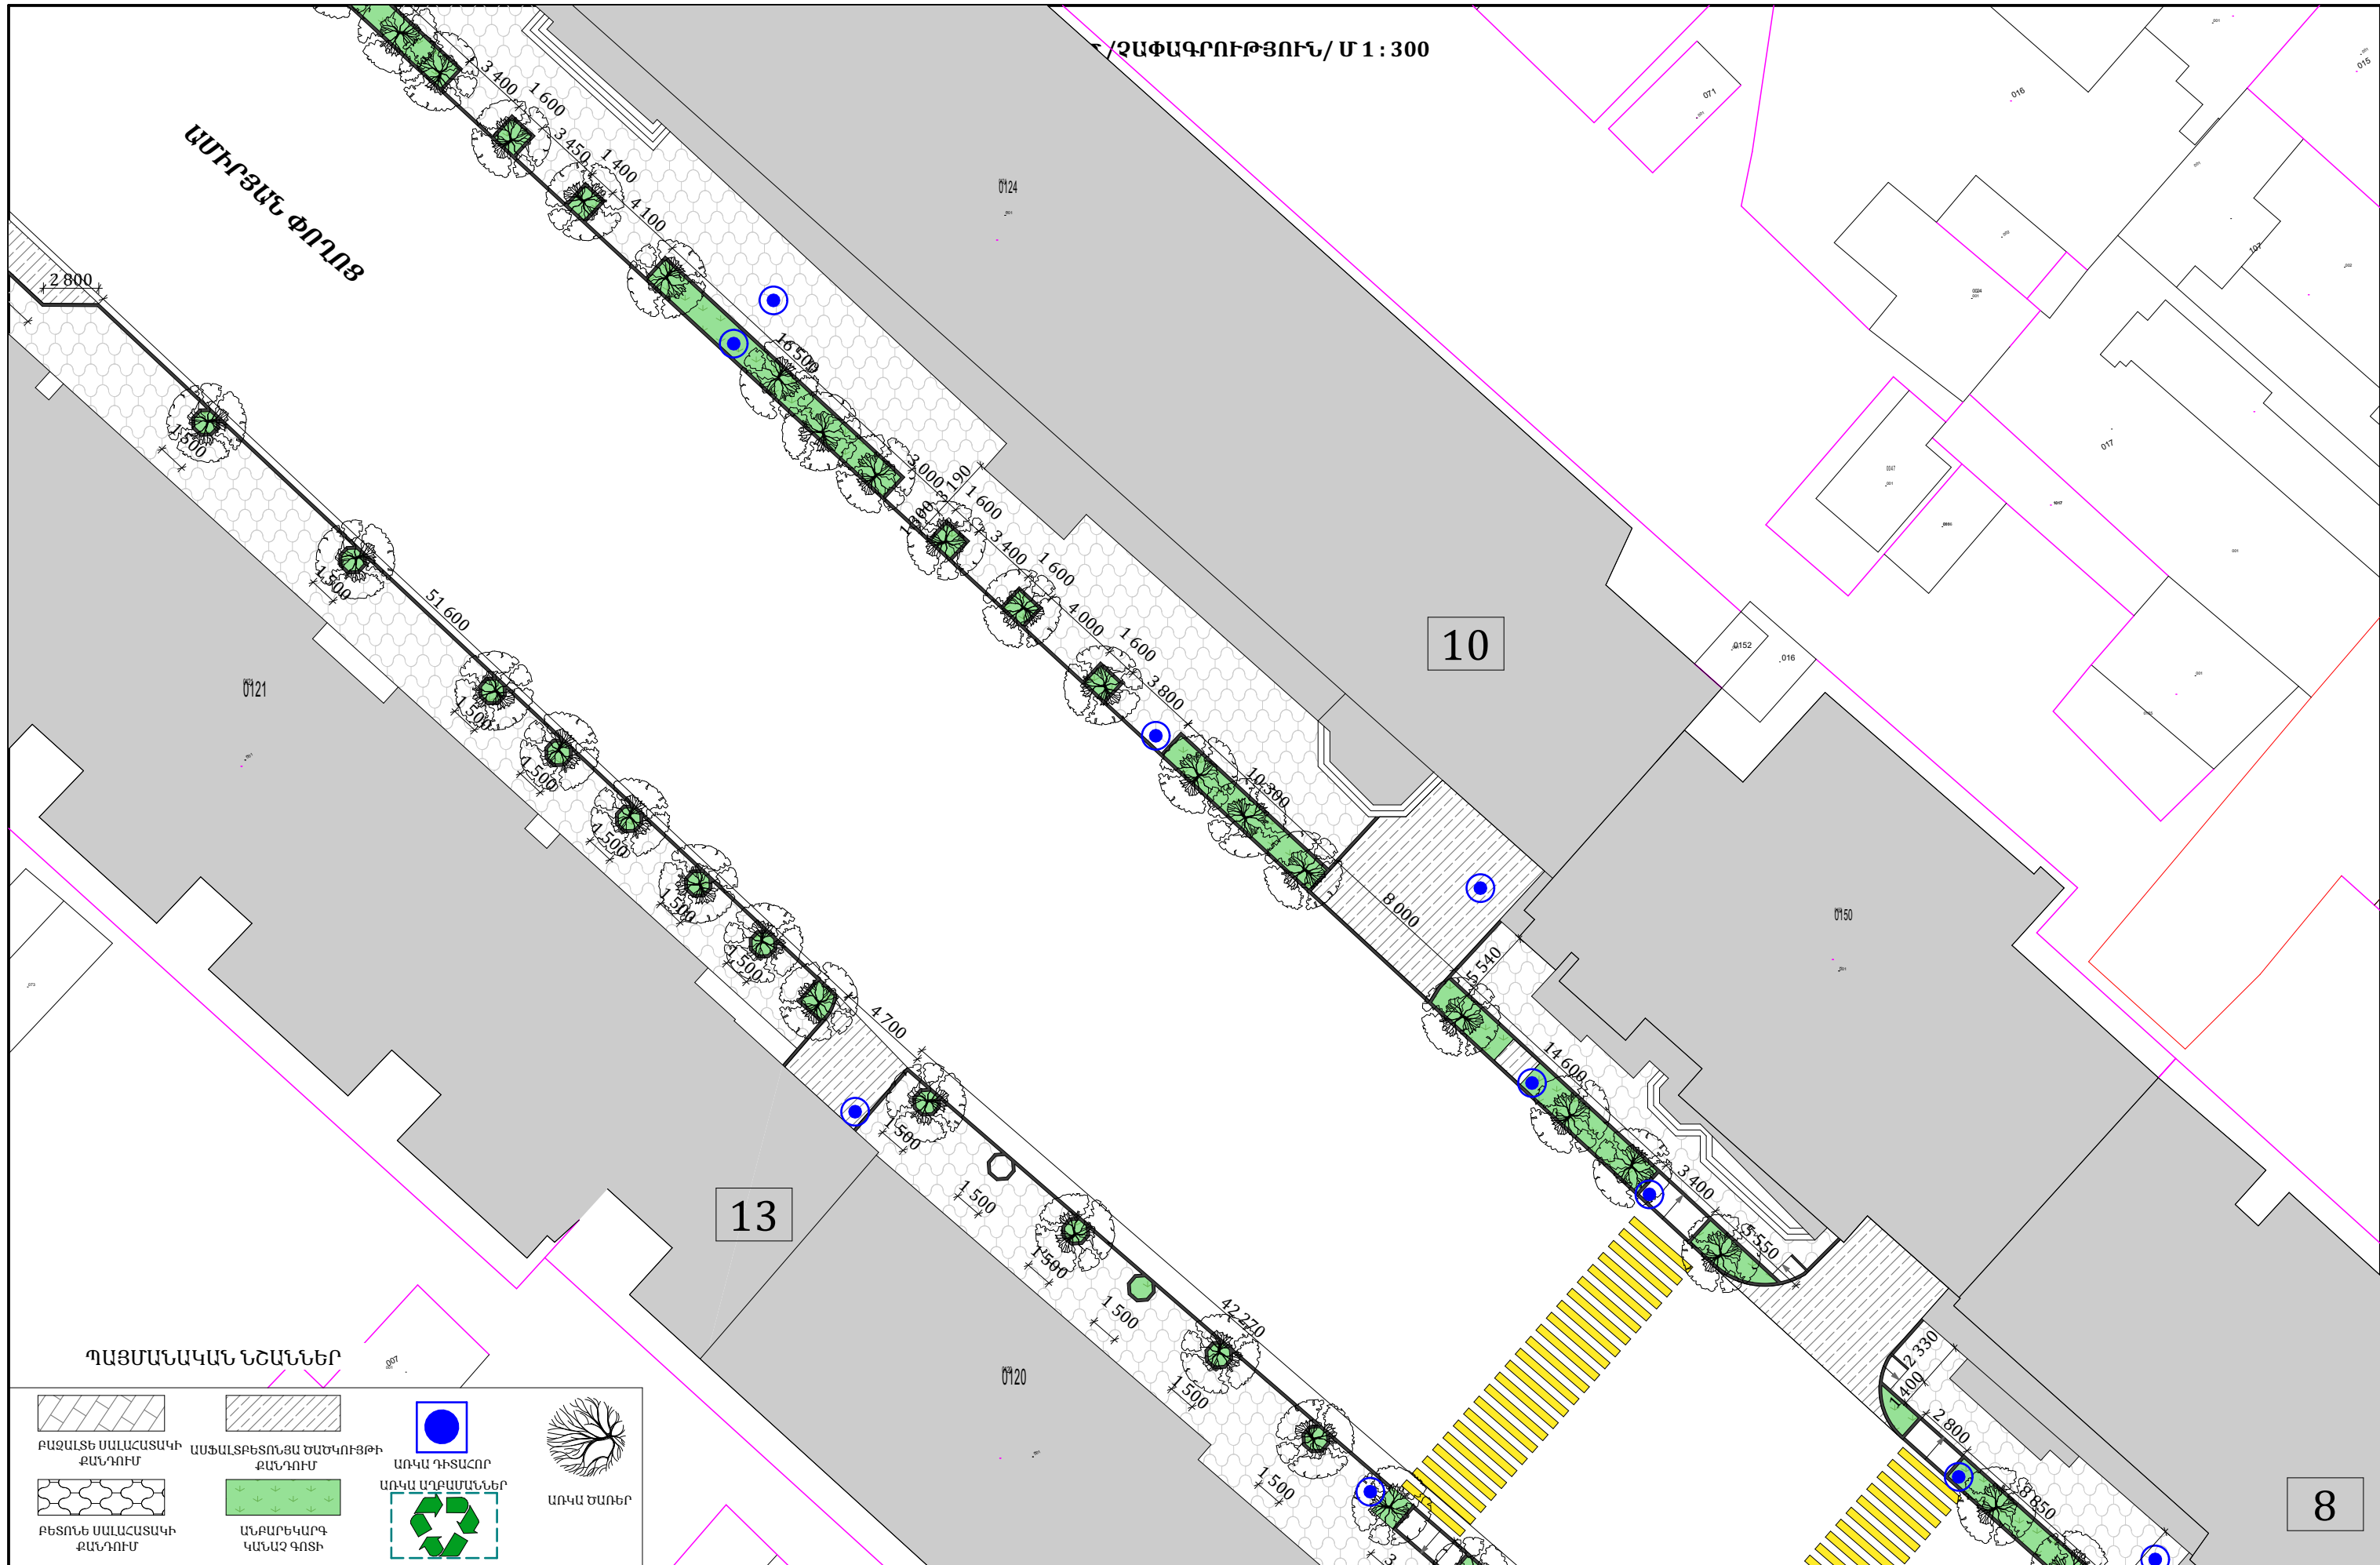

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	53	77	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								



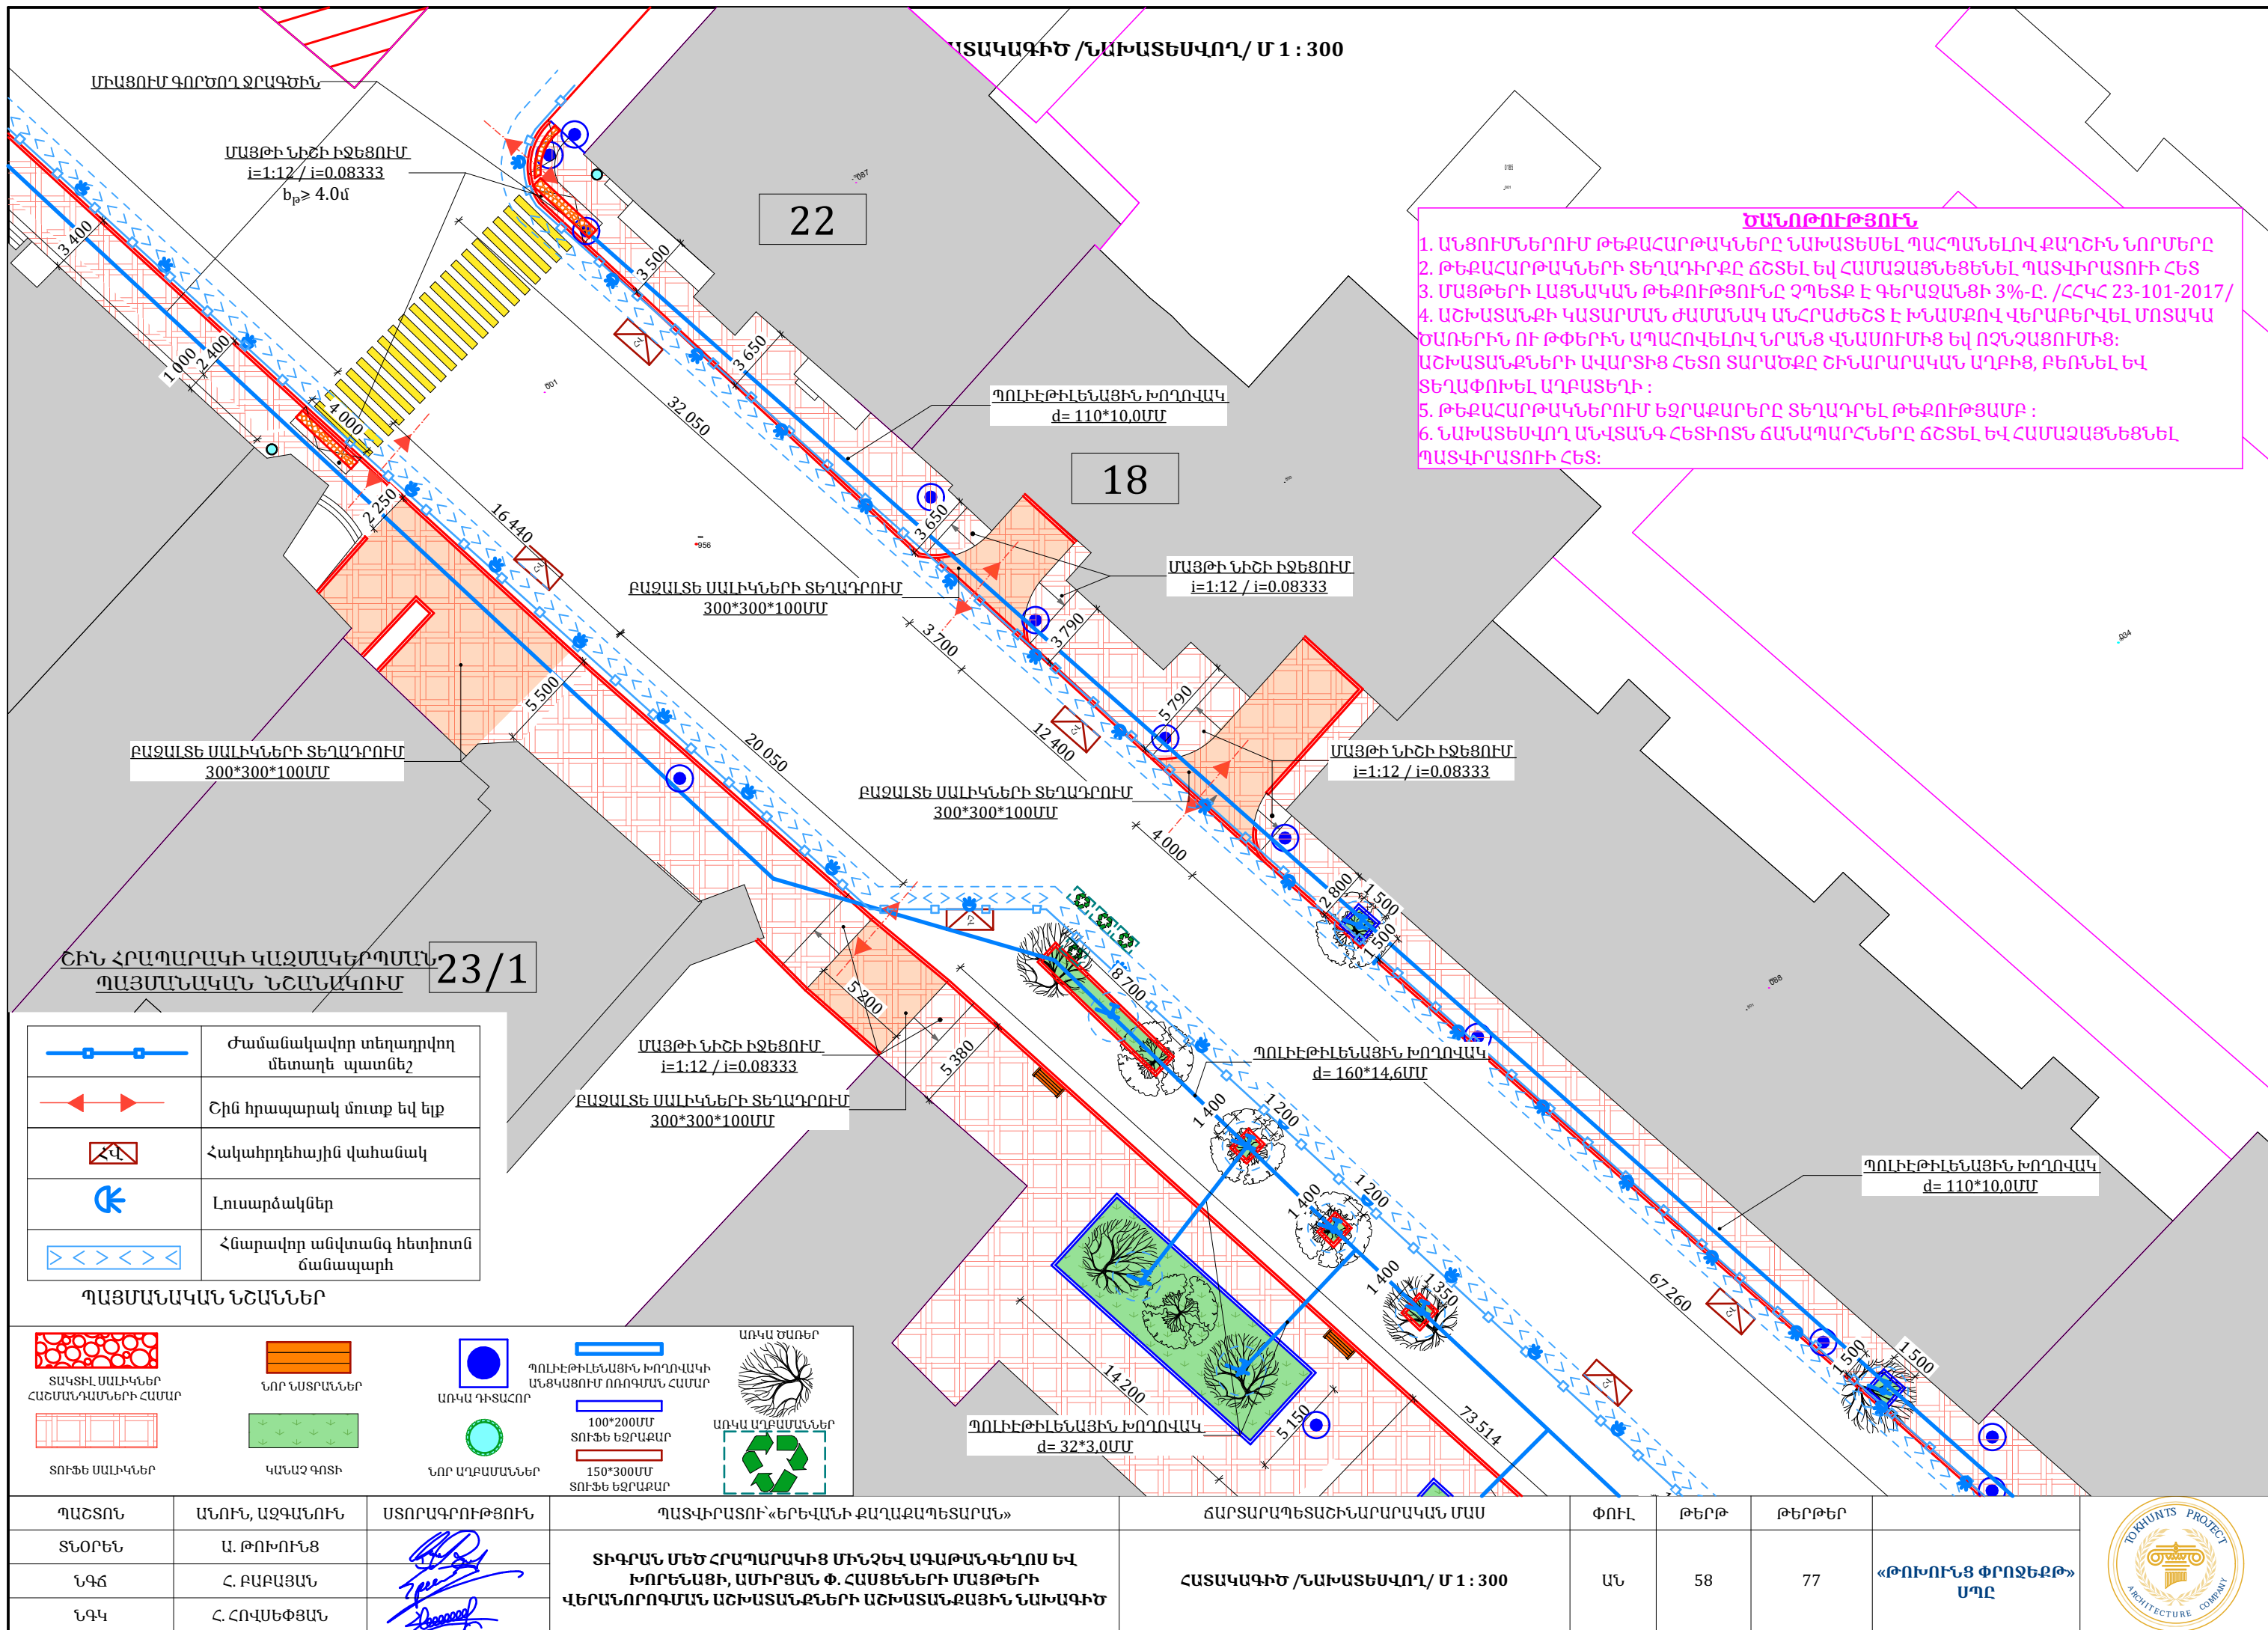

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
- ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 - ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՔԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 - ՄԱՑԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը, /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ՕՍՈՒՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԻՑ:
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱԳՈՒՆԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
 - ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՐ Է:
 - ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:


	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատնեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետխոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ՏԱԿՏԻ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
	ՆՈՐ ՆՍՏՐԱՆՆԵՐ
	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ
	ՊՈԼԻԵԹԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	ՏՈՒՖՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ
	ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ
	ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ
	ԱՌԿԱ ՄԱՐԲԱՄԱՆՆԵՐ
	100*200ՄՄ ՏՈՒՖՆ ԵԶՐԱՔԱՐ
	150*300ՄՄ ՏՈՒՖՆ ԵԶՐԱՔԱՐ
	ԱՌԿԱ ԽԱՌՆԵՐ
	ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆՔԻ ԶԱՂԱՔԱՐԿՆԵՐԸ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՑԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՑԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻՏ	ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	58	77	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳՎ	Հ. ՀՈՎԱՏԵՓՅԱՆ								



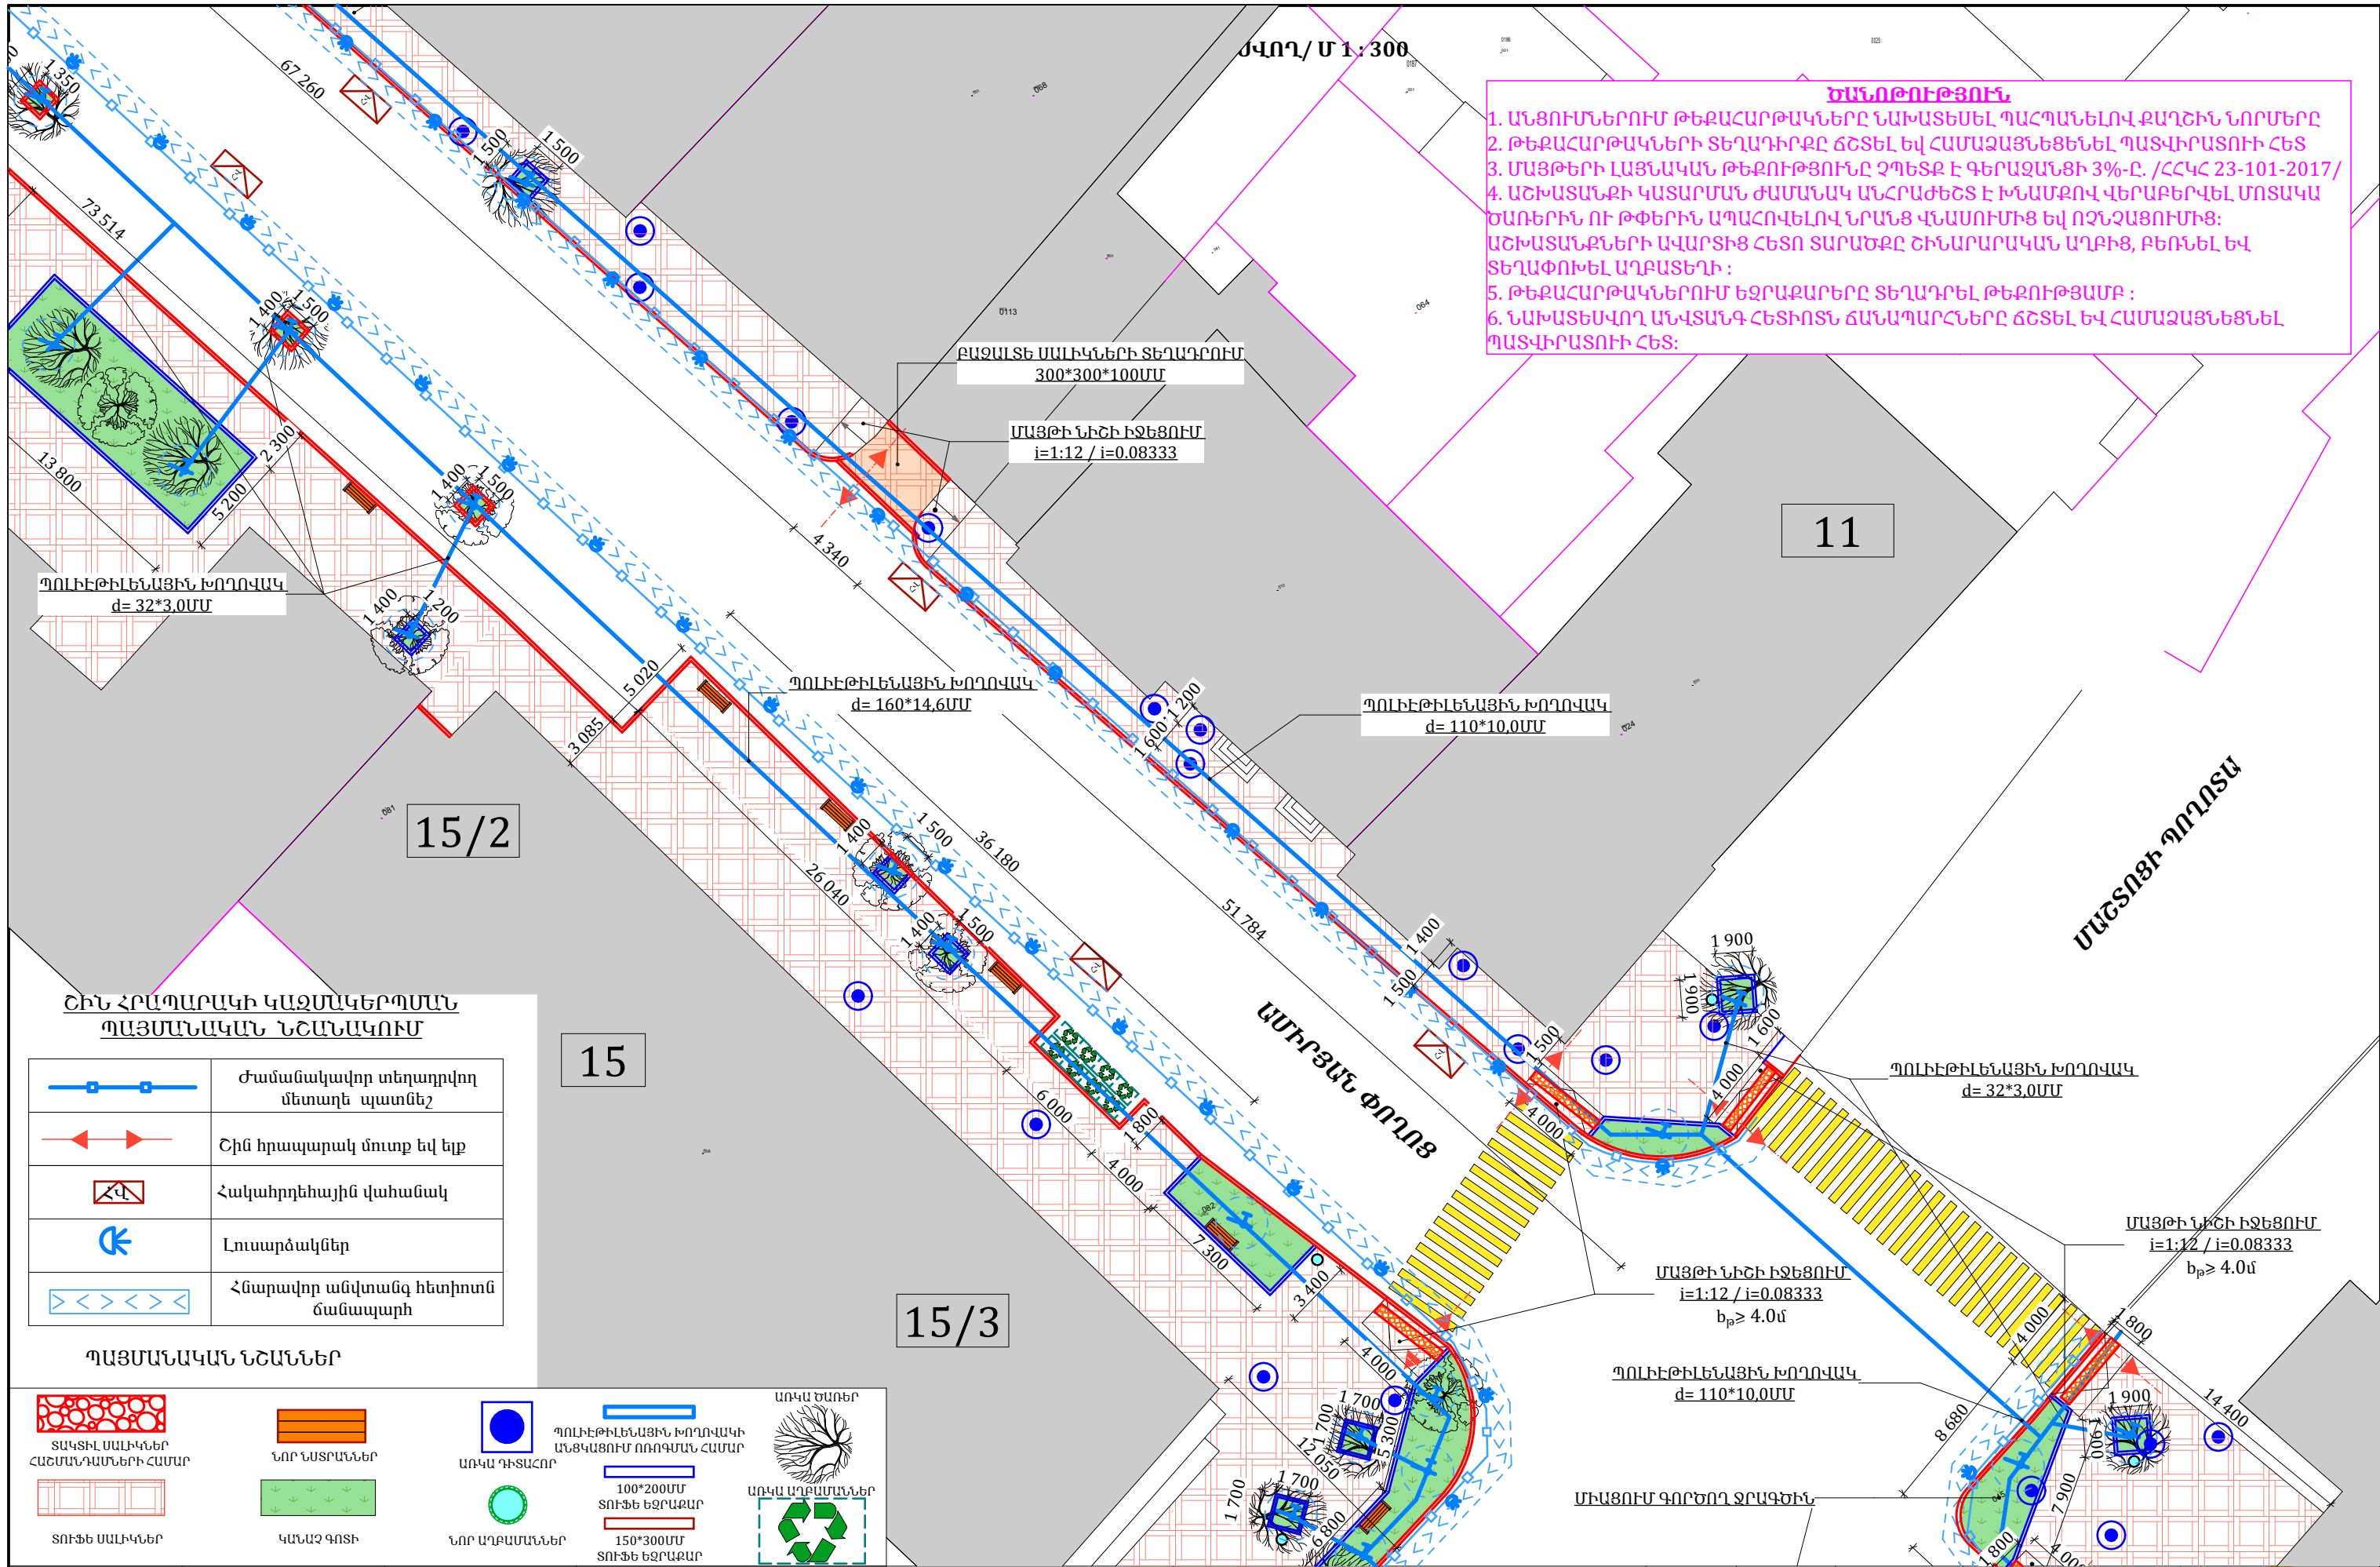


- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
- ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԵՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 - ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 - ՄԱՑԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ՕՍՈՒՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԻՑ:
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
 - ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետխոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
	ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ
	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ
	ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ
	ՏՈՒՖՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ
	ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ
	ՊՈԼԻԵԹԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	100*200ՄՄ ՏՈՒՖՆ ԵԶՐԱՔԱՐ
	150*300ՄՄ ՏՈՒՖՆ ԵԶՐԱՔԱՐ
	ԱՌԿԱ ՍԱԼԻԿՆԵՐ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՑԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՑԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՑԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	59	77		
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՏԹՅԱՆ								

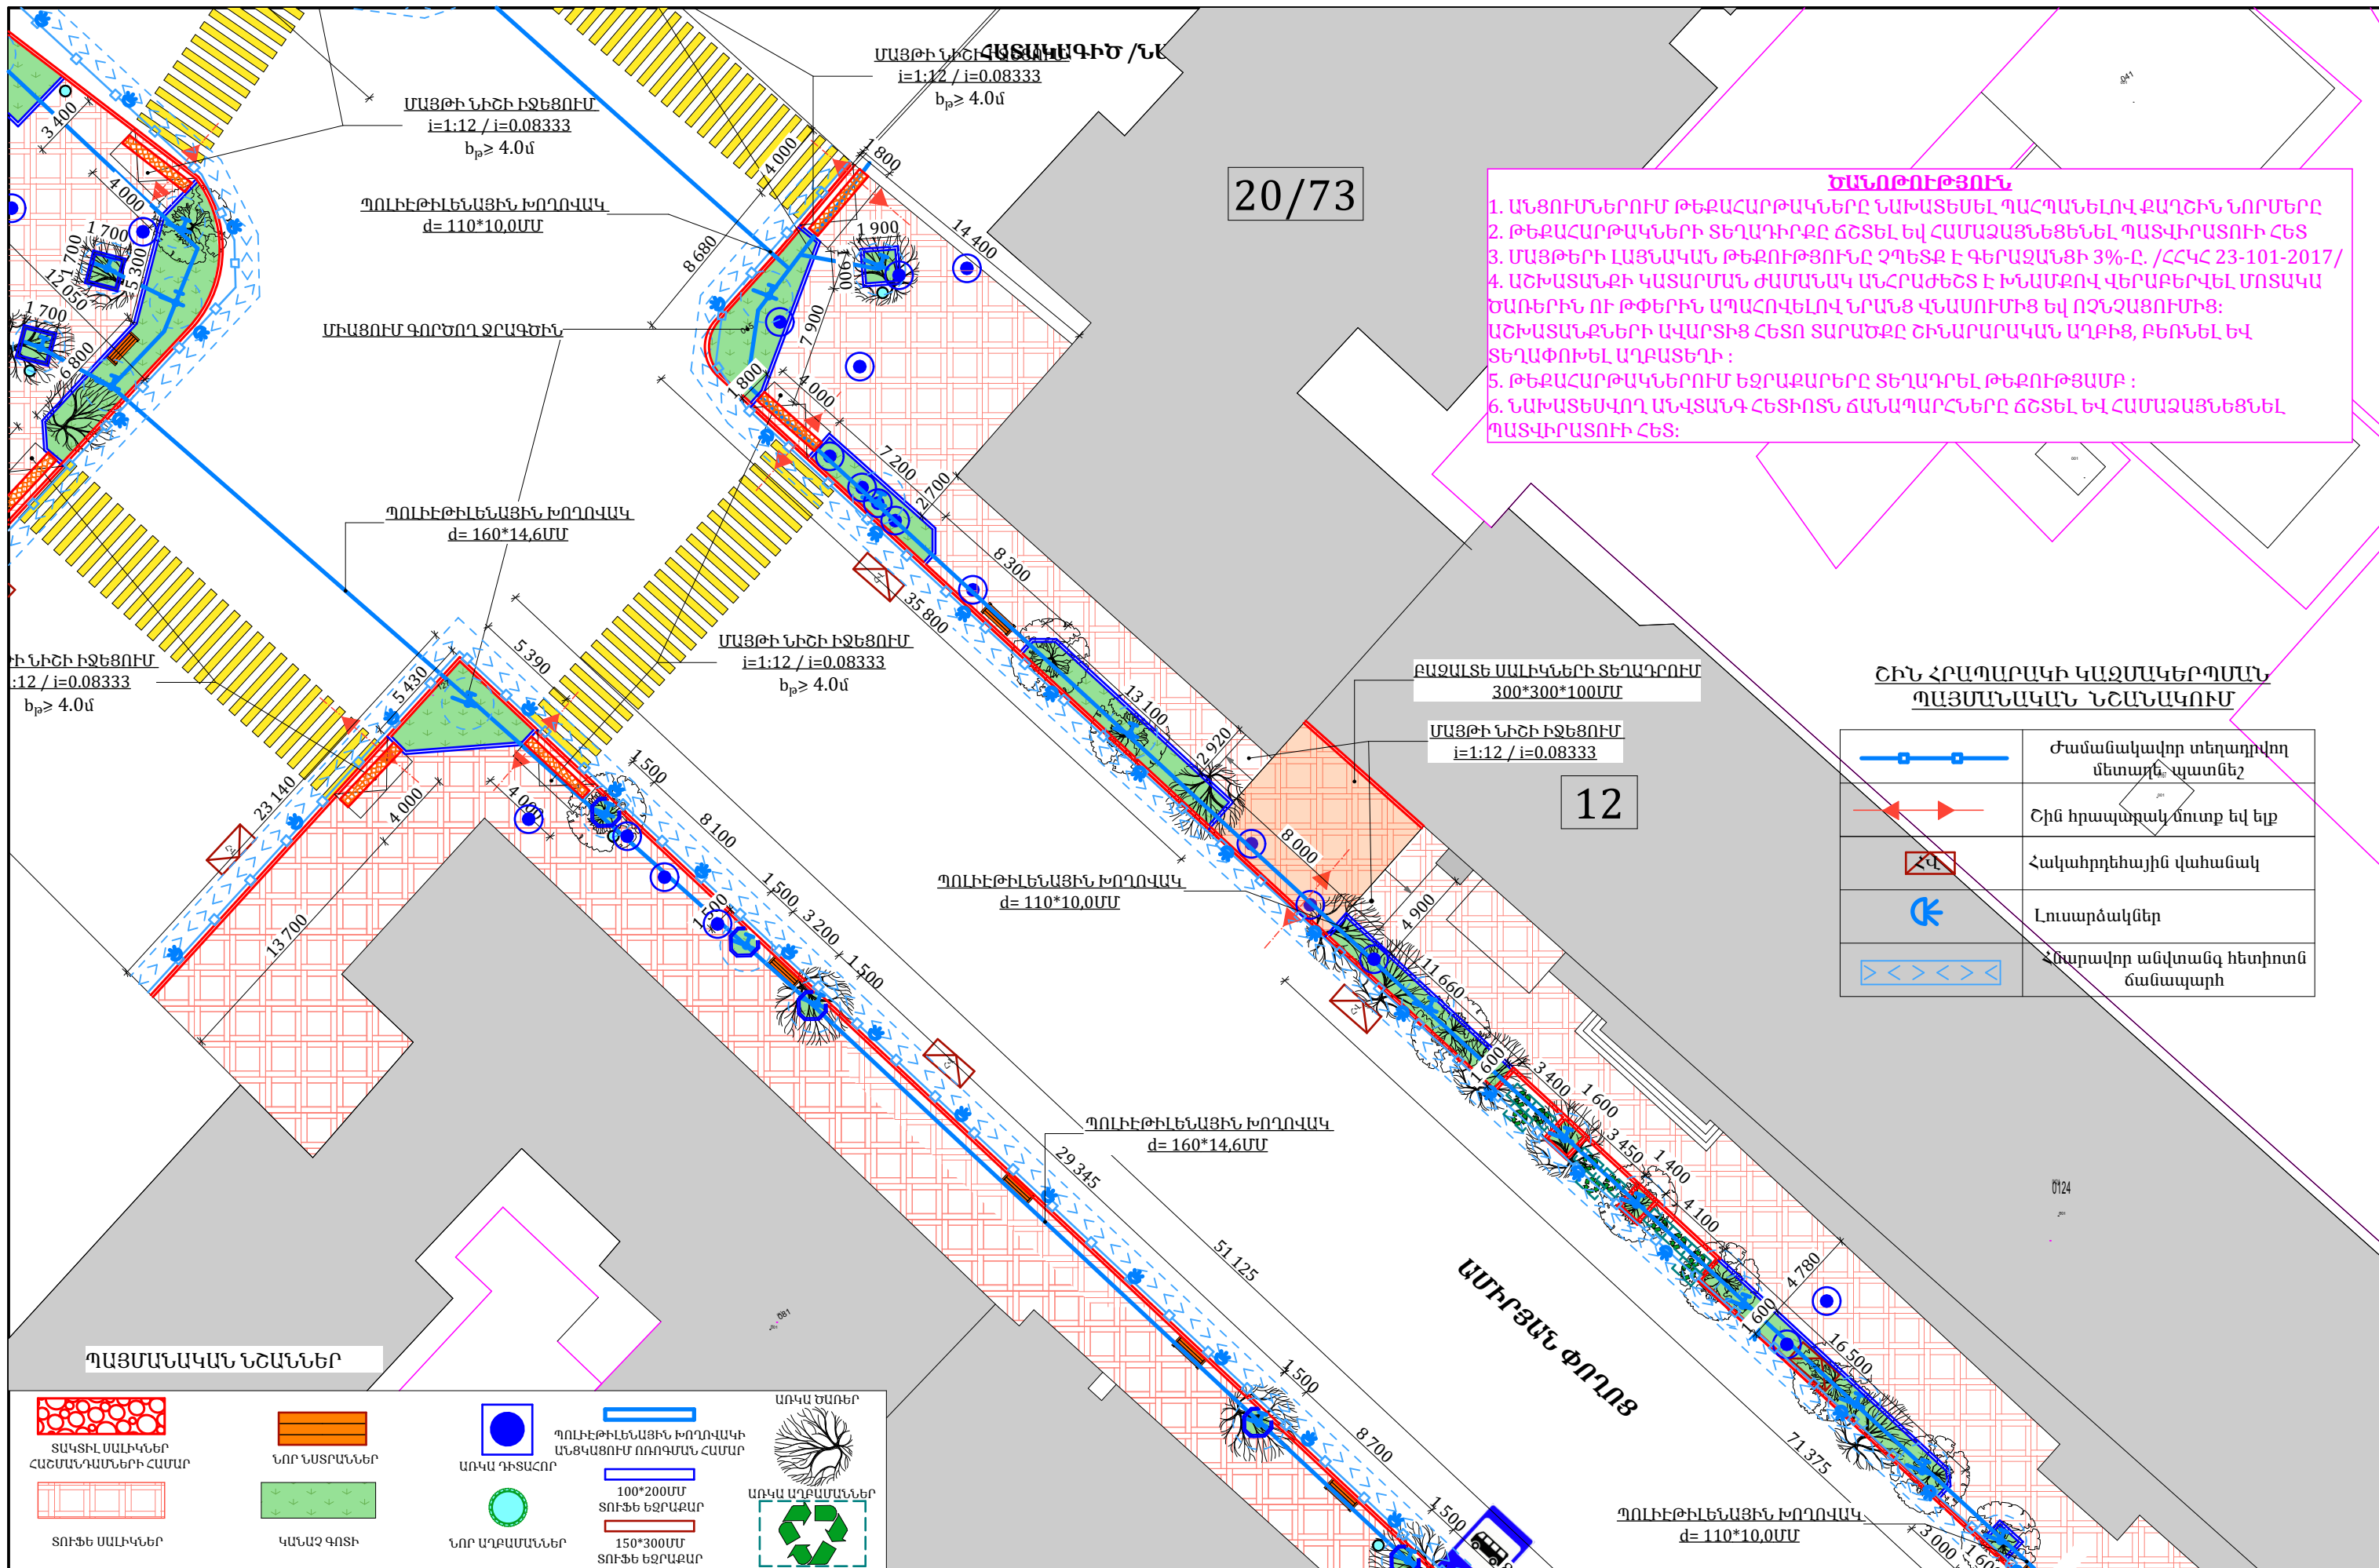


- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 2. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐԸ ԸՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 3. ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը, /ՀՀԿ Հ 23-101-2017/
 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱ ԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՁԱՑՈՒՄԻՑ:
 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱԳՈՒՆԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
 6. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱԶԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴԻՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ:
 7. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ԸՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	
	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատկեր
	Շին հրապարակ մուտք ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ	ՊԼԻԲԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑՎԱՑՈՒՄ ՈՌՈՂՈՒՄՆԵՐ ՀԱՄԱՐ
ՏՈՒՖՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ	ՆՈՐ ԱՂԲԱՏԱՆՆԵՐ	100*200ՄՄ ՏՈՒՖՆ ԵԶՐԱԶԱՐ
			150*300ՄՄ ՏՈՒՖՆ ԵԶՐԱԶԱՐ
			ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՏԱՆՆԵՐ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻՏ	ՀԱՏԱԿԱԳԻՏ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	60	77		
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՆԹՅԱՆ								

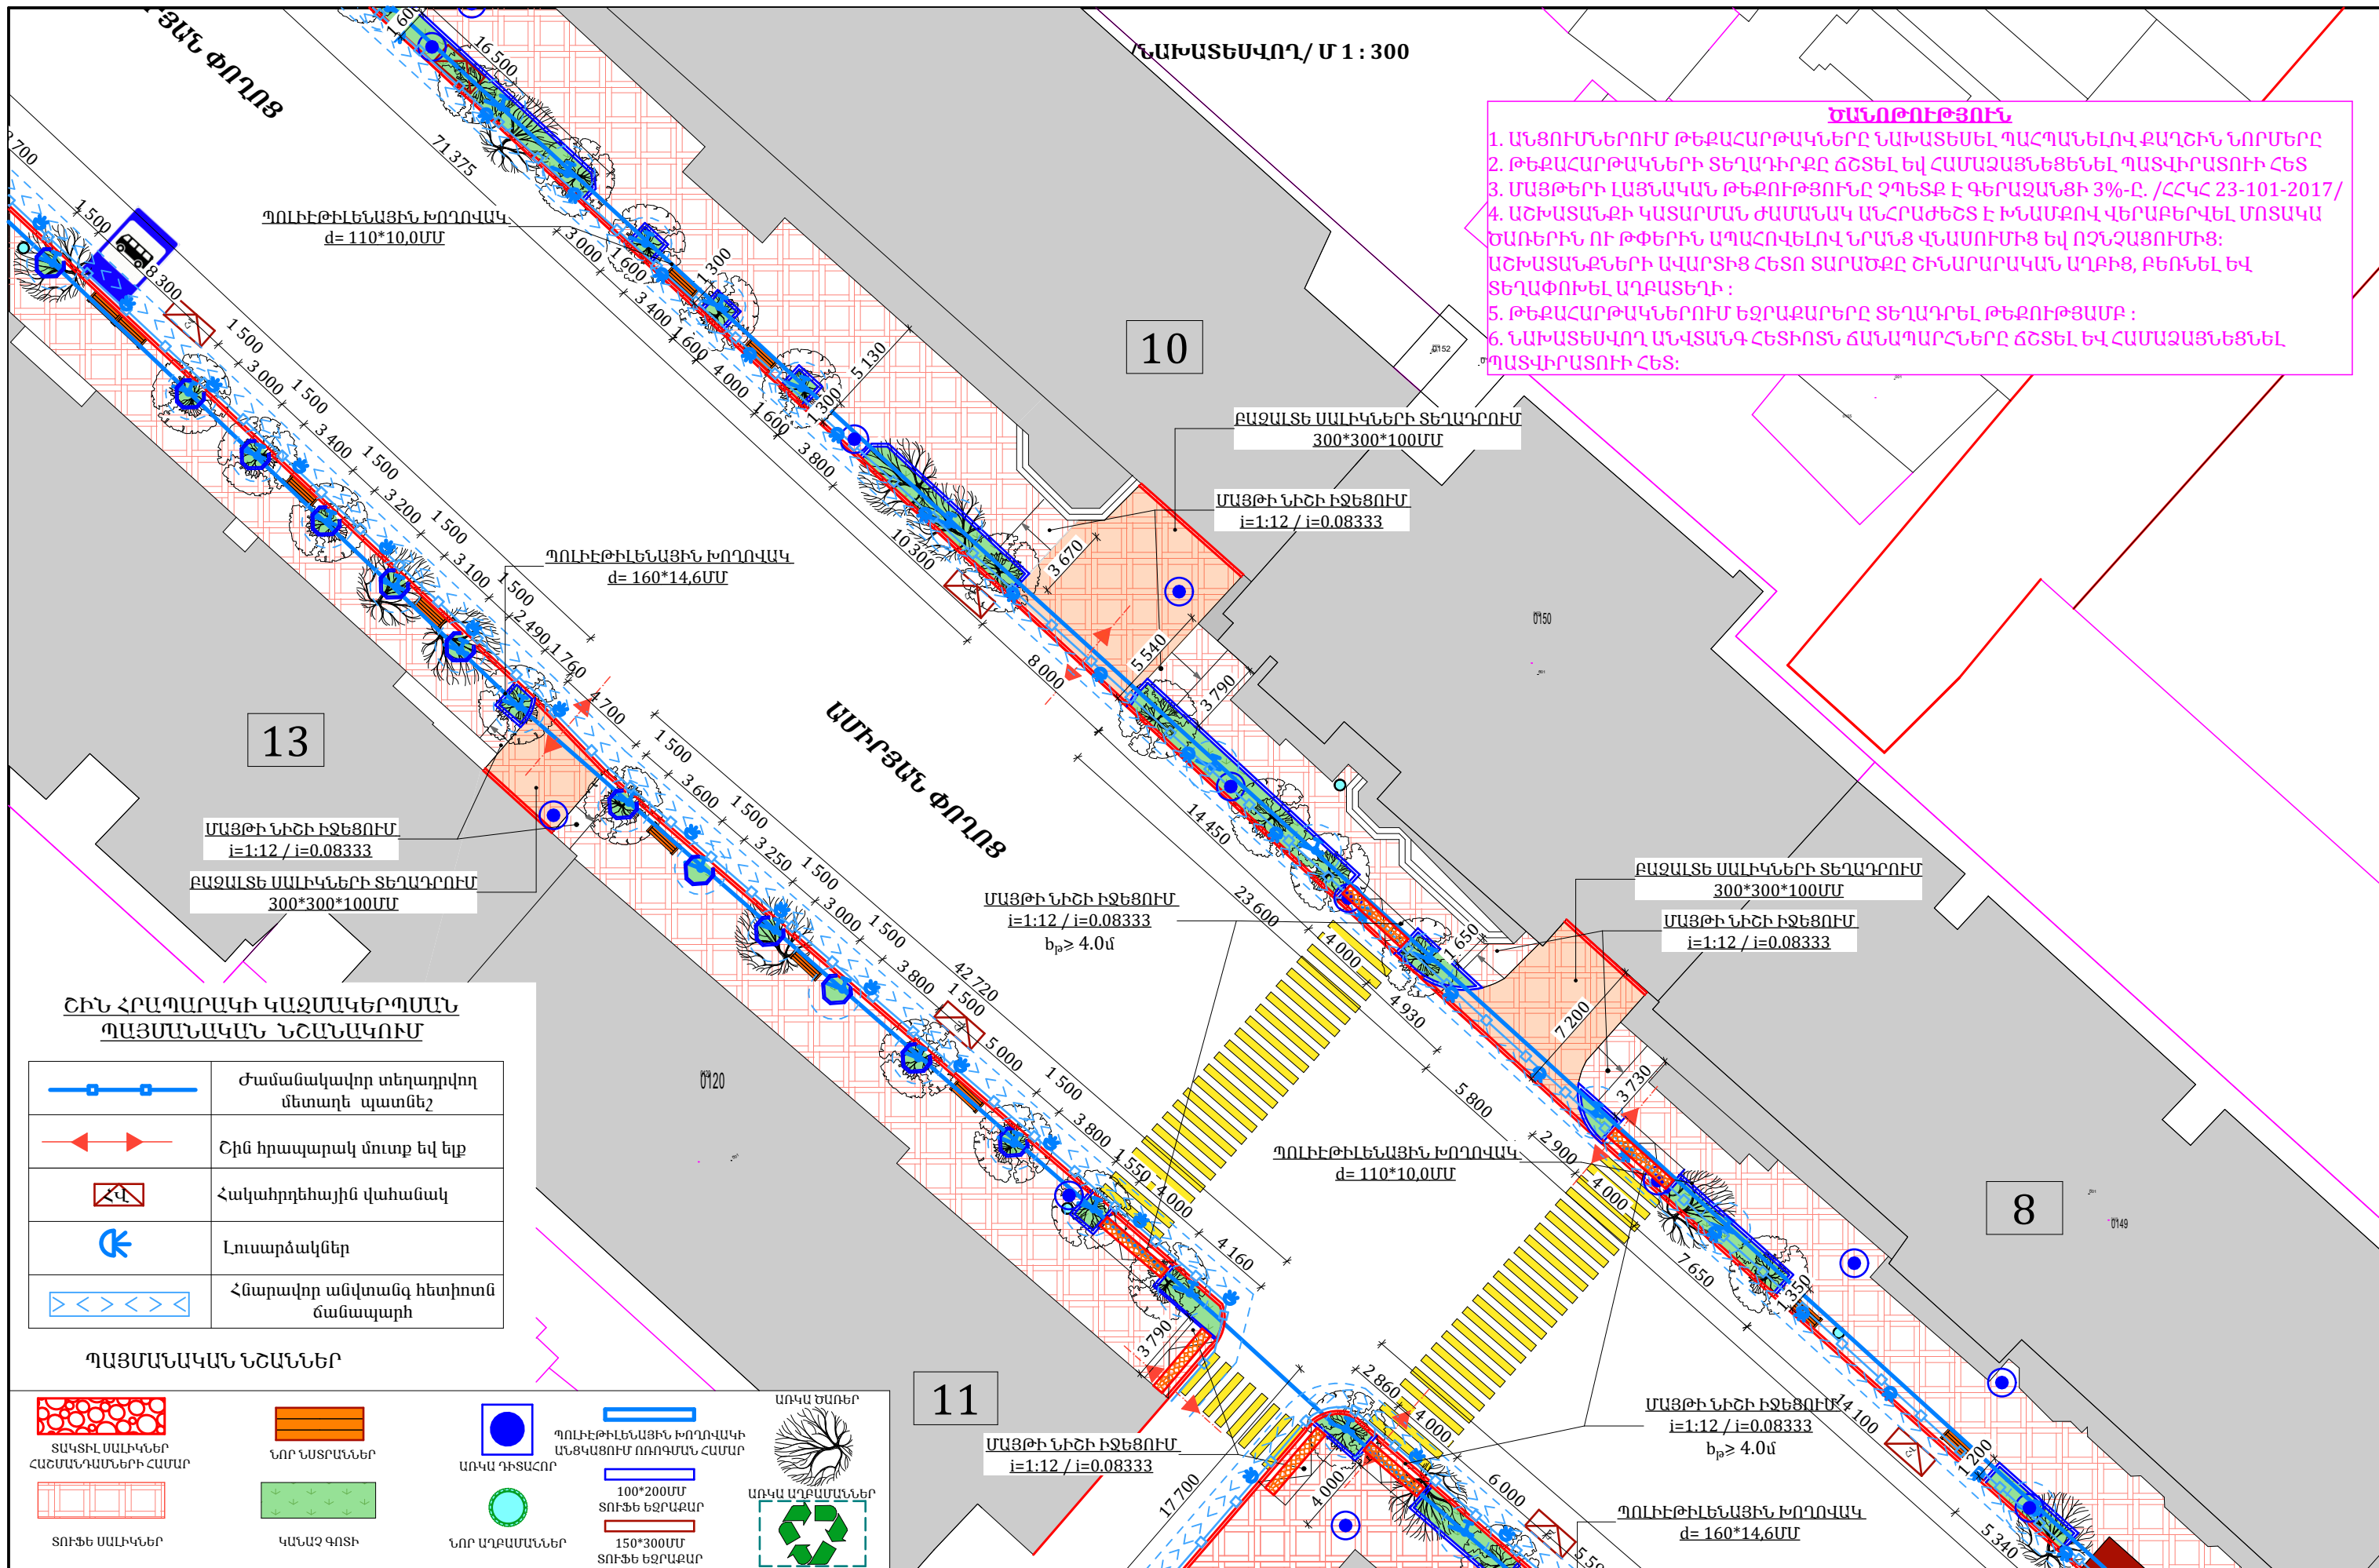

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
- ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 - ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐԸ ԴՆՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 - ՄԱՑԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏԸ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը, /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱԾԱՌԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՁԱՑՈՒՄԻՑ: ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
 - ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱԶԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴԻՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՐԸ:
 - ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ԴԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ԴՆՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:


ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետխոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆՈՒՄԻ ՀԱՄԱՐ
	ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ
	ՍՈՒՖԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ
	ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻ
	ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ
	ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՒՌՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ
	ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ
	100*200ՄՄ ՏՈՒՖԵ ԵԶՐԱԶԱՐ
	150*300ՄՄ ՏՈՒՖԵ ԵԶՐԱԶԱՐ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ԴԱՏԱԿԱԿԻԹ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ/ Մ 1 : 300	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	«ԹՈՒՌՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՆԻՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՑԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԿԻԹ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	61	77		
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳՎ	Հ. ՀՈՎԱՏԵՓՅԱՆ								

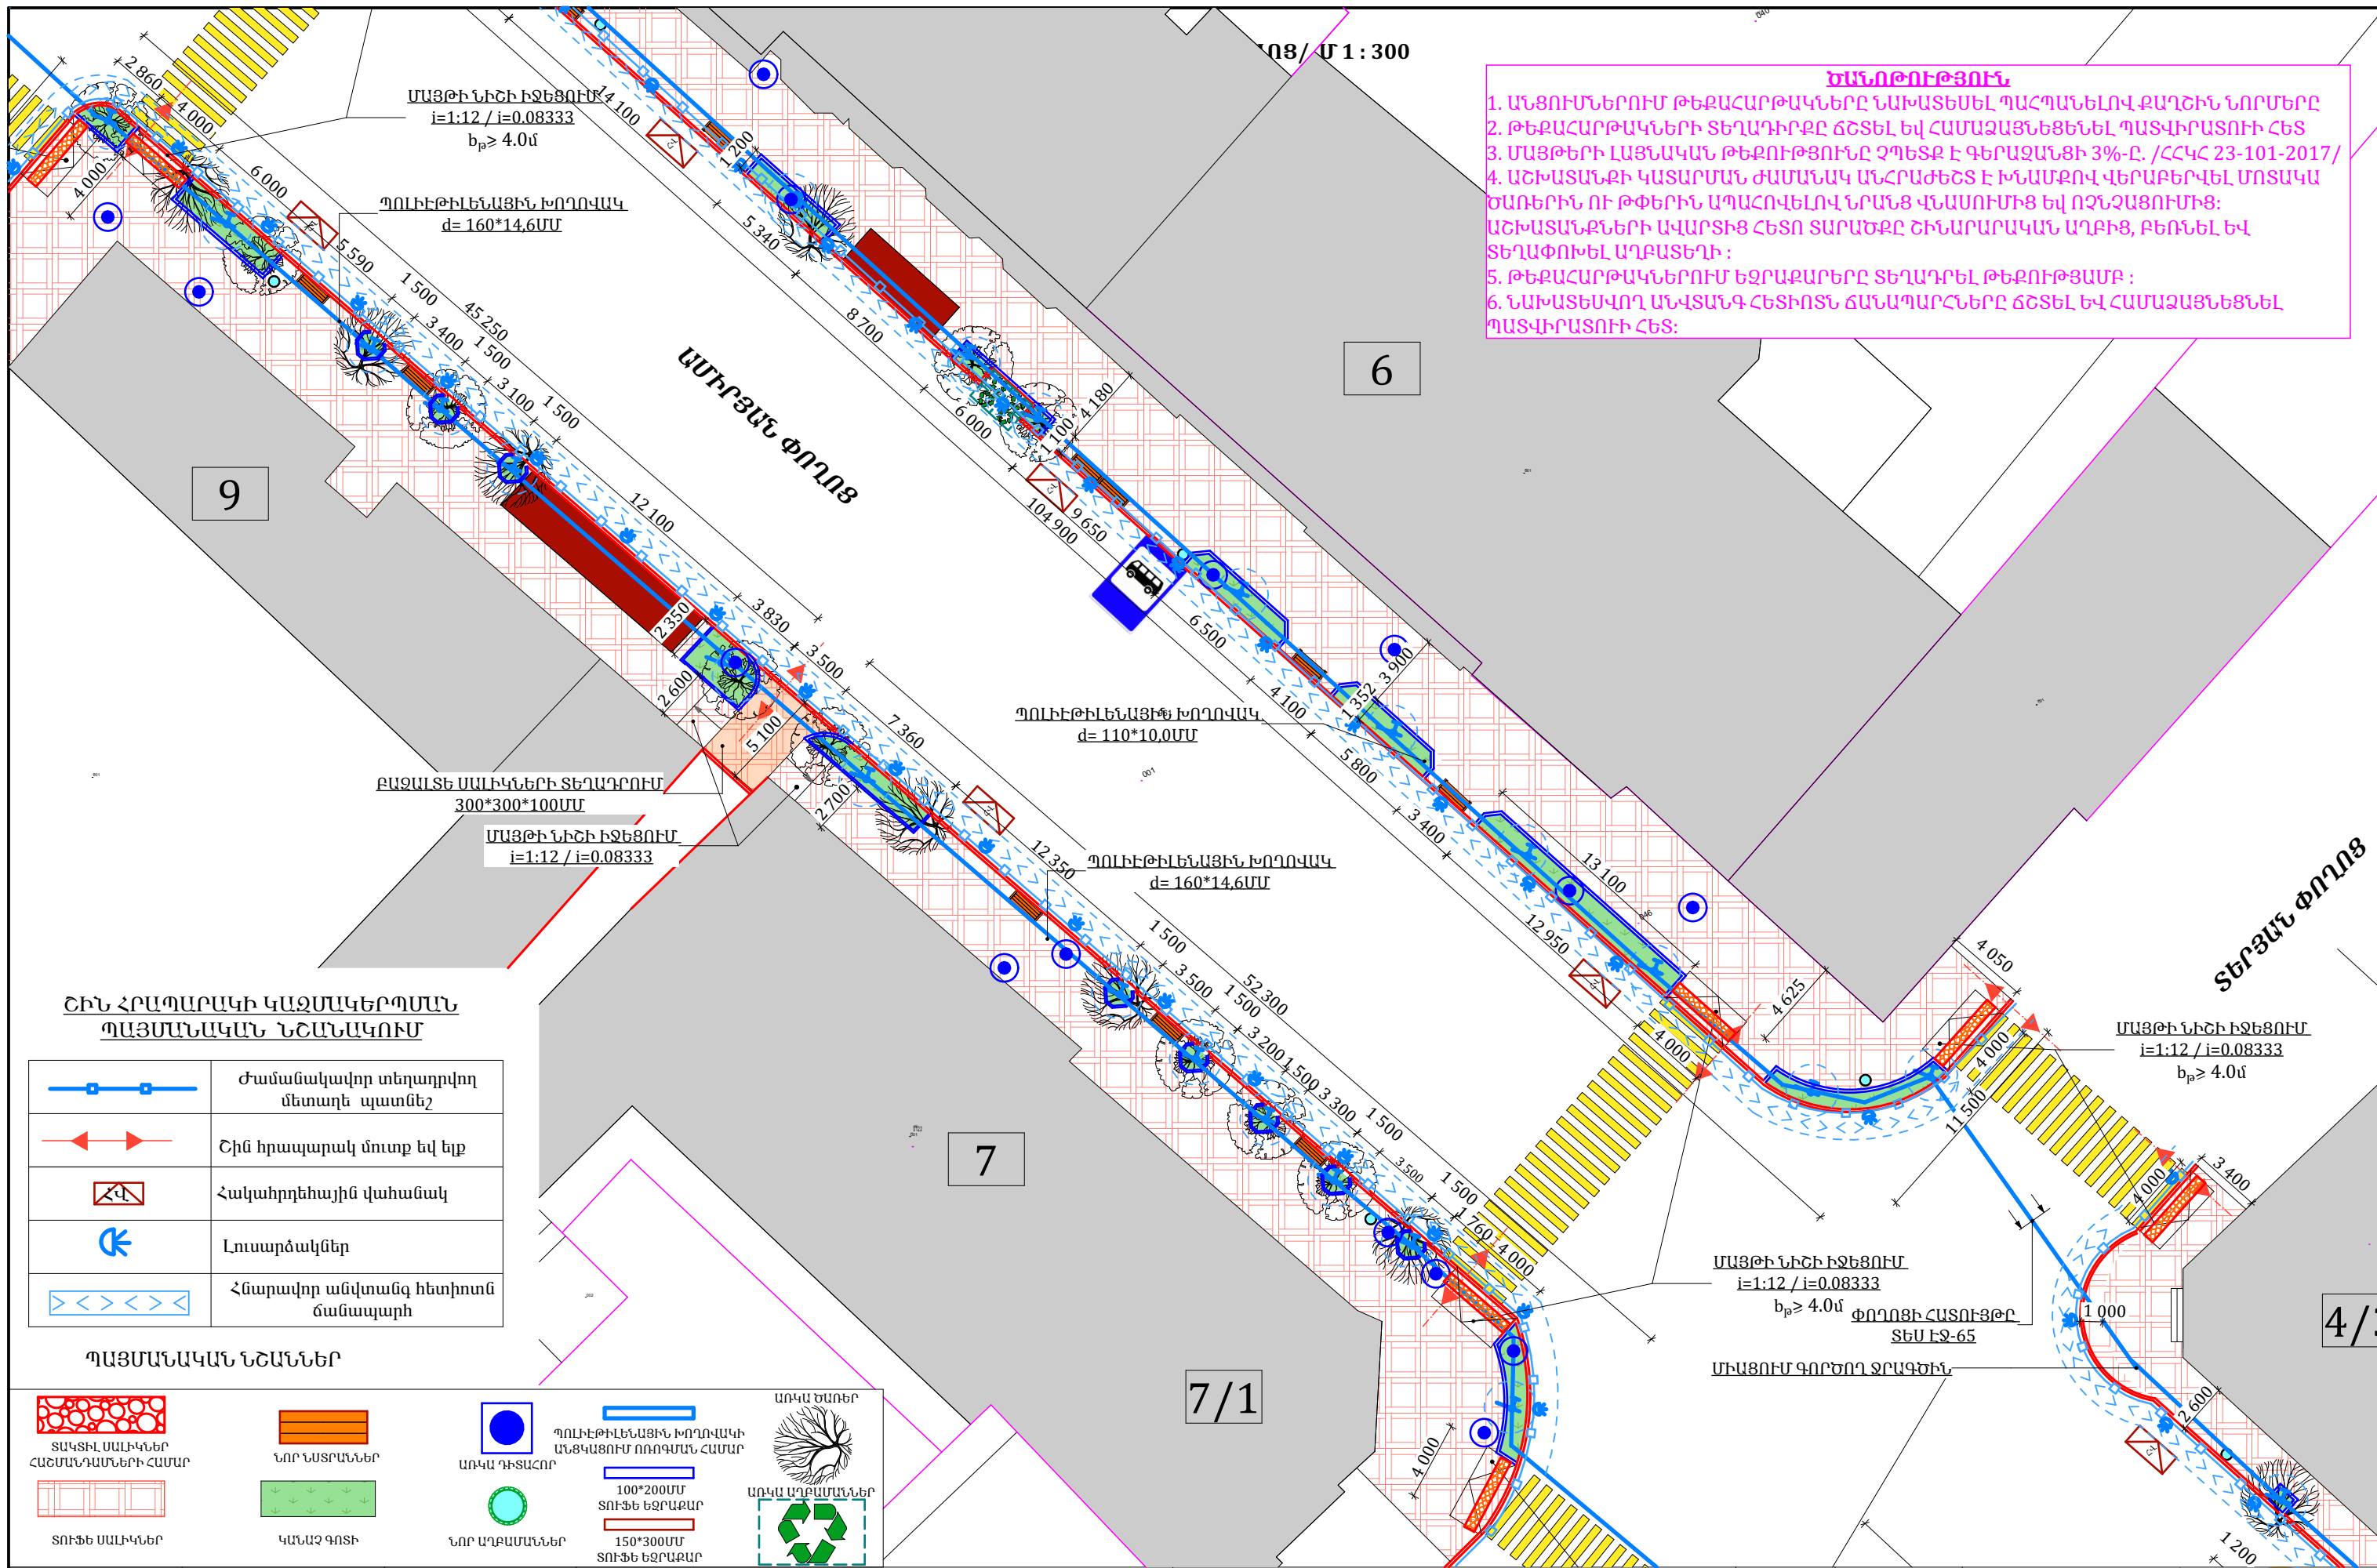

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
1. ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 2. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ԸՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 3. ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏԸ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱԾԱՆԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎԵՐԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆԱՑՈՒՄԻՑ:
 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈՑ ՏԱՐԱԾՔԸ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱԾՈՒՆԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
 6. ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱԶԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ:
 7. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏՈՑՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ԸՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ


	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետխոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ՏԱԿՏԻ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆՎԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
	ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆԵՐ
	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ
	ՆՈՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ
	ՏՈՒՖԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ
	ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻ
	ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ
	100*200ՄՄ ՏՈՒՖԵ ԵԶՐԱԶԱՐ
	150*300ՄՄ ՏՈՒՖԵ ԵԶՐԱԶԱՐ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱԶԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՑ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	62	77	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՏԵՓՅԱՆ								



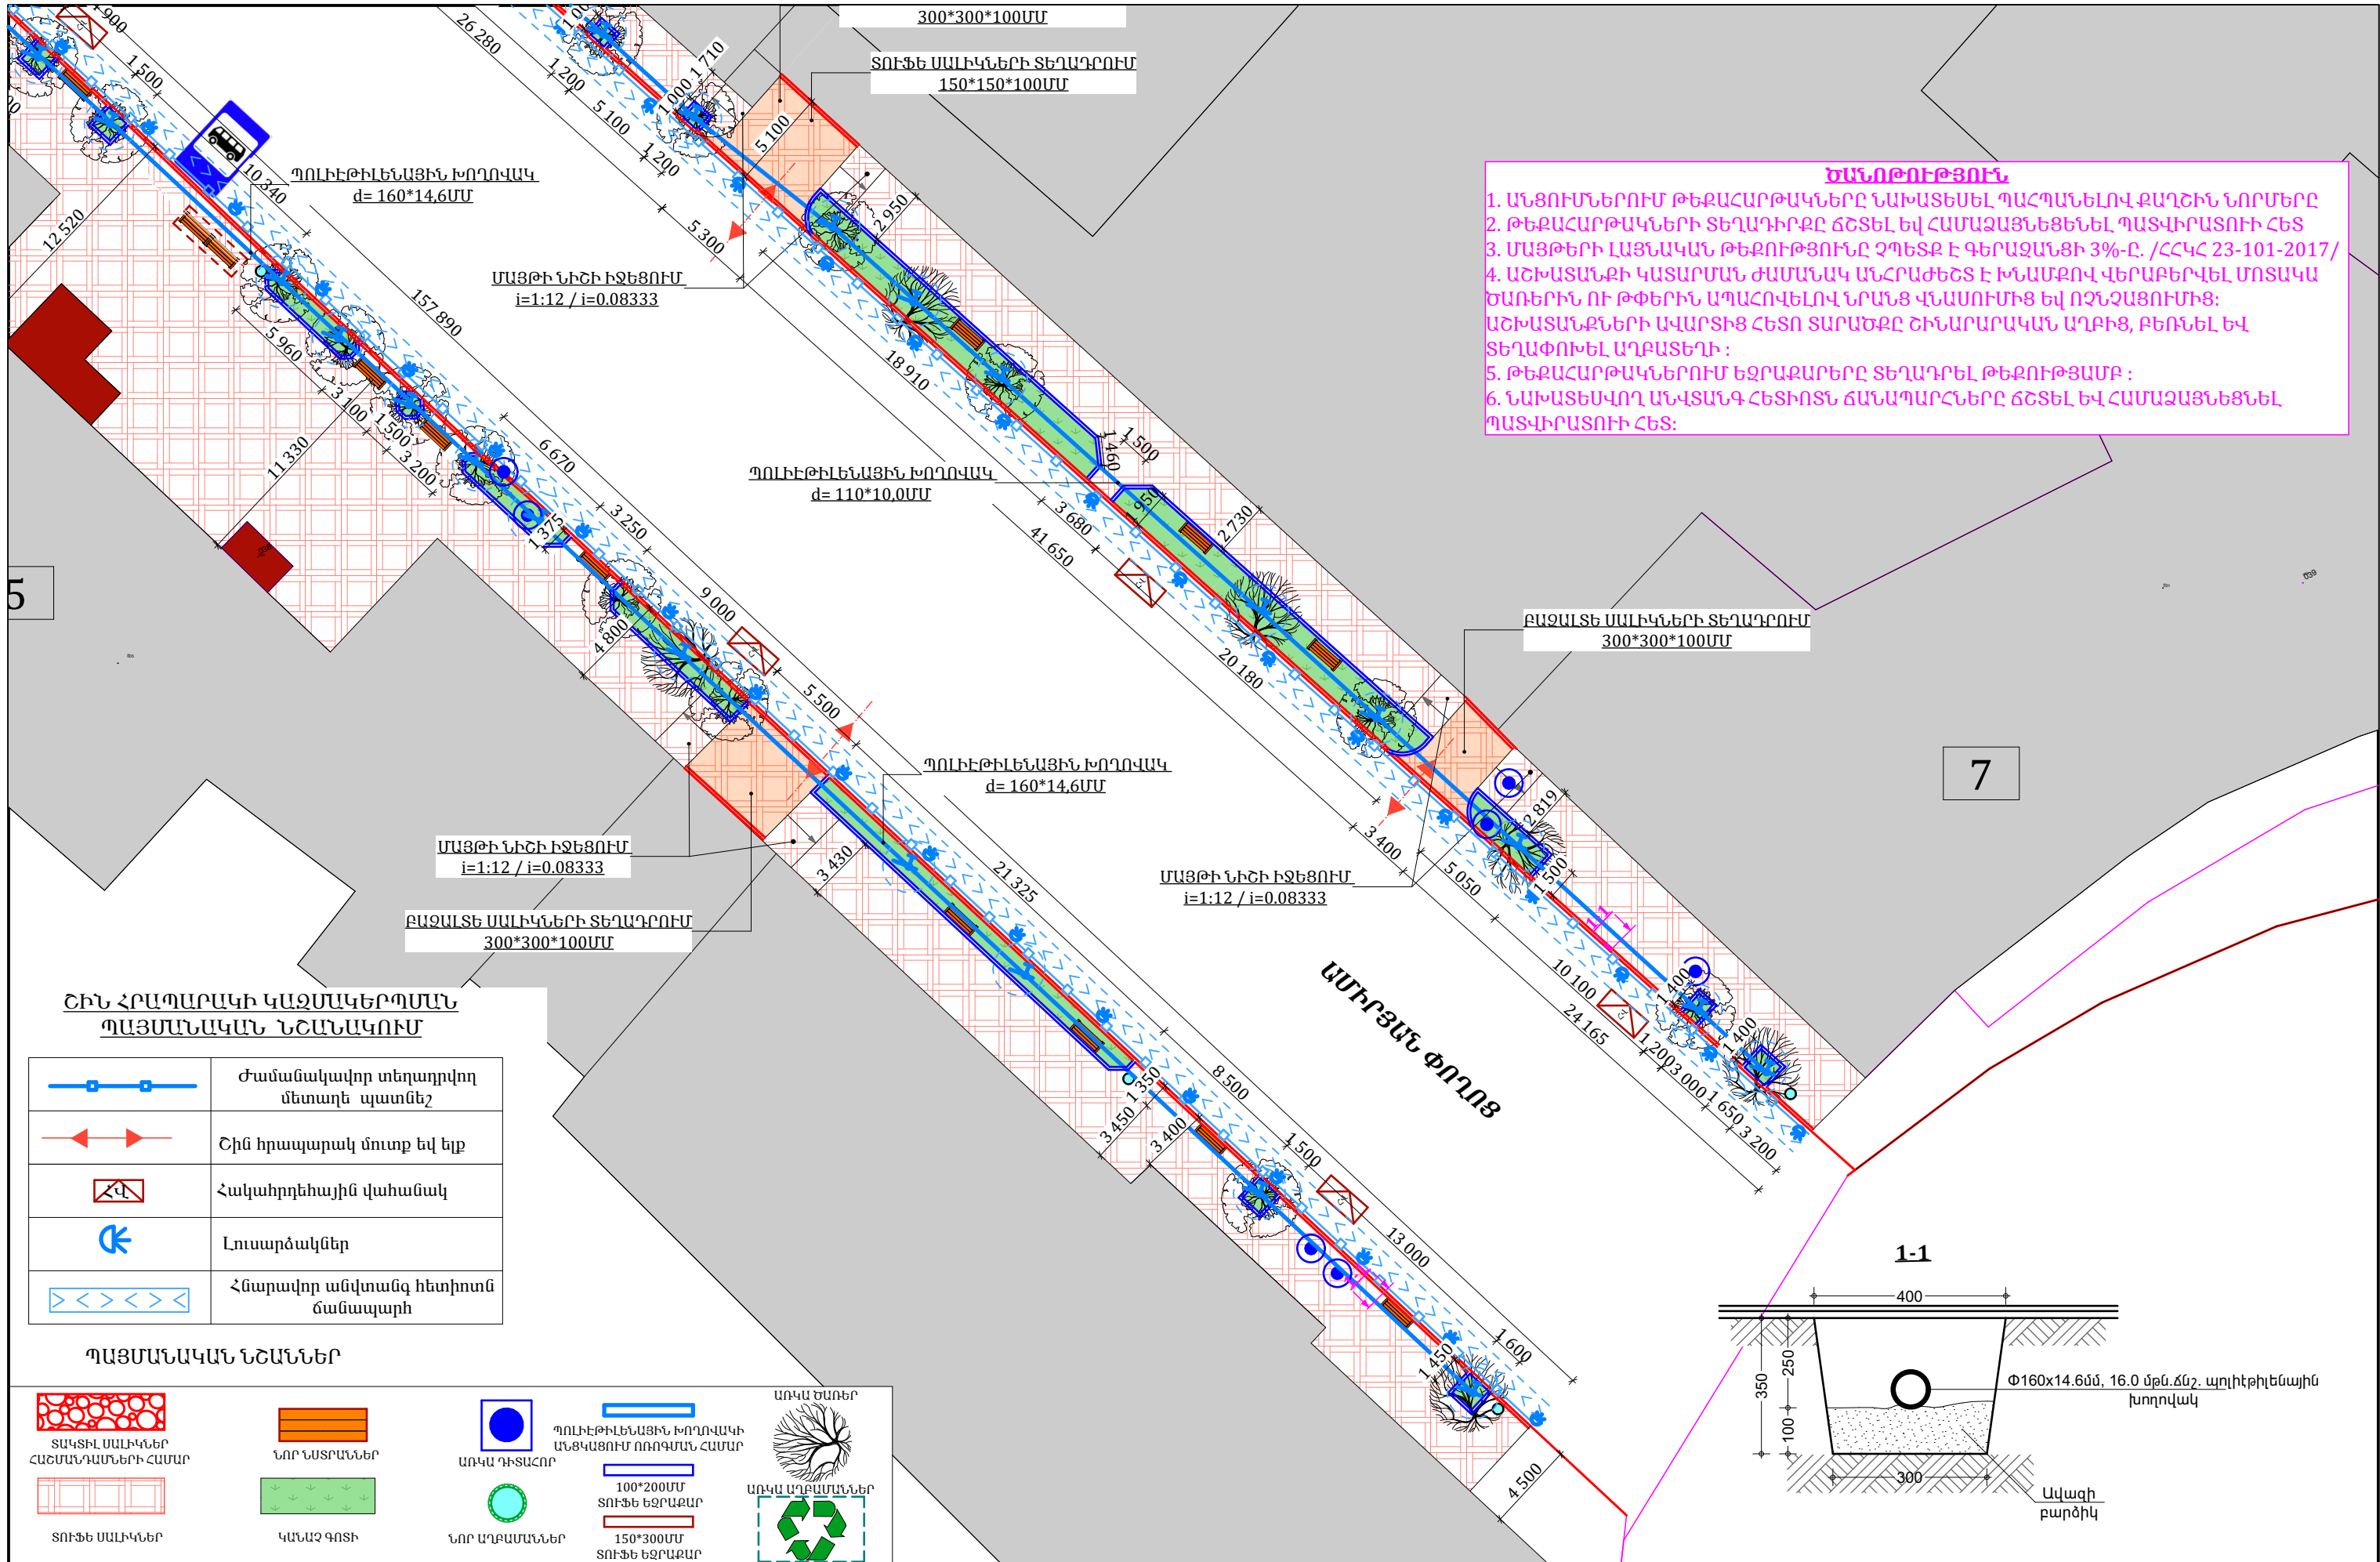

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ**
- ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ԶԱՂԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
 - ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՑՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ
 - ՄԱՅԹԵՐԻ ԼԱՑՆԱԿԱՆ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՊԵՏՔ Է ԳԵՐԱՁԱՆՑԻ 3%-Ը. /ՀՀԿՀ 23-101-2017/
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՄՈՏԱԿԱԾԱԹԵՐԻՆ ՈՒ ԹՓԵՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՎՆԱՍՈՒՄԻՑ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄԻՑ:
 - ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԸ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՂԲԻՑ, ԲԵՌՆԵԼ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՂԲԱՏԵՂԻ:
 - ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԸ ՏԵՂԱԴԻՐԵԼ ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ:
 - ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳ ՀԵՏԻՈՏՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՑՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:

ՇԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ


	Ժամանակավոր տեղադրվող մետաղե պատմեշ
	Շին հրապարակ մուտք եվ ելք
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Հնարավոր անվտանգ հետիոտն ճանապարհ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՏԱԿՏԻԼ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՀԱՇՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	ՆՈՐ ՆԱՏՐԱՆՆԵՐ	ԱՌԿԱ ԴԻՏԱՀՈՐ	ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՑԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	ԱՌԿԱ ԾԱՌՈՐ
ՏՈՒՖԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ	ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻ	ՆՈՐ ԱՂԲԱՏԱՆՆԵՐ	100*200ՄՄ ՏՈՒՖԵ ԵԶՐԱՔԱՐ	ԱՌԿԱ ԱՂԲԱՏԱՆՆԵՐ
			150*300ՄՄ ՏՈՒՖԵ ԵԶՐԱՔԱՐ	


ՊԱՀՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈԼԸ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՐՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՑԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՑԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ/ Մ 1 : 300	ԱՆ	64	77	«ԹՈՒՈՒՐՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳՎ	Հ. ՀՈՎԱՏԵՓՅԱՆ								



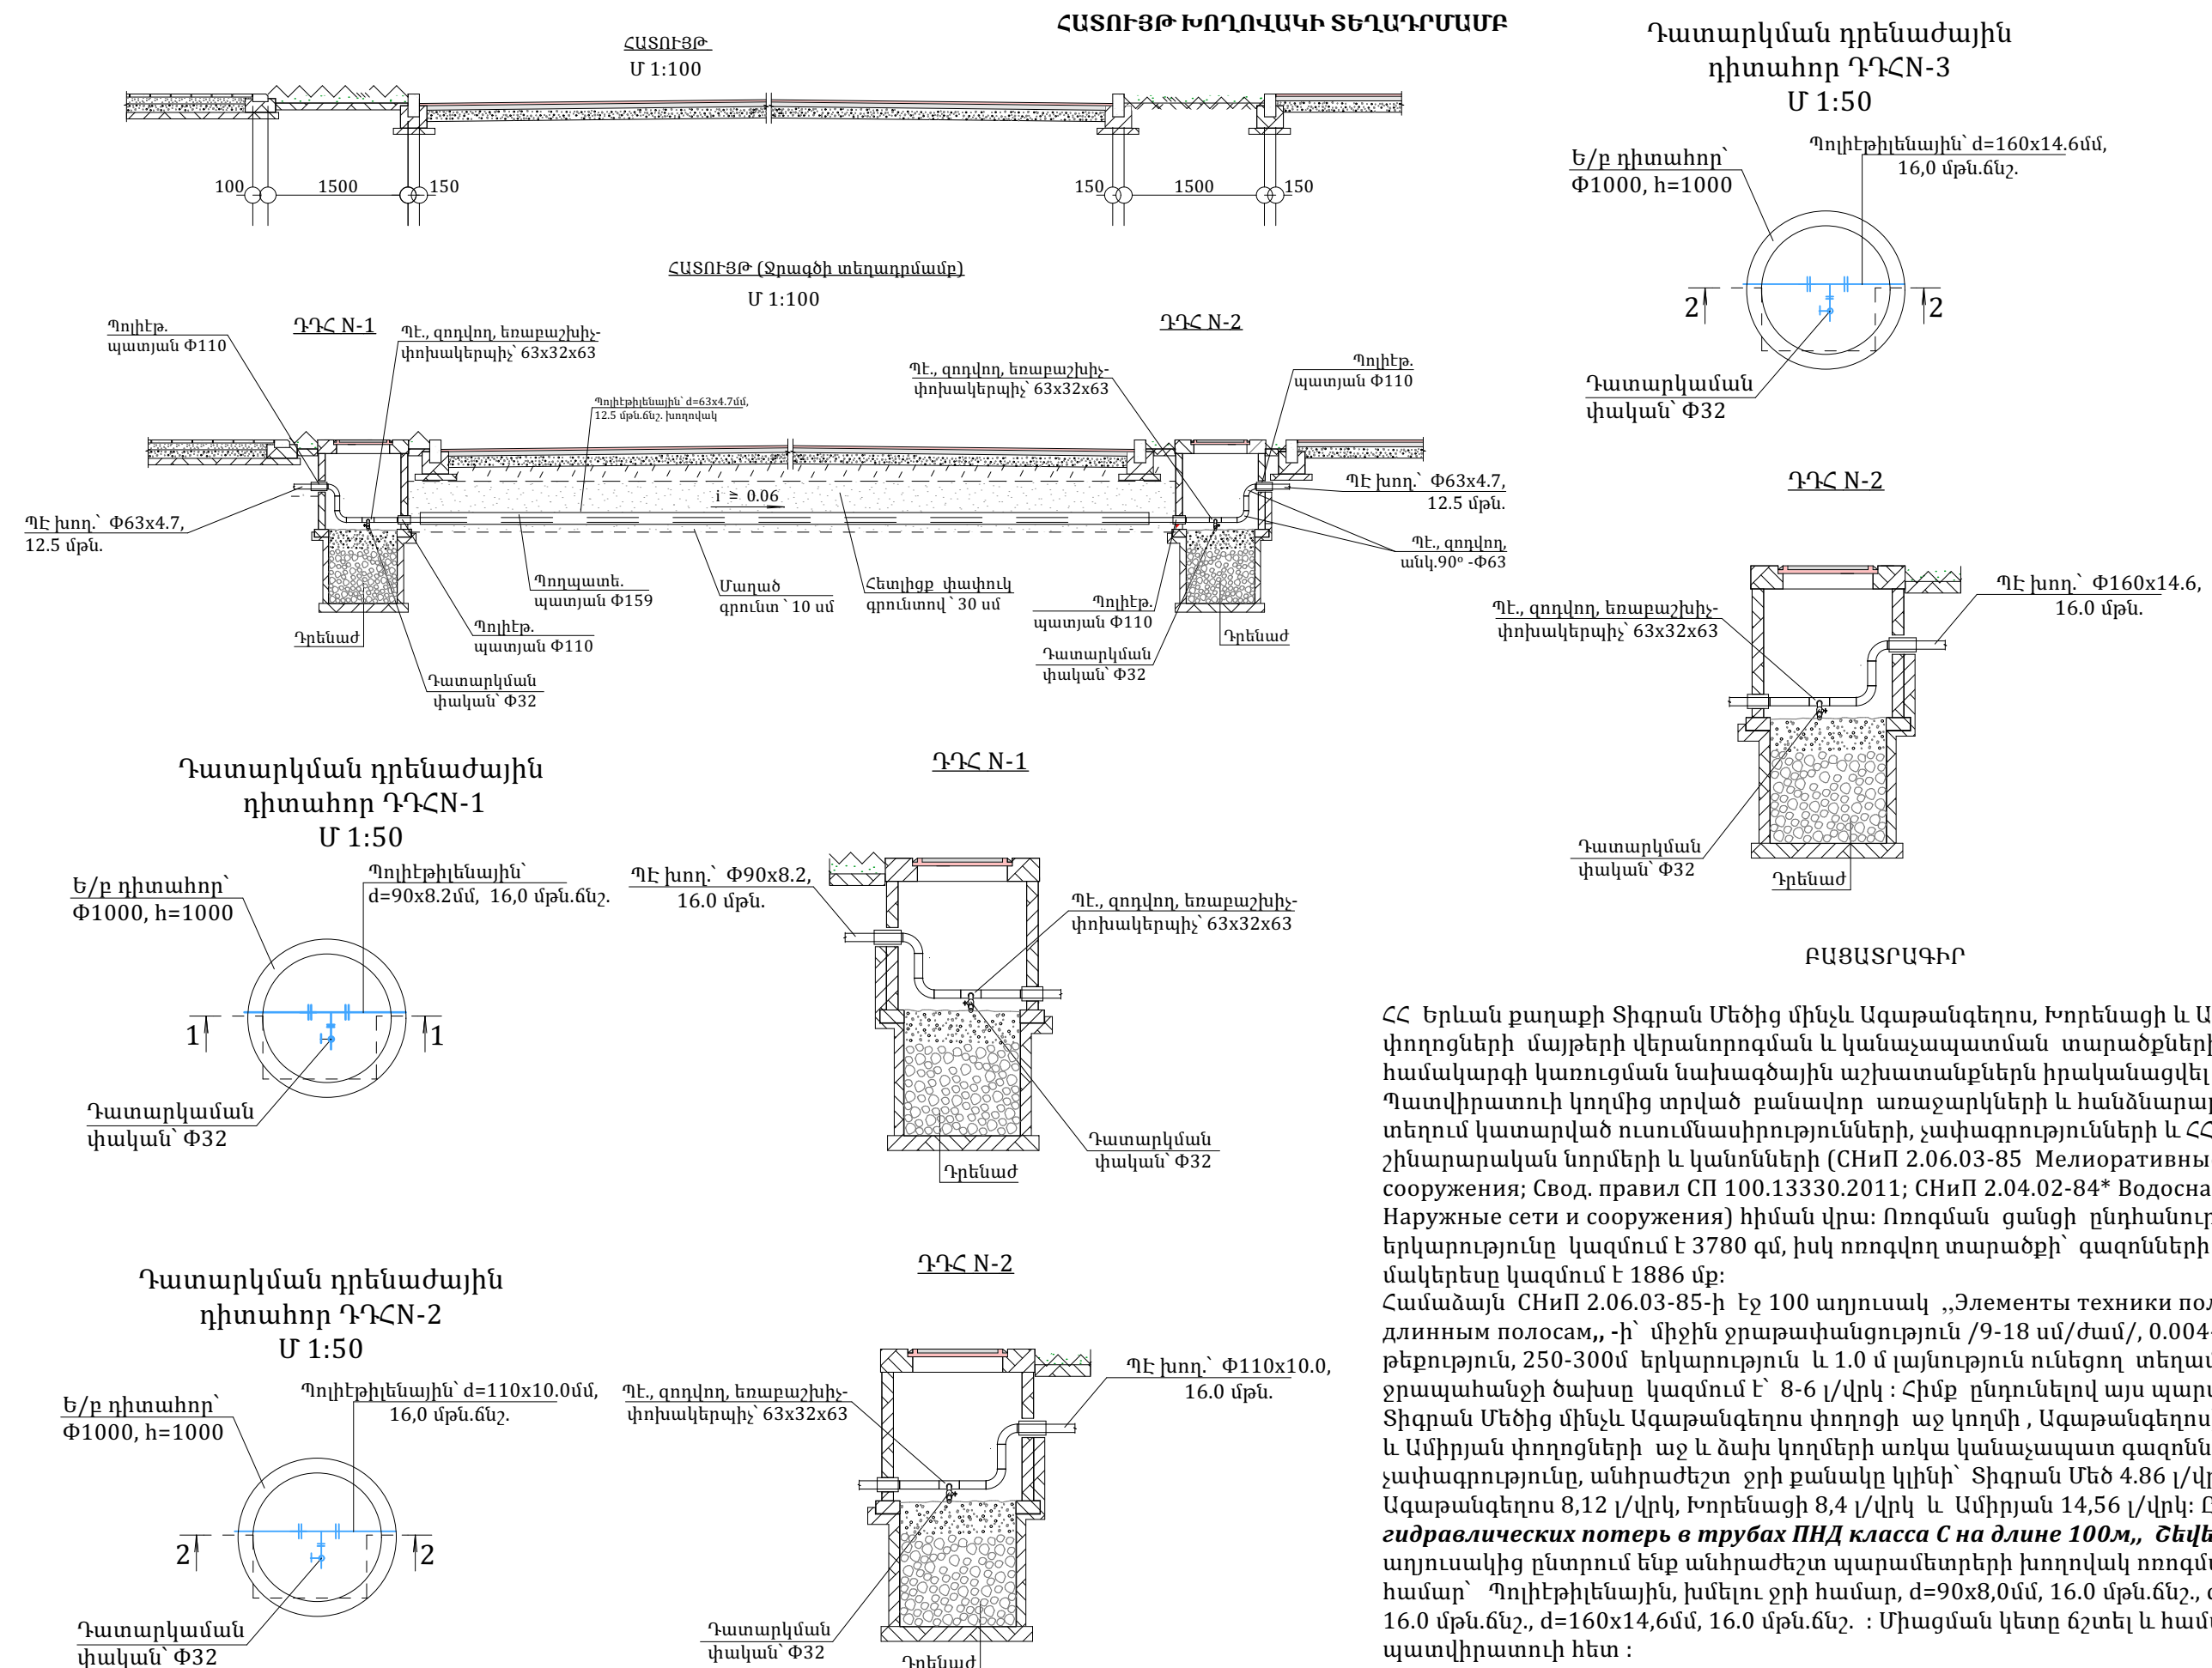


ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԺԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՅ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏՈՒՅԹ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՍԲ	ԱՆ	65	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՅ ՓՐՈՉԵԶԹ» ՍՊԸ
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ							
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ							


ՀԱՏՈՒՅԹ
Մ 1:100



ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ $\Phi 160 \times 14,6$ մմ ԽՈՂՈՎԱԿԻ
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՅԹԸ Մ 1:20

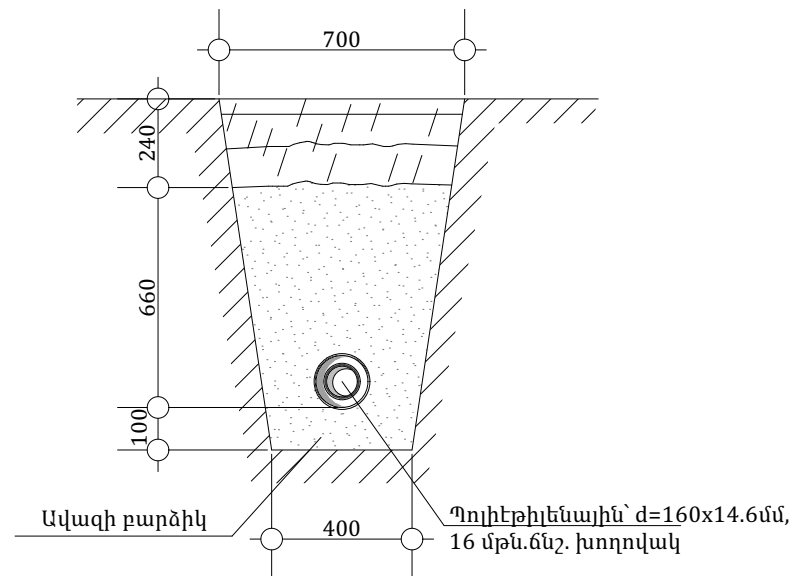

N/N	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵՒՇԸ	ԶԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ԶԱՆԱԿԸ
	Դիտահորի մոնտաժում, դրենաժի կառուցում			
1.	Ե/բ Փ1500 դիտահորի տեղադրում՝ Փ1000, h=1000	1500x1000	հատ	1
3.	Ե/բ ծածկի սալ՝ 1200x1200x180(h)	1200x1200x180	հատ	1
4.	Հատակի ծանր բետոն՝ B15	B15	մ ³	0.075
5.	Հատակի Խիճ՝ 10-15 մմ ֆրակցիայի	10-15 ֆր.	մ ³	0.53
6.	Հատակի Խիճ՝ 40-70 մմ ֆրակցիայի	40-70 ֆր.	մ ³	0.53
7.	Հատակի ճեղքված քազալտ	100-250 ֆր.	մ ³	0.71
8.	Հանգույցի մոնտաժման ծավալները			
9.	Պոլիէթիլենային, զոդվող, եռաբաշխիչ-փոխակերպիչ	75x32x75	հատ	1
10.	Սողնակ մետաղական՝ Փ160	Մետ. Փ75	հատ	1
11.	Պոլիէթիլենային, զոդվող, ֆլանեց՝ Փ160	ֆլանեց՝ Փ75	հատ	2
12.	Փական մետաղական դատարկման՝ Փ32	Մետ. Փ32	հատ	2
13.	Պոլիէթիլենային, ձգվող, անցում՝ Փ32x1 1/3" F	անցում՝ Փ32	հատ	1
14.	Պոլիէթիլենային պատյան՝ Փ160, L=150մմ		հատ	2
15.	Պոլիէթիլենային անկյուն՝ 90° ՝ զոդվող Փ160		հատ	4
16.	ՊԷ անցում, զոդվող՝ Փ160		հատ	1

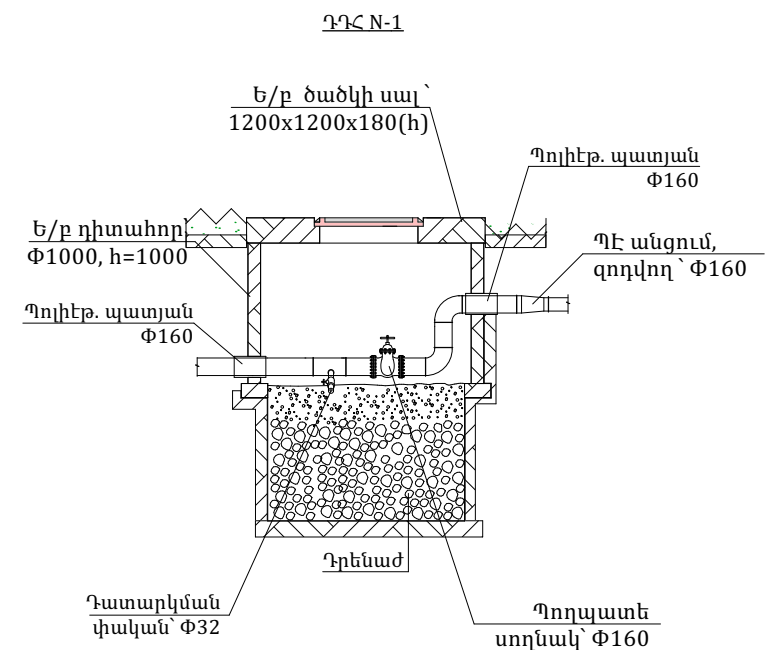

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՏՈՒՅԹ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՄԲ	ԱՆ	66	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ՆԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հծանգոտվող մետաղական հիմքով (AISI 304) դեկորատիվ նստարան՝ պատրաստված χ/ϕ մետաղական թիթեղից և 40*40 փայտից: Արտաքինչափսերը՝ լայնություն 720 մմ, երկարություն 1800 մմ, բարձրություն 830 մմ: Նստարանը պետք է ունենա գետնին ամրացման համար նախատեսված անցքեր, որոնք պետք է լինեն հավելյալ կոշտացված: Նստարանի հիմնական կրող կարկասը պետք է լինի պատրաստված 8 մմ հաստությամբ χ/ϕ պողպատե թիթեղից (AISI 304)՝ մշակված լազերային կտրման մեթոդով, իսկ նստատեղի ամրացման բազան 4 մմ χ/ϕ թիթեղից՝ համաձայն գծագրի: Կրողկարկասի՝ R=50 մմ անկյունները պետք է ստացվեն ճկման եղանակով համապատասխան գծագրի, իսկ նստատեղի հատվածի շառավիղը պետք է հավասար լինի 150 մմ և ամբողջական էլեմենտի ճշտությունը պետք է բավարարի ± 3 մմ-ին:



Տախտակը մետաղական բազալին ամրացվում է դրա համար նախատեսված հեղուկների միջոցով: Նստարանի մետաղը պետք է մշակված լինի համապատասխան γ/δ մետաղների համար ընդունված նորմերին: Նստարանի եռակցումը իրականացնել իներտ միջավայրում և մաքրել ձեռքի հղկման մեթոդով: Նյութերը որից պատրաստված է նստարանը պետք է լինեն նոր և չոգտագործված: Տախտակը մետաղական բազալին ամրացվում է դրա համար նախատեսված հեղուկների միջոցով: Նստարանի մետաղը պետք է մշակված լինի համապատասխան γ/δ մետաղների համար ընդունված նորմերին: Նստարանի եռակցումը իրականացնել իներտ միջավայրում և մաքրել ձեռքի հղկման մեթոդով: Նյութերը որից պատրաստված է նստարանը պետք է լինեն նոր և չոգտագործված:

Сушка древесины:

- Лиственница должна быть предварительно высушена до оптимальной влажности (не выше 12–15%) для предотвращения деформаций и растрескивания.
2. Антисептическая обработка:
 - Провести обработку древесины антисептическим составом (на основе борной кислоты или аналогичных средств), обеспечивающим защиту от грибков, плесени и насекомых.
 - Пропитка должна производиться равномерно, с соблюдением рекомендованных норм расхода материала.
3. Грунтовка:
 - После полного высыхания антисептика нанести грунтовочный состав, повышающий адгезию последующих защитных слоёв к поверхности древесины.
4. Финишное защитное покрытие:
 - Нанести два слоя защитного покрытия. В качестве покрытия можно использовать:
 - Масло-восковые составы (например, тунговое или льняное масло с воском) для глубокой пропитки и защиты от влаги и ультрафиолетового излучения,
 - или уличные полиуретановые лаки, сертифицированные для наружного применения, с образованием защитного слоя не менее 0,2 мм по толщине.
 - Между слоями обеспечить необходимое время для полного высыхания согласно рекомендациям производителя материалов.






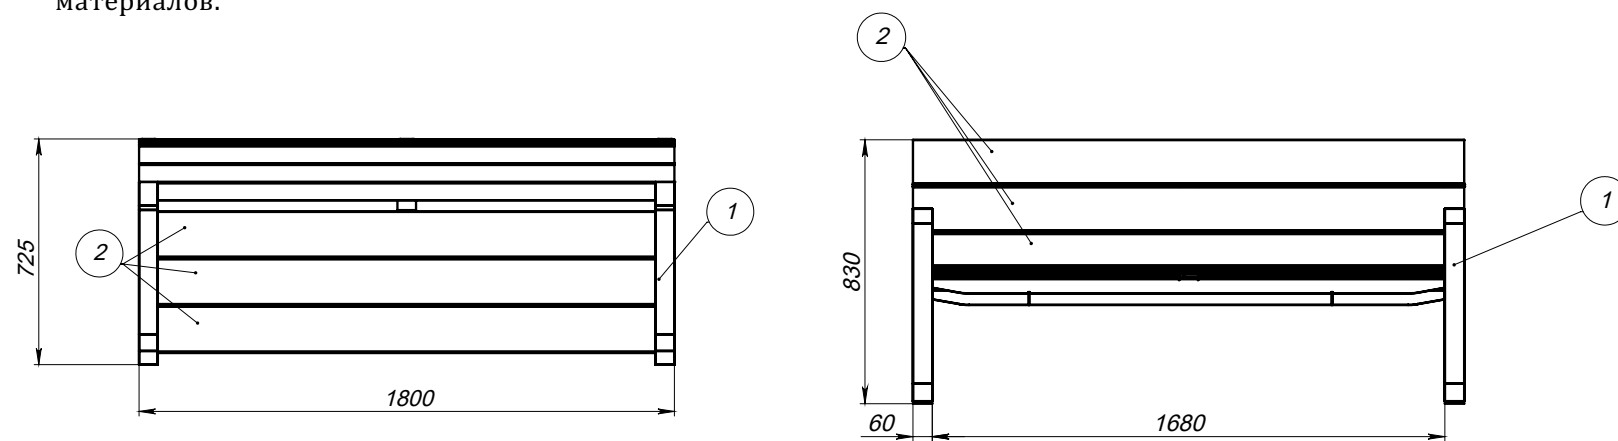


Բնութագիր			
Դիրք.	Անվանում	Նշում	Քանակ
1	Կրող կարկաս	Թիթեղաոր մետաղ	1
2	Տեռասաին տախտակ	փայտ-պոլիմերային կոմպոզիտ	6

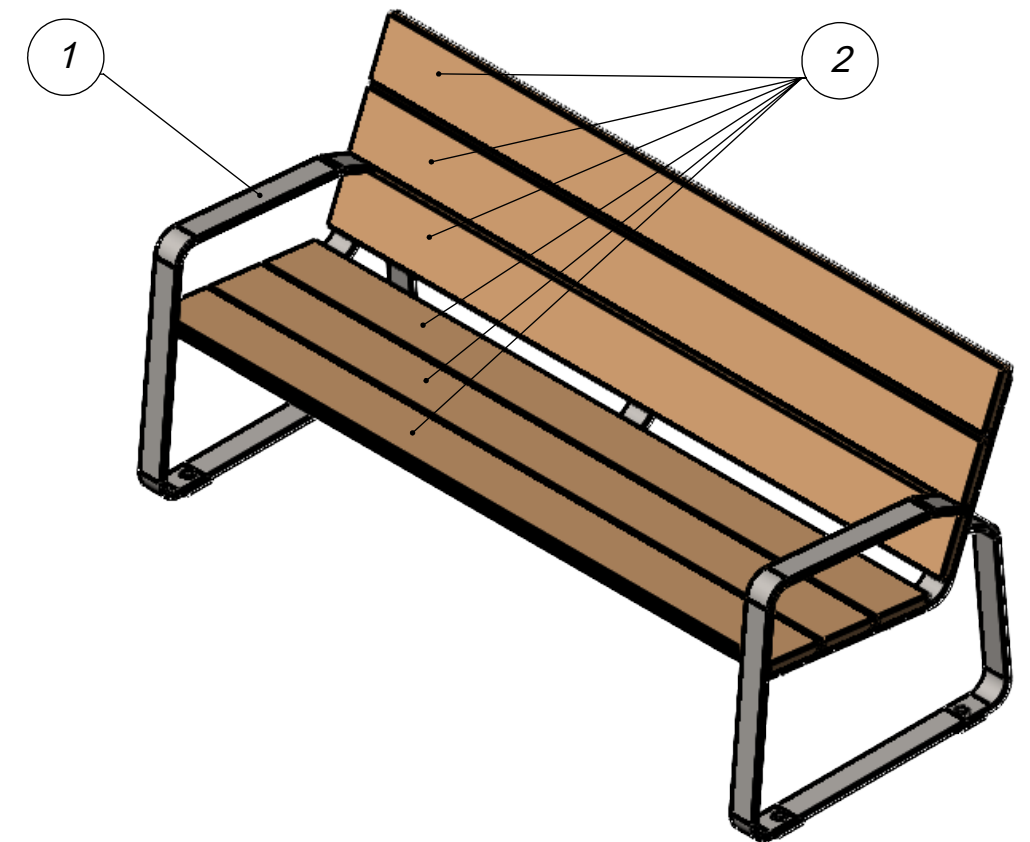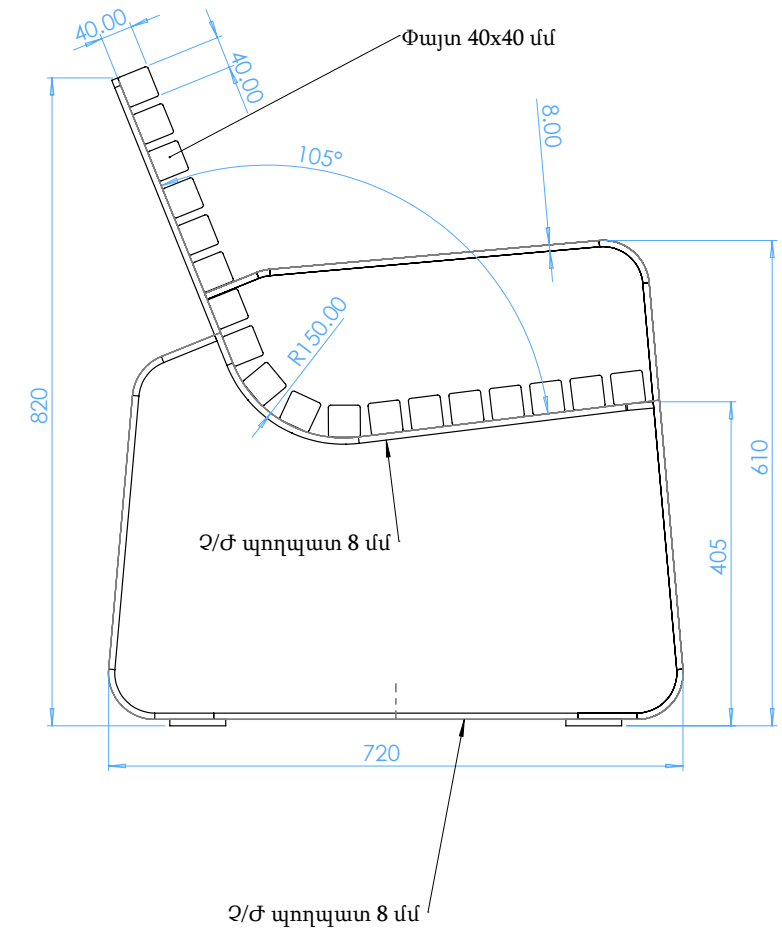

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՔԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՆՍԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	67	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								


ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

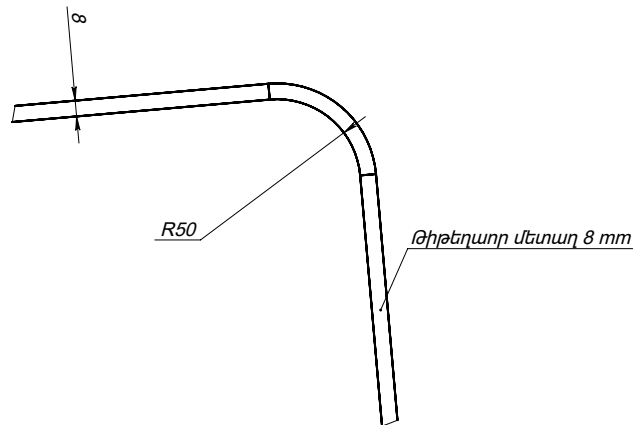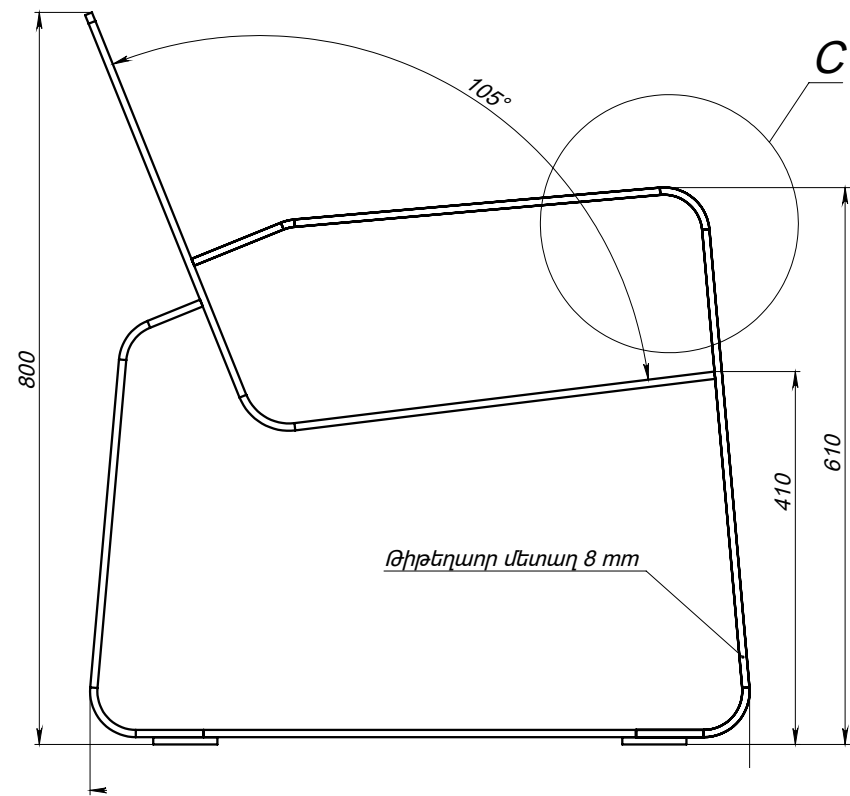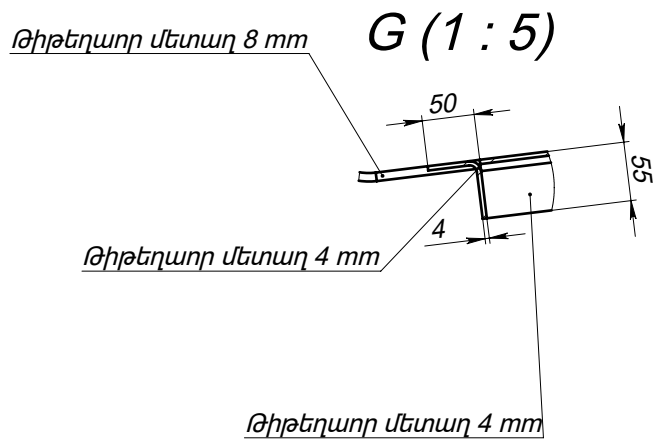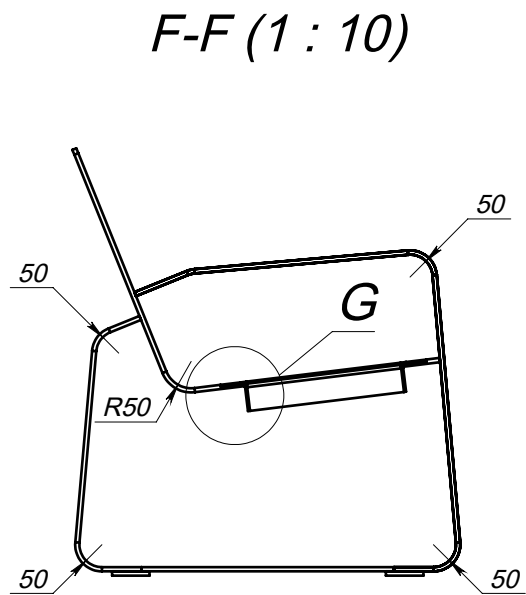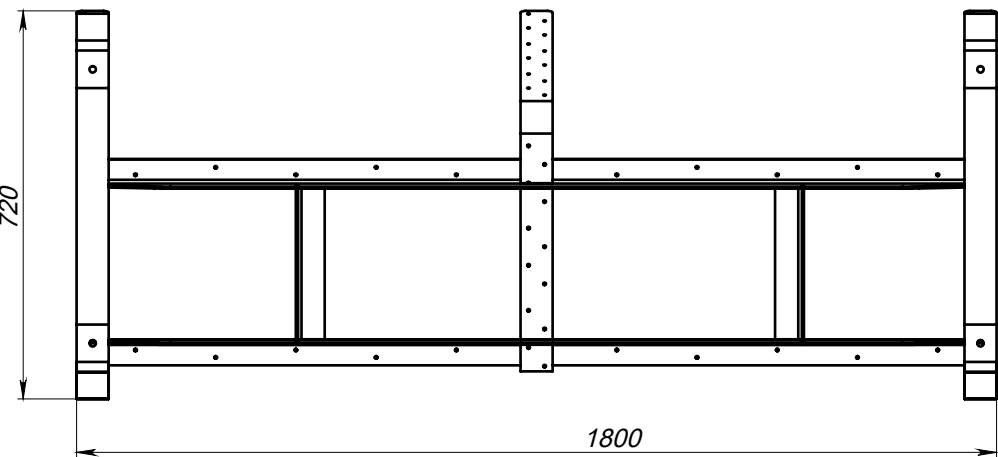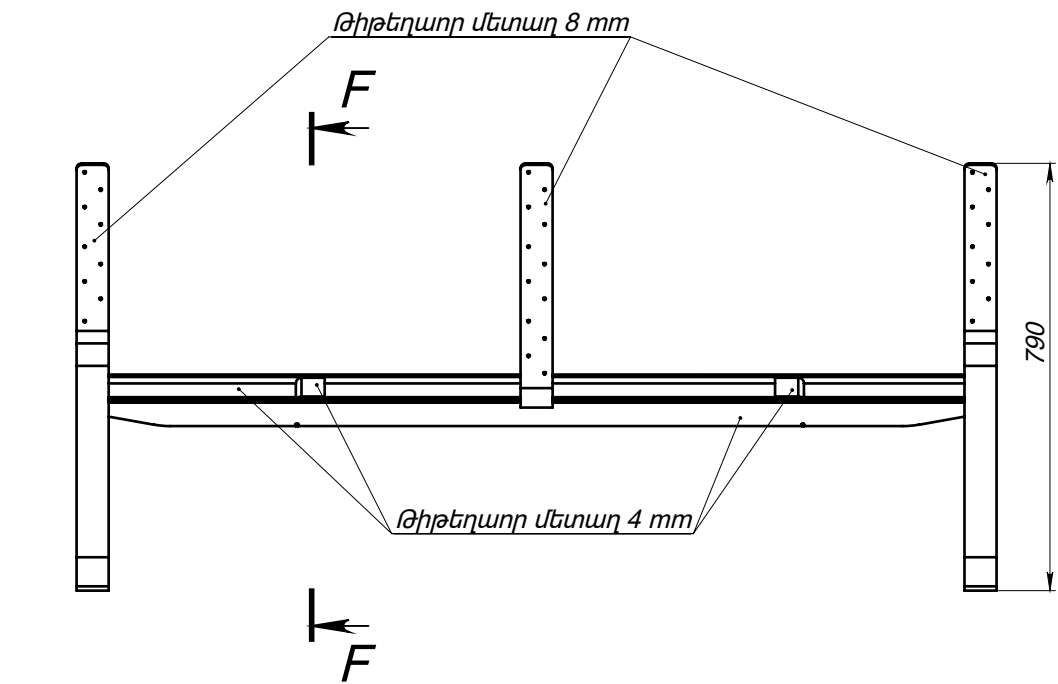

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ՓՈՂՈՑԻ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՔԱՆԱԿԸ- 30 ՀԱՏ
ԽՈՐԵՆԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՔԱՆԱԿԸ- 63 ՀԱՏ
ԱՄԻՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՔԱՆԱԿԸ- 38 ՀԱՏ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ	ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ	ԱՆ	68	77	«ԹՈՒՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ»	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ		ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ					ՍՊԸ	
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱԵՓՅԱՆ		ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ						

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


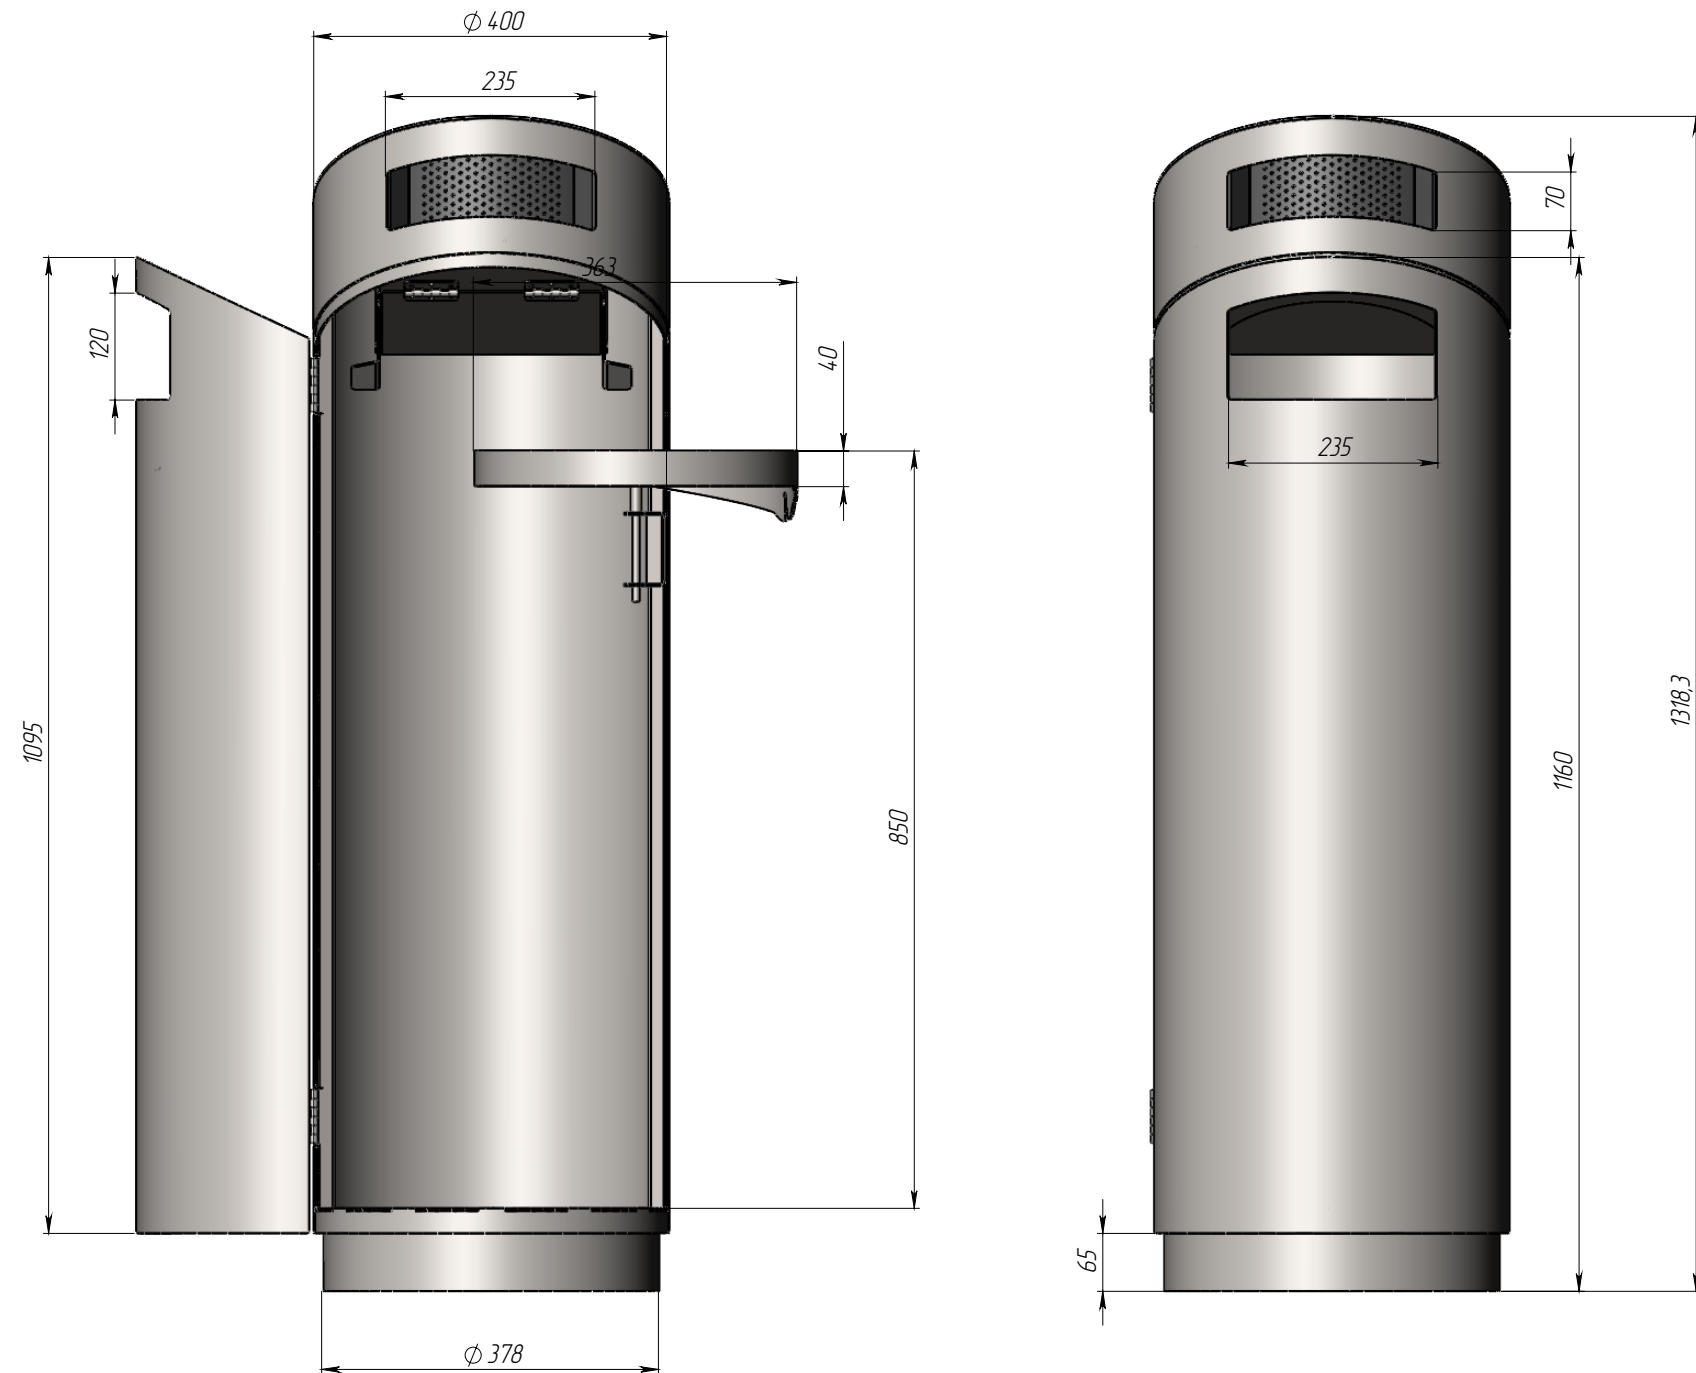


ԱՂԲԱՄԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Մետաղյա աղբարկղ՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատի թիթեղից AISI 304 : Արտաքին չափսերը՝ տրամագիծ 400մմ, բարձրություն 1318 մմ : Աղբամանը պետք է ունենա դռնակ բանալիով՝ աղբամանի աղբը դատարկելու համար: Աղբը կուտակվում է աղբի համար նախատեսված տոպրակում, որը ամրացվում է դրա համար նախատեսված շարժական օղակի վրա – (դետալ 5):


Դռնակը պետք է ամրացված լինի իրանին՝ չ/ժ պողպատից պատրաստված ծխինների միջոցով և լինի կոշտացված համապատասխան գծագրի : Աղբամանը համալրված է մոխրամանով ,որը դատարկվում է ստորին մասից՝ դռնակի շարժման միջոցով : Մոխրամանի դռնակը մոխրամանին ամրացվում է զսպանակավոր ծխինների միջոցով : Դռնակը համալրված է դռան բացման անկյունը սահմանափակող դետալով : Դռնակը պետք է ունենա քանդվելու հնարավորություն : Աղբամանի իրանը պետք է կոշտացվի ծխինների և փականի կողմերի ամբողջ բարձրությամբ : Աղբամանը ամրացվում է հիմքի էլեմենտի միջոցով, որը պատրաստված է մետաղական թիթեղից և փոշեներկված է :

Բոլոր չափսերը և նյութերը տես գծագրում

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՔԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂԱՔԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	69	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



Բնութագիր			
Դիրք.	Անվանում	Նշում	Քանակ
1	Դետալ 1	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
2	Դետալ 2	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
3	Դետալ 3	Պողպատ 4 , 3 մմ	1
4	Դետալ 4	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
5	Դետալ 5	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
6	Դետալ 6	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	2

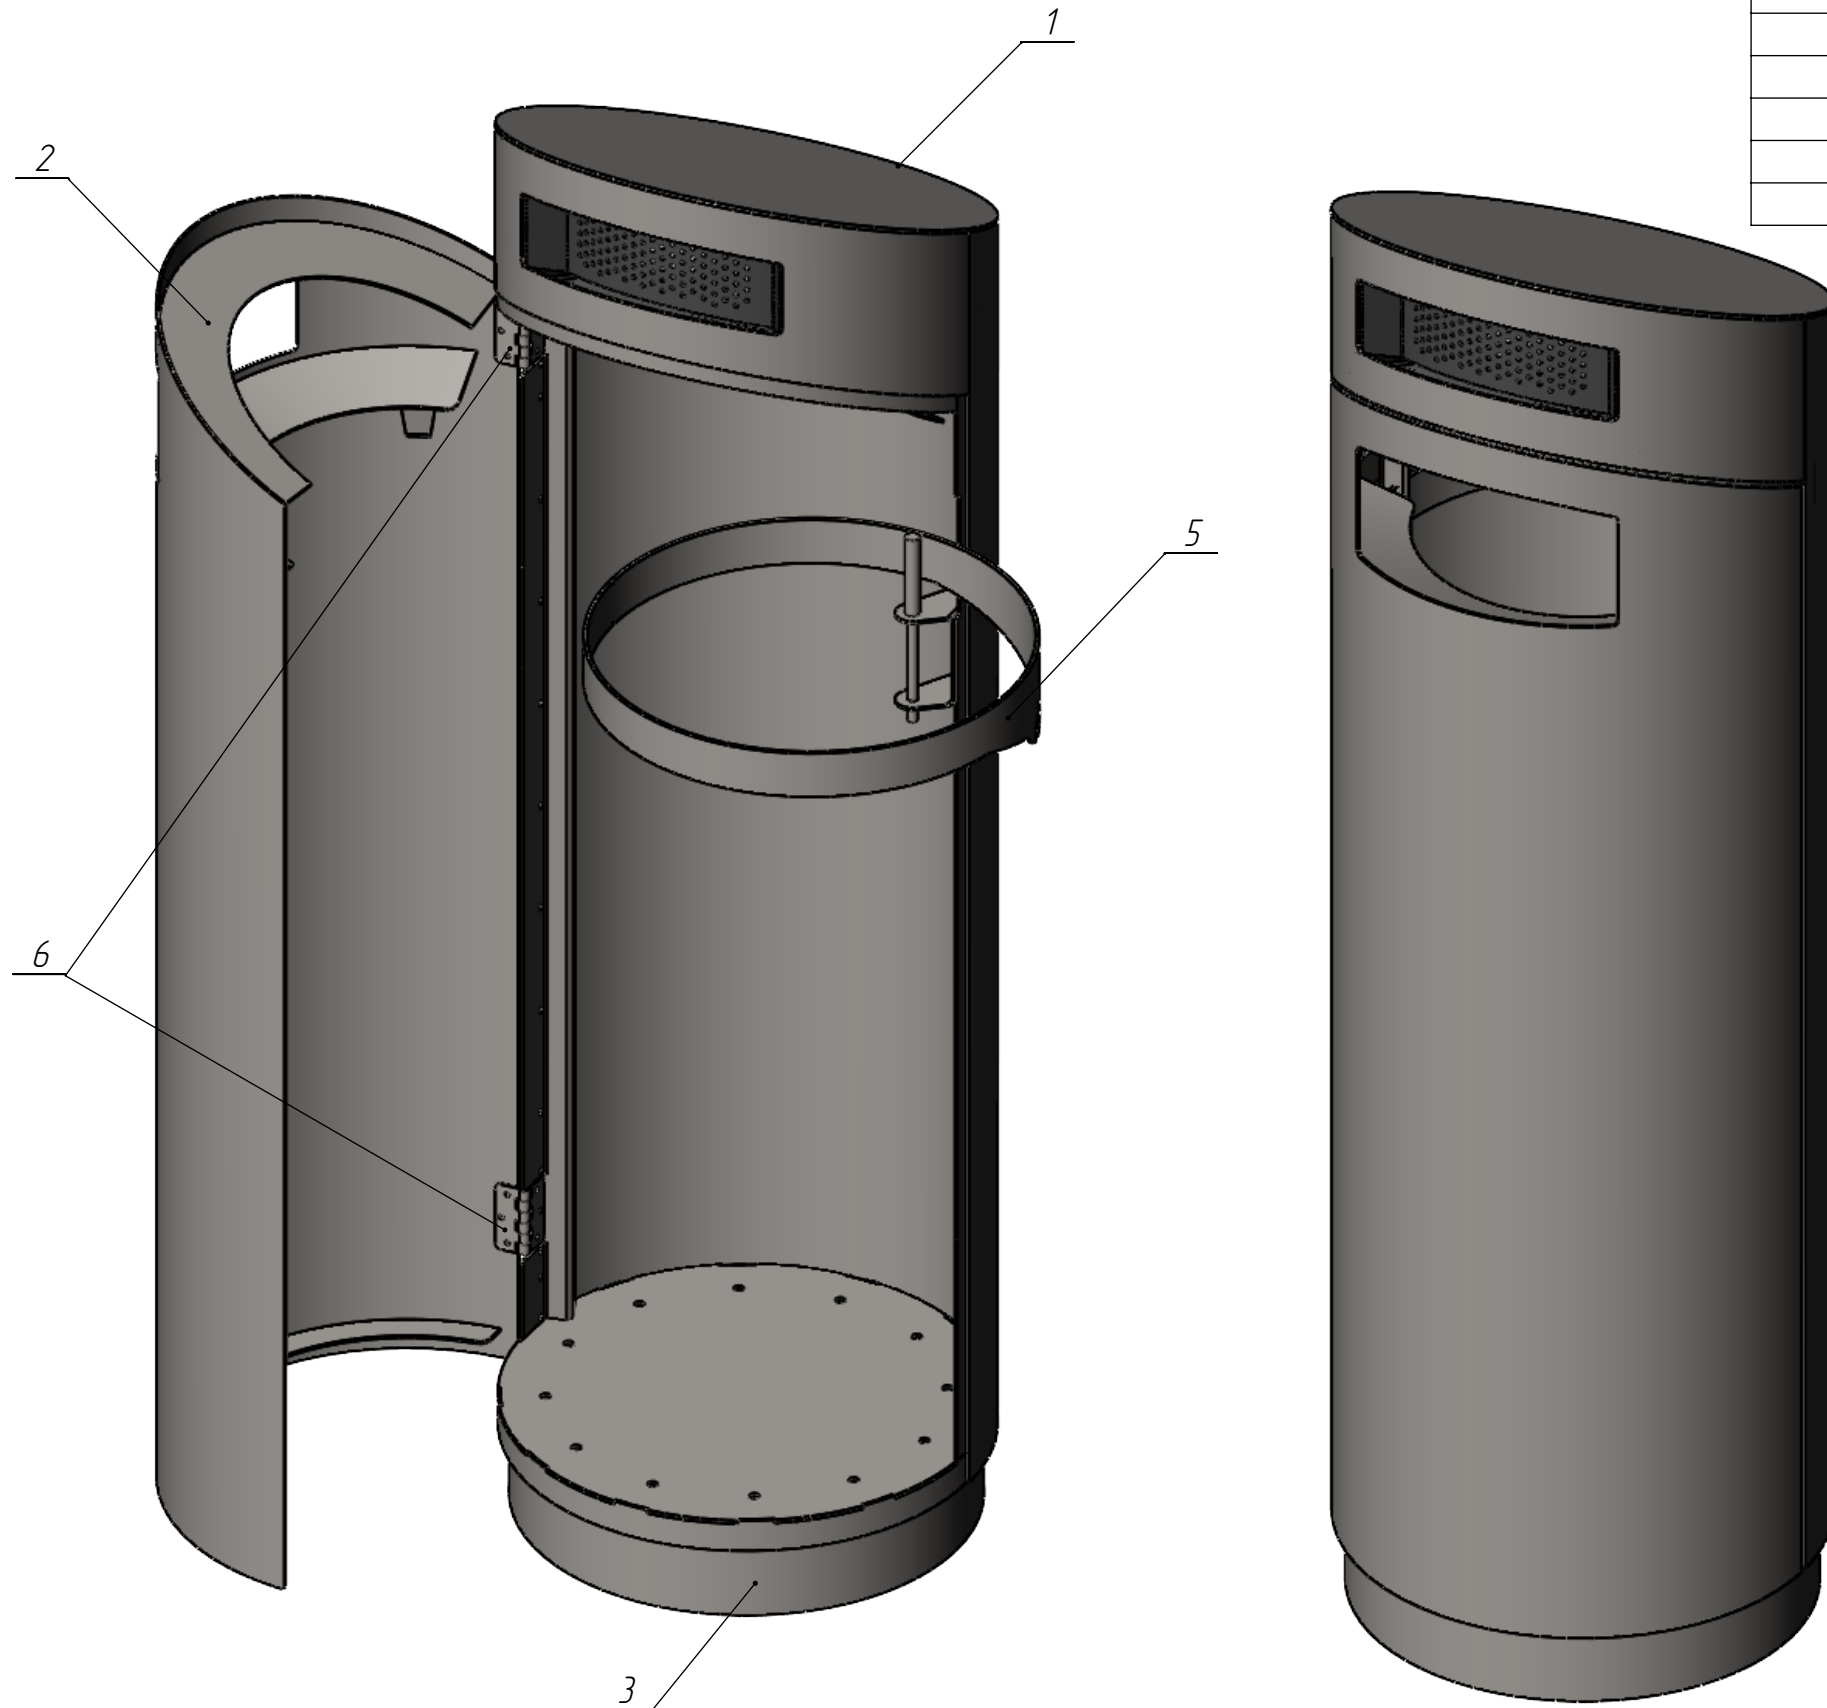


ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	70	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Բնութագիր			
Դիրք.	Անվանում	Նշում	Քանակ
1	Դետալ 1	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
2	Դետալ 2	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
3	Դետալ 3	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
4	Դետալ 4	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
5	Դետալ 5	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
6	Դետալ 6	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
7	Դետալ 7	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
8	Դետալ 8	Ձ/ժ պողպատ 1մմ	1
9	Դետալ 9	Ձ/ժ պողպատ 3մմ	1
10	Դետալ 10	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1

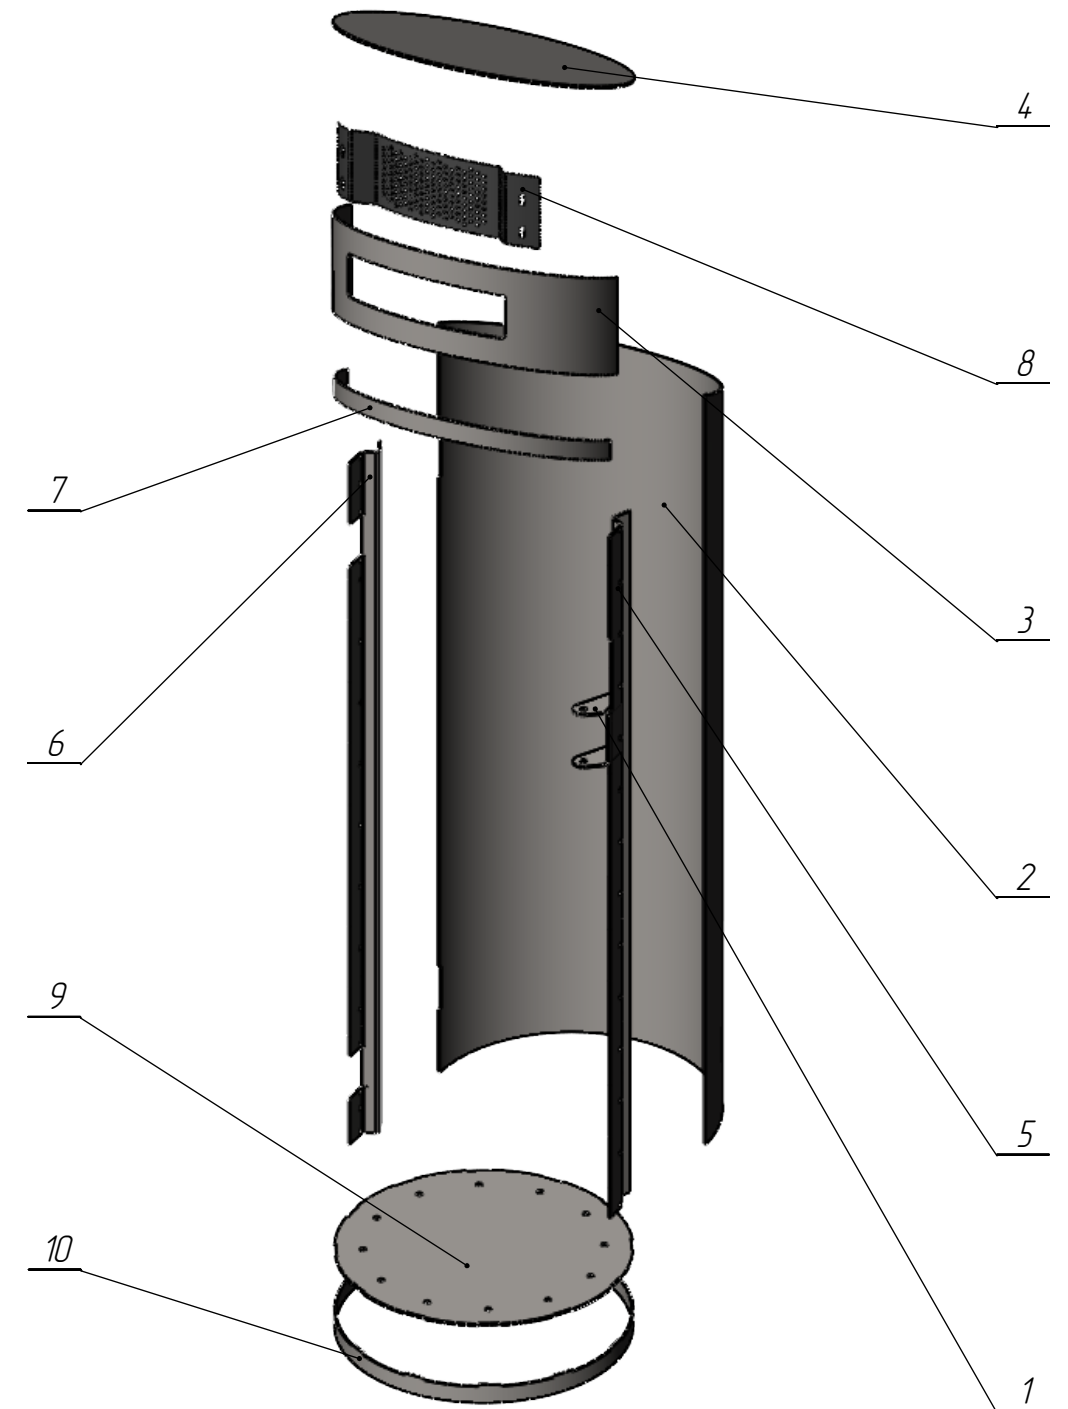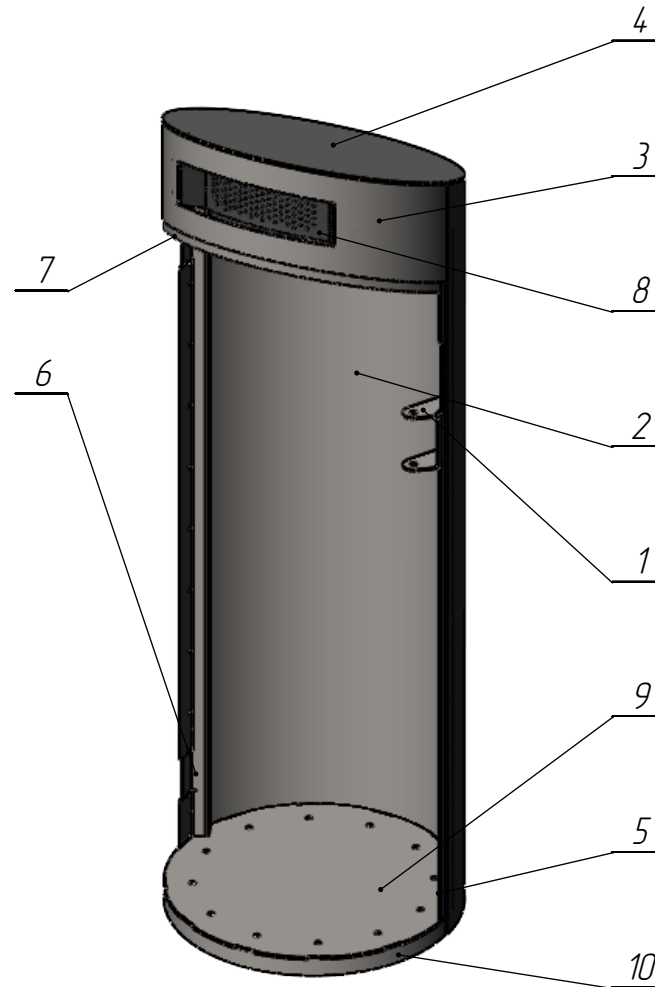


ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ՓՈՂՈՑԻ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՔԱՆԱԿԸ- 6 ՀԱՏ
ԽՈՐԵՆԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՔԱՆԱԿԸ- 16 ՀԱՏ
ԱՄԻՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՔԱՆԱԿԸ- 40 ՀԱՏ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	71	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ




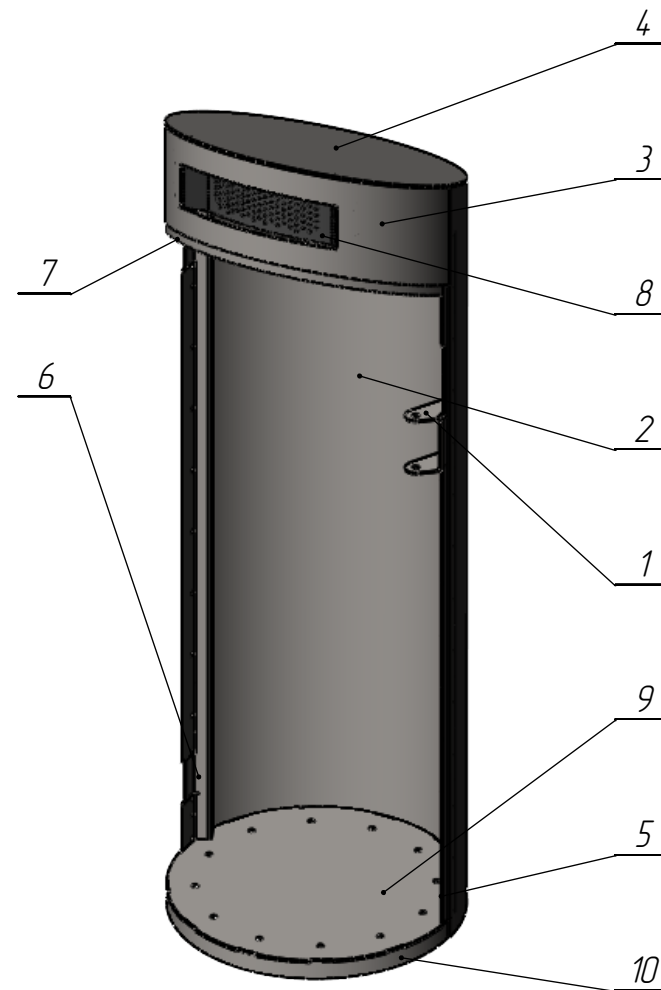


Բնութագիր			
Դիրք.	Անվանում	Նշում	Քանակ
1	Դետալ 1	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
2	Դետալ 2	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
3	Դետալ 3	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
4	Դետալ 4	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
5	Դետալ 5	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
6	Դետալ 6	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
7	Դետալ 7	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1
8	Դետալ 8	Ձ/ժ պողպատ 1մմ	1
9	Դետալ 9	Ձ/ժ պողպատ 3մմ	1
10	Դետալ 10	Ձ/ժ պողպատ 2մմ	1

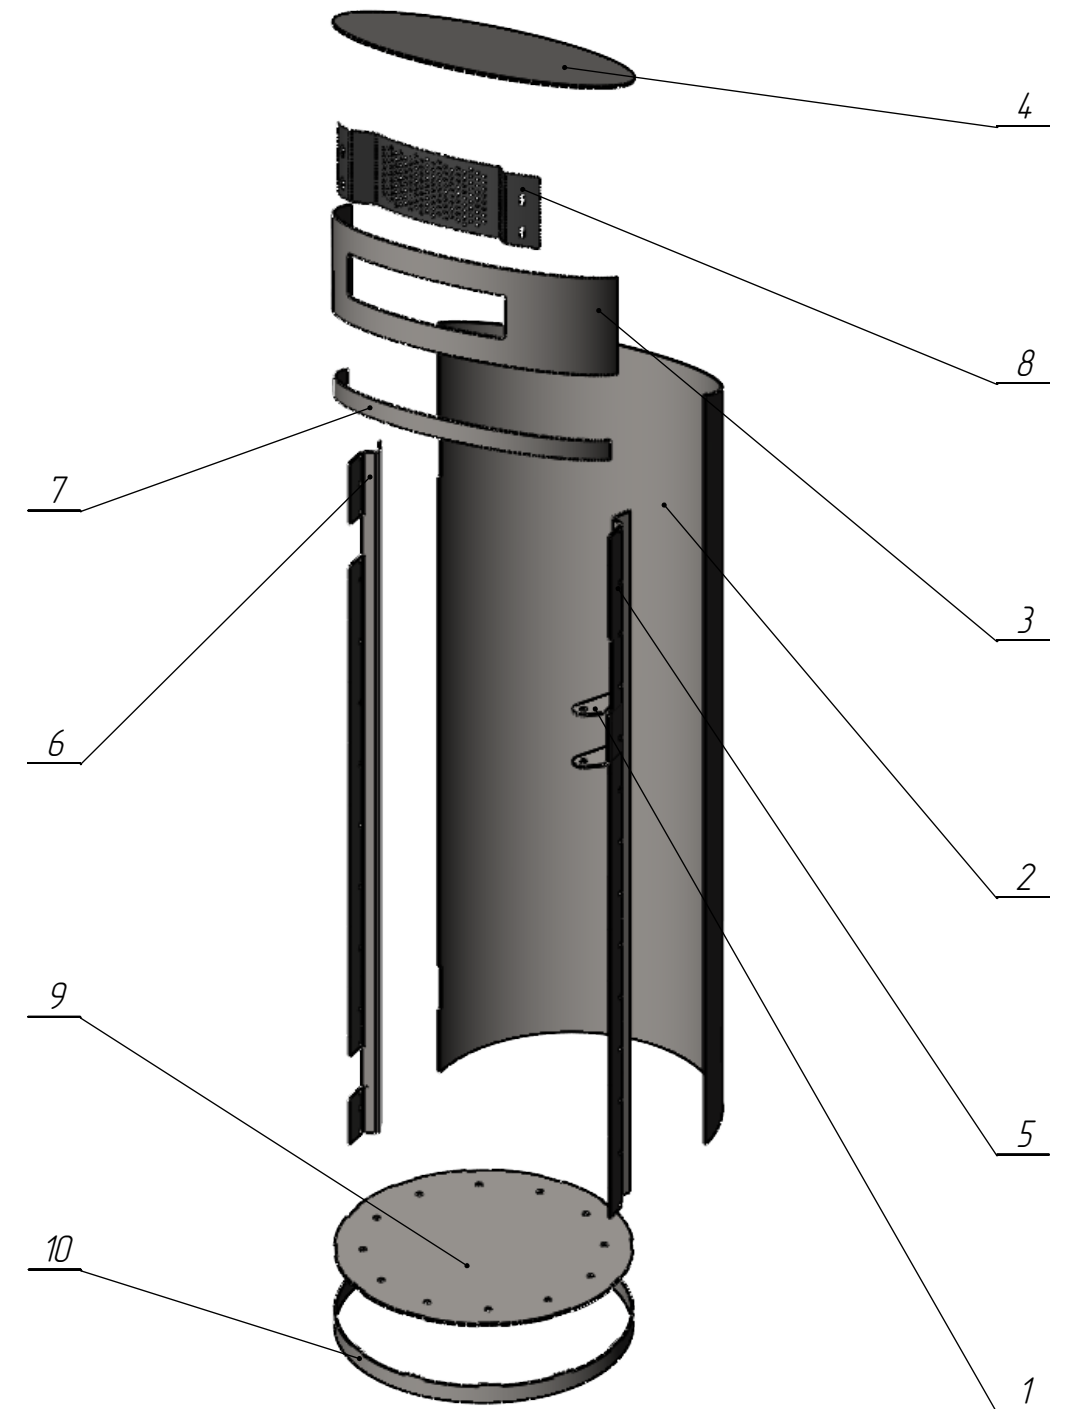


ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆԶԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	72	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈԶԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ								



ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

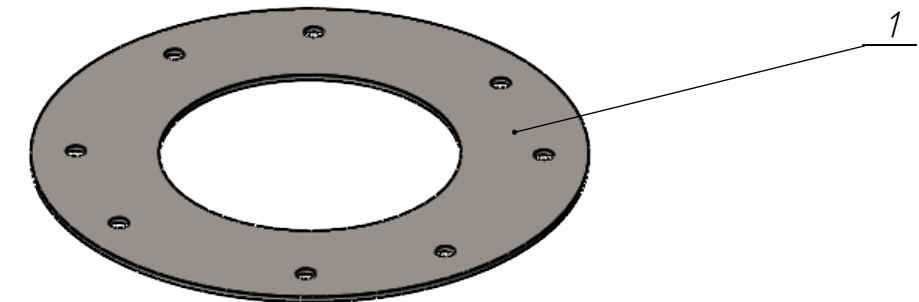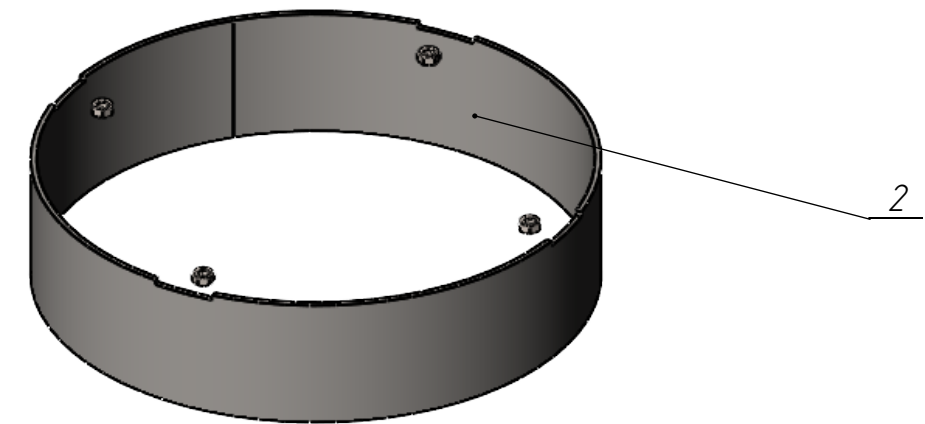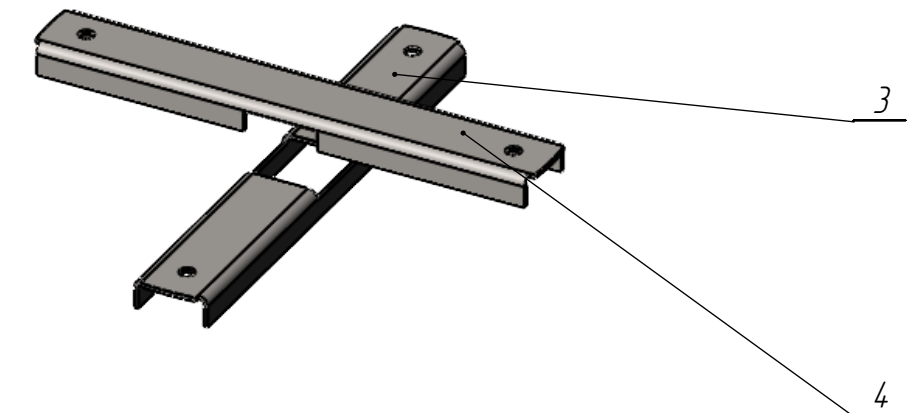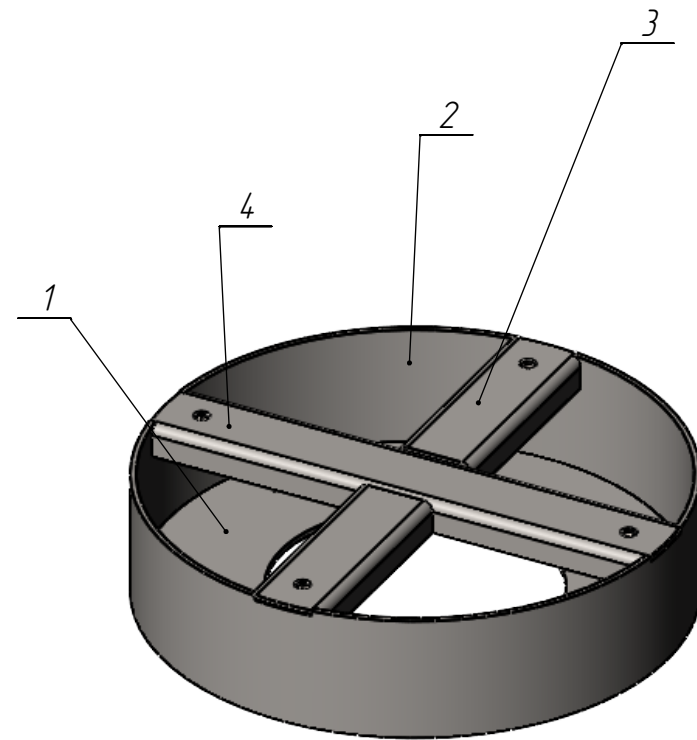


Բնութագիր			
Դիրք.	Անվանում	Նշում	Քանակ
1	Դետալ 1	Պողպատ 4մմ	1
2	Դետալ 2	Պողպատ 3մմ	1
3	Դետալ 3	Պողպատ 3մմ	1
4	Դետալ 4	Պողպատ 3մմ	1
5	DIN 934 – NUT M8		4

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագրություն	ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
Տնօրեն	Ա. Թոնոնիս		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՆ	73	77	«ԹՈՒՆՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ԵԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ԵԳԿ	Հ. ՀՈՎԱՅԷՓՅԱՆ								

ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԵԱԳԻՐ

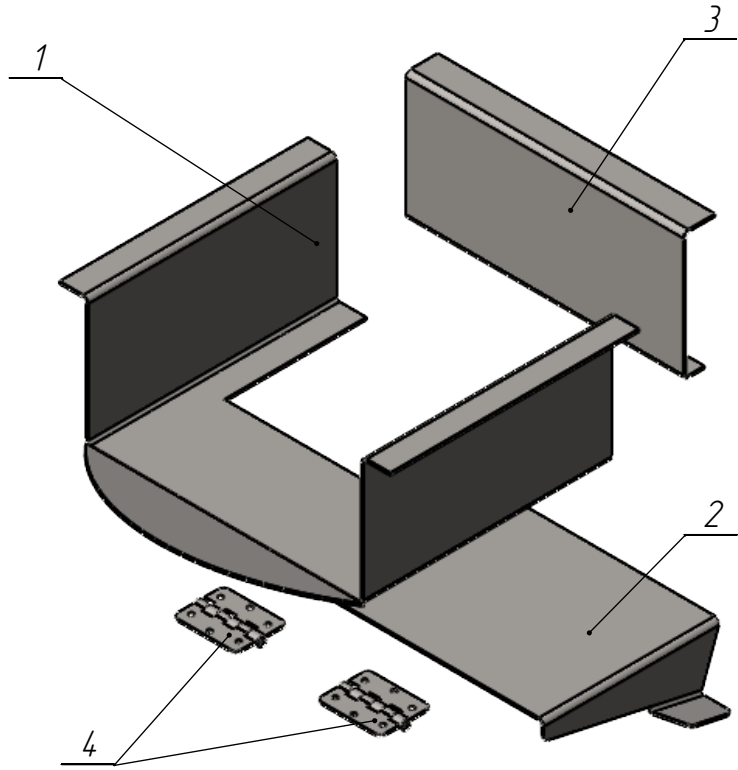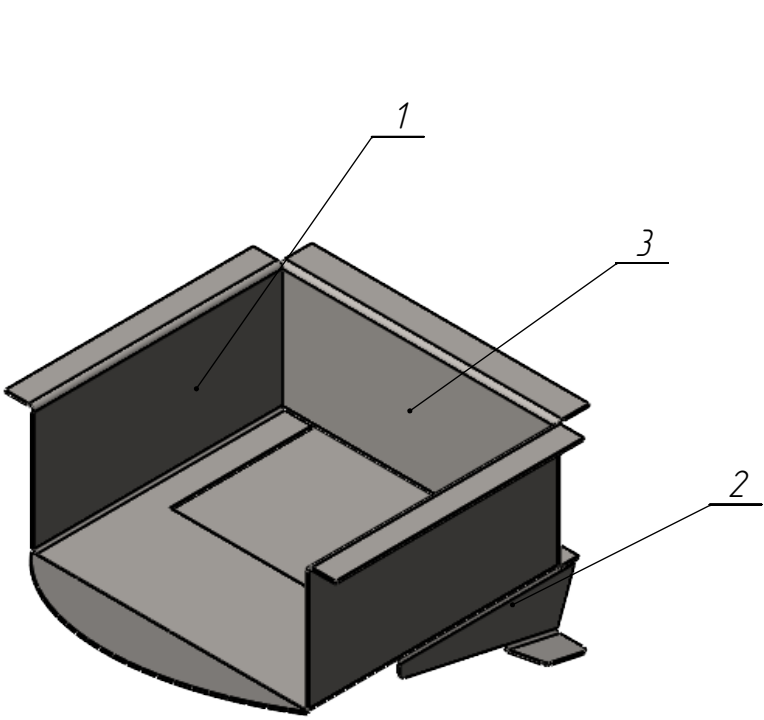

Բնութագիր			
Դիրք.	Անվանում	Նշում	Քանակ
1	Դետալ 1	Չ/ժ պողպատ 2մմ	1
2	Դետալ 2	Չ/ժ պողպատ 2մմ	1
3	Դետալ 3	Չ/ժ պողպատ 2մմ	1
4	Դետալ 4	Չ/ժ պողպատ 2մմ	2

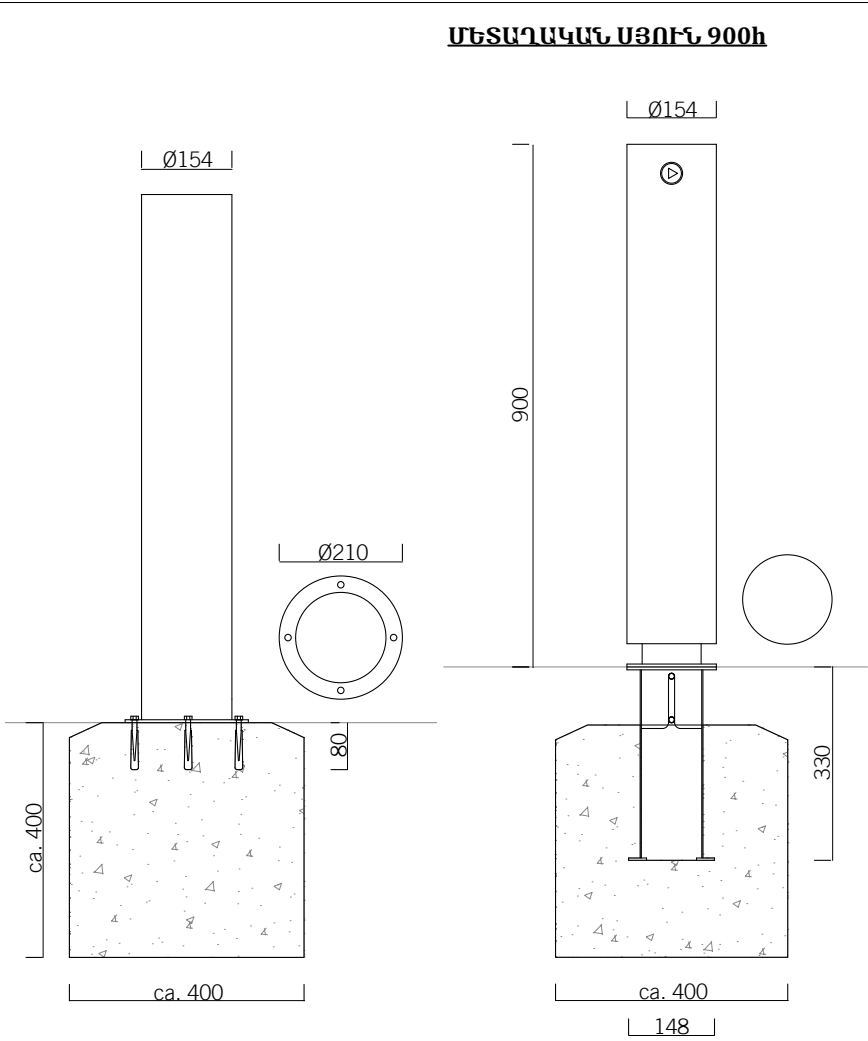

ՉԱՓԵՐԸ
Φ=154մմ
Բարձրությունը՝ 900մմ
Քաշը՝ 8կգ
1. Բետոնի իրականացում h=400մմ
2. Հեղույսի տեղադրում h=80մմ
3. Տեղադրման խորություն 330մմ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՆԻՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԵԱԳԻՐ	ԱՆ	74	77	«ԹՈՒՌՆԻՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ							
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ							



ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻՑ-ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N/N	Էլեմենտի անվանումը	Քանակը.	Քանակը.
	<u>ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Բետոնե սալահատակի քանդում	1270,0 մ²	50,8 մ³
2.	Ավազախճային հիմնատակի քանդում ձեռքով		63,5 մ³
3.	Մայթերի ասֆալտբետոնյա շերտի քանդում	2560,9 մ²	76,8 մ³
4.	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում / բետոնե հիմքով /	1414,4 գծմ	
5.	Բազալտե սալերի ապամոնտաժում հատակից 30 մմ	100,0 մ²	
6.	Նստարանների ու աղբամանների ապամոնտաժում	15 հատ	
7.	Հին մետաղական բազրիքների քանդում	100 գծմ	
8.	Հին փայտե բազրիքների քանդում՝ 300 գծմ	100 գծմ	
9.	Դիտահորերի ծածկոցների քանդում	31 հատ	7,0 մ³
10.	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ա/մ մեխանիզմով և հեռացում 13.0 կմ	553.6 տն	
	<u>ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Հիմքերի փորում բազալտե՝ 150*300մմ եզրաքարերի համար		15.0 մ³
2.	Բազալտե՝ 150*300 մմ եզրաքարերի տեղադրում / բետոնե հիմքով Բ15 /	850.0 գծմ	
3.	Հիմքերի փորում բազալտե՝ 100*200մմ եզրաքարերի համար		5.0 մ³
4.	Բազալտե՝ 100*200 մմ եզրաքարերի տեղադրում / բետոնե հիմքով Բ15 /	580 գծմ	
5.	Խճի նախաշերտի լիցք բազալտե սալիկների տակ /Բյարձա/՝ 100մմ, տոփանումով	2811.0 մ²	281.1 մ³
6.	Բազալտե մանրավազի տոփանում 50 մմ հաստությ. սալիկների /Բյարձա/ տակ	2811.0 մ²	140.6 մ³
7.	Բազալտե սալիկների տեղադրում / Բյարձա / 300*300*50մմ, արտաքին մակերեսը չսահող	2561.0 մ²	
8.	Բազալտե սալիկների տեղադրում / Բյարձա / 300*300*100մմ, արտաքին մակերեսը չսահող	250.0 մ²	
9.	Շոշափողական տակտիլի տեղադրում	20 մ²	
10.	Ծառերի բներում ցինակապատ ճաղավանդակի տեղադրում		18 հատ
11.	Ասֆալտի շերտի իրականացում եզրաքարի և փողոցի միջև 30 մմ հաստ.	715 մ²	
12.	Ջրահեռացման անձրևատարի կառուցում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ. երկայնական ակոսով	90 մ²	

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>		
1.	Ասֆալտբետոնյա շերտի կտրում	գծմ	316
2.	Ասֆալտբետոնյա շերտի քանդում	մ ³	22.3
3.	Խճի շերտի քանդում 150մմ	մ ³	81.9
4.	Գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում` կողլից	մ ³	35.2
5.	Գրունտի քանդում էկսկավ-վ խրամուղում` կողլից	մ ³	82.2
6.	Ավելորդ հողի և շին աղբի բարձում ա/մ և տեղափոխում 13կմ	տն	310.2
	<u>Վերականգնման աշխատանքներ</u>		
1.	Ավազի բարձիկի լիցք` 100 մմ շերտով	մ ³	30.4
2.	Ավազի լիցք խողովակի վրա 200 մմ շերտով	մ ³	60.8
3.	Ավազի բարձիկի լիցք` 100 մմ շերտով	մ ³	1.1
4.	Ավազի լիցք խողովակի վրա 660 մմ շերտով	մ ³	7.3
5.	Խճի շերտի տոփանում 150 մմ հաստ.	մ ³	1.7
6.	Ասֆալտի շերտի իրականացում 6սմ հաստ.	մ ²	14.0
7.	Ասֆալտի շերտի իրականացում 3սմ հաստ.	մ ²	14.0
8.	Փ90x8.2 մմ, 16 մթն ճնշմ. պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	գծմ	180
9.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	10
10.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի փական	հատ	10
11.	Փ32մմ խողովակի զողում Փ125 պոլիէթ. խողովակի խցափակում	տեղ	1
12.	Փ160x14.6 մմ, 16 մթն ճնշմ. պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	գծմ	600
13.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	53
14.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի փական	հատ	53
15.	Փ32մմ խողովակի զողում Փ160 պոլիէթ. խողովակի խցափակում	տեղ	2

ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԿ ՀՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
	ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀՈՐ	31 հատ	
1.	Դիտահորի նիշերի վերակառուցում	մ ³	0.15
2.	Դիտահորի երկաթբետոնե կափարիչ՝ 1200x1200մմ	հատ	1.0
	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1.	Գրունտի փորում ձեռքով դատարկման հորի համար	մ ³	1,872
2.	Գրունտի ետլիցք և փռում տեղում	մ ³	1,872

N/N	Էլեմենտի անվանումը	Քանակը.	Քանակը.
	<u>ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Բուսահողի բարձուն ավտոմեքենայի վրա էկսկավատորով	62.45 մ ³	
2.	Բուսահողի ներկրում 35 կմ ից	87.4 տն	
3.	Բուսահողի փոում 20 սմ հաստությամբ	624.5 մ ²	
4.	Գազոնի սերմի ցանում	624.5 մ ²	
5.	Կոճղերի հանում 32 սմ հաստությունից ավել	5 հատ	
6.	Արմատների և կոճղերի հատվածների հետիլցք տոփանումով		1 մ ³

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՆԻՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՍԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂԱՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՍԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻՑ-ԱԳԱԹԱՆԳԵՂԱՍ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ԱՆ	75	77	«ԹՈՒՌՆԻՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱԽԵԹՅԱՆ								

ԽՈՐԵՆԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N/N	Էլեմենտի անվանումը	Քանակը.	Քանակը.
	<u>ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Բետոնե սալահատակի քանդում	2983.3 մ ²	119.3 մ ³
2.	Ավազախճային հիմնատակի քանդում ձեռքով		149.1 մ ³
3.	Մայթերի ասֆալտբետոնյա շերտի քանդում	4471.4 մ ²	134.1 մ ³
4.	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում / բետոնե հիմքով /	4941.4 գծմ	
5.	Բազալտե սալերի ապամոնտաժում հատակից 30 մմ	1889.0 մ ²	
6.	Նստարանների ու աղբամանների ապամոնտաժում	15 հատ	
7.	Հին մետաղական բազրիքների քանդում	150 գծմ	
8.	Հին փայտե բազրիքների քանդում՝ 300 գծմ	230 գծմ	
9.	Դիտահորերի ծածկոցների քանդում	95 հատ	28,7 մ ³
10.	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ա/մ մեխանիզմով և հեռացում 13.0 կմ	1744.3 տն	
	<u>ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Հիմքերի փորում բազալտե՝ 150*300մմ եզրաքարերի համար		46,2 մ ³
2.	Բազալտե՝ 150*300 մմ եզրաքարերի տեղադրում / բետոնե հիմքով Բ15 /	2543,9 գծմ	
3.	Հիմքերի փորում բազալտե՝ 100*200մմ եզրաքարերի համար		9,4 մ ³
4.	Բազալտե՝ 100*200 մմ եզրաքարերի տեղադրում / բետոնե հիմքով Բ15 /	766,1 գծմ	
5.	Խճի նախաշերտի լիցք բազալտե սալիկների տակ /Եւարժա/՝ 100մմ, տոփանումով	9398,6 մ ²	939,86 մ ³
6.	Բազալտե մանրավազի տոփանում 50 մմ հաստությ. սալիկների /Եւարժա/ տակ	9398,6 մ ²	469,93 մ ³
7.	Բազալտե սալիկների տեղադրում / Եւարժա / 300*300*50մմ, արտաքին մակերեսը չսահող	8807 մ ²	
8.	Բազալտե սալիկների տեղադրում / Եւարժա / 300*300*100մմ, արտաքին մակերեսը չսահող	591,6 մ ²	
9.	Շոշափողական տակտիլի տեղադրում	90 մ ²	
10.	Ծառերի բներում ցինակապատ ճաղավանդակի տեղադրում		120 հատ
11.	Ասֆալտի շերտի իրականացում եզրաքարի և փողոցի միջև 30 մմ հաստ.	1655 մ ²	
12.	Ջրահեռացման անձրևատարի կառուցում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ. երկայնական ակոսով	395,5 մ ²	
13.	Մետաղական սյան տեղադրում 900հ, ք.1800մմ / բետոնե հիմքով Բ15 /	60 հատ	

ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԿ ՀՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
	ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀՈՐ	95 հատ	
1.	Դիտահորի նիշերի վերակառուցում	մ ³	0.15
2.	Դիտահորի երկաթբետոնե կափարիչ՝ 1200x1200մմ	հատ	1.0
	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1.	Գրունտի փորում ձեռքով դատարկման հորի համար	մ ³	1,872
2.	Գրունտի ետլիցք և փռում տեղում	մ ³	1,872

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>		
1.	Ասֆալտբետոնյա շերտի կտրում	գծմ	1554
2.	Ասֆալտբետոնյա շերտի քանդում	մ ³	273,8
3.	Խճի շերտի քանդում 150մմ	մ ³	49,35
4.	Գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում՝ կողլից	մ ³	95,7
5.	Գրունտի քանդում էկսկավ-վ խրամուղում՝ կողլից	մ ³	141,1
6.	Ավելորդ հողի և շին աղբի բարձում ա/մ և տեղափոխում 13կմ	տն	783.93
	<u>Վերականգնման աշխատանքներ</u>		
1.	Ավազի բարձիկի լիցք՝ 100 մմ շերտով	մ ³	30.4
2.	Ավազի լիցք խողովակի վրա 200 մմ շերտով	մ ³	60.8
3.	Ավազի բարձիկի լիցք՝ 100 մմ շերտով	մ ³	1.1
4.	Ավազի լիցք խողովակի վրա 660 մմ շերտով	մ ³	7.3
5.	Խճի շերտի տոփանում 150 մմ հաստ.	մ ³	1.7
6.	Ասֆալտի շերտի իրականացում 6սմ հաստ.	մ ²	14.0
7.	Ասֆալտի շերտի իրականացում 3սմ հաստ.	մ ²	14.0
8.	Փ90x8.2 մմ, 16 մթն ճնշմ. պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	գծմ	820
9.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	10
10.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի փական	հատ	10
11.	Փ32մմ խողովակի զոդում Փ125 պոլիէթ. խողովակի խցափակում	տեղ	1
12.	Փ110x10.0 մմ, 16 մթն ճնշմ. պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	գծմ	820
13.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	53
14.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի փական	հատ	53
15.	Փ32մմ խողովակի զոդում Փ160 պոլիէթ. խողովակի խցափակում	տեղ	2
16.	Փ114x3.0 մմ պողպատե խողովակի տեղադրում	գծմ	200
17.	Փ127x3.0 մմ պողպատե խողովակի տեղադրում	գծմ	200

N/N	Էլեմենտի անվանումը	Քանակը.	Քանակը.
	<u>ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Բուսահողի բարձրում ավտոմեքենայի վրա էկսկավատորով	93,95 մ ³	
2.	Բուսահողի ներկրում 35 կմ ից	131,53 տն	
3.	Բուսահողի փռում 20 սմ հաստությամբ	939,5 մ ²	
4.	Գազոնի սերմի ցանում	939,5 մ ²	
5.	Կոճղերի հանում 32 սմ հաստությունից ավել	15 հատ	
6.	Արմատների և կոճղերի հատվածների հետիցք տոփանումով		3 մ ³

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՜ՆԻ՝«ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՌՈՒՆՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԾԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԽՈՐԵՆԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ԱՆ	76	77	«ԹՈՒՌՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ								

ԱՄԻՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

N/N	Էլեմենտի անվանումը	Քանակը.	Քանակը.
	<u>ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Բետոնե սալահատակի քանդում	4253.3 մ ²	170.1 մ ³
2.	Ավազախճային հիմնատակի քանդում ձեռքով		559.7 մ ³
3.	Մայթերի ասֆալտբետոնյա շերտի քանդում	892,3 մ ²	26,8 մ ³
4.	Ճանապարհի ասֆալտբետոնյա շերտի քանդում	884,5 մ ²	79,6 մ ³
5.	Ասֆալտի կտրում	344,7 գծմ	
6.	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում / բետոնե հիմքով /	1970.5 գծմ	
7.	Բազալտե սալերի ապամոնտաժում հատակից 30 մմ	280.1 մ ²	
8.	Նստարանների ու աղբամանների ապամոնտաժում	23 հատ	
9.	Հին մետաղական բազրիքների քանդում	100 գծմ	
10.	Հին փայտե բազրիքների քանդում՝ 300 գծմ	100 գծմ	
11.	Դիտահորերի ծածկոցների քանդում	70 հատ	15.12 մ ³
12.	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ա/մ մեխանիզմով և հեռացում 13.0 կմ	1681.1 տն	
	<u>ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Խճի նախաշերտի լիցք բազալտե սալիկների տակ /Եузарда/ 100մմ, տոփանումով	535.4 մ ²	53.54 մ ³
2.	Բազալտե մանրավազի տոփանում 50 մմ հաստությ. սալիկների /տուֆե/ տակ	535.4 մ ²	26.77 մ ³
3.	Տուֆե սալիկների տեղադրում 150*150*100մմ	535.4 մ ²	53.54 մ ³
4.	Խճի նախաշերտի լիցք տուֆե սալիկների տակ՝ 100մմ, տոփանումով	5775 մ ²	577,5 մ ³
5.	Բազալտե մանրավազի տոփանում 50 մմ հաստությ. տուֆից սալիկների տակ	5775 մ ²	288.8 մ ³
6.	Տուֆե սալիկների տեղադրում 150*150*50 մմ	5775 մ ²	
7.	Տուֆե՝ 150*300 մմ եզրաքարերի տեղադրում / բետոնե հիմքով Բ15 /	1340,0 գծմ	
8.	Հիմքերի փորում բազալտե՝ 150*300մմ եզրաքարերի տակ		20 մ ³
9.	Տուֆե՝ 100*200 մմ եզրաքարերի տեղադրում / բետոնե հիմքով Բ15 /	630,5 գծմ	
10.	Հիմքերի փորում բազալտե՝ 100*200մմ եզրաքարերի տակ		4,0 մ ³
11.	Շոշափողական տակտիլի տեղադրում	50 մ ²	
12.	Ծառերի բներում ցինակապատ ճաղավանդակի տեղադրում		62 հատ
13.	30մմ բազալտե սալիկների կառուցում թեքահարթակի համար	40 մ ²	
14.	Բոնաձողի տեղադրում		50 գծմ
15.	Ասֆալտի շերտի իրականացում եզրաքարի և փողոցի միջև 30 մմ հաստ.	670,0 մ ²	
16.	Ջրահեռացման անձրևատարի կառուցում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ. երկայնական ակոսով	174,5 մ ²	

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Ս	ՔԱՆԱԿ
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>		
1.	Ասֆալտբետոնյա շերտի կտրում	գծմ	310
2.	Ասֆալտբետոնյա շերտի քանդում	մ ³	195,3
3.	Խճի շերտի քանդում 150մմ	մ ³	32,55
4.	Գրունտի քանդում ձեռքով խրամուղում՝ կողլից	մ ³	159,0
5.	Գրունտի քանդում էկսկավ-վ խրամուղում՝ կողլից	մ ³	371,0
6.	Ավելորդ հողի և շին աղբի բարձում ա/մ և տեղափոխում 13կմ	տն	757.9
	<u>Վերականգնման աշխատանքներ</u>		
1.	Ավազի բարձիկի լիցք՝ 100 մմ շերտով	մ ³	62,8
2.	Ավազի լիցք խողովակի վրա 200 մմ շերտով	մ ³	125,6
3.	Ավազի բարձիկի լիցք՝ 100 մմ շերտով	մ ³	17,0
4.	Ավազի լիցք խողովակի վրա 660 մմ շերտով	մ ³	112,5
5.	Խճի շերտի տոփանում 150 մմ հաստ.	մ ³	25,6
6.	Ասֆալտի շերտի իրականացում 6սմ հաստ.	մ ²	217,0
7.	Ասֆալտի շերտի իրականացում 3սմ հաստ.	մ ²	217,0
8.	Փ110x10,0 մմ, 16 մթն ճնշմ. պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	գծմ	620
9.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	74
10.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի փական	հատ	74
11.	Փ32մմ խողովակի զոդում Փ110 պոլիէթ. խողովակի խցափակում	տեղ	3
12.	Փ160x14.6 մմ, 16 մթն ճնշմ. պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	գծմ	720,0
13.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	47
14.	Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակի փական	հատ	47
15.	Փ32մմ խողովակի զոդում Փ90 պոլիէթ. խողովակի խցափակում	տեղ	2
16.	Փ32x3.0 մմ, 16 մթն ճնշմ. պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	գծմ	100,0
17.	Փ127x3.0 մմ պողպատե խողովակի տեղադրում	գծմ	164,0
18.	Փ219x3.0 մմ պողպատե խողովակի տեղադրում	գծմ	164,0

ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԿ ՀՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
	ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀՈՐ	70,0 հատ	
1.	Դիտահորի նիշերի վերակառուցում	մ ³	0.15
2.	Դիտահորի երկաթբետոնե կափարիչ՝ 1200x1200մմ	հատ	1.0
	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1.	Գրունտի փորում ձեռքով դատարկման հորի համար	մ ³	1,872
2.	Գրունտի ետլիցք և փռում տեղում	մ ³	1,872

N/N	Էլեմենտի անվանումը	Քանակը.	Քանակը.
	<u>ՔԱՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</u>		
1.	Բուսահողի բարձում ավտոմեքենայի վրա էկսկավատորով	57,6 մ ³	
2.	Բուսահողի ներկրում 35 կմ ից	80,6 տն	
3.	Բուսահողի փռում 20 սմ հաստությամբ	576,0 մ ²	
4.	Գազոնի սերմի ցանում	576,0 մ ²	
5.	Կոճղերի հանում 32 սմ հաստությունից ավել	10 հատ	
6.	Արմատների և կոճղերի հատվածների հետլիցք տոփանումով		2 մ ³

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԹՈՒՈՒՆԻՑ		ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ ԵՎ ԽՈՐԵՆԱՑԻ, ԱՄԻՐՅԱՆ Փ. ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԱՄԻՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՅԹԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ԱՆ	77	77	«ԹՈՒՈՒՆԻՑ ՓՐՈԶԵԺԹ» ՍՊԸ	
ՆԳՃ	Հ. ԲԱԲԱՅԱՆ								
ՆԳԿ	Հ. ՀՈՎԱԵԹՅԱՆ								
