

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՏԿՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2017/12**

«23» հոկտեմբերի 2017թ.

ք. Երևան

«Վ» տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Է. Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված S-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են «Վ» օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2017թ.-ին նախատեսված աշխատանքների համար սույն թվականի դեկտեմբերի 15-ը, իսկ մնացած աշխատանքները կիրականացվեն համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ «Վ» օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 75 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալառուի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 2.1 Հավելվածում:

3.4.10 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման համաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

#### **5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆՆ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 141 099 000 (մեկ հարյուր քառասունմեկ միլիոն իննսունինը հազար) ՀՀ դրամ, որից 23 516 500 (քսաներեք միլիոն հինգ հարյուր տասնվեց հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է:

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է:

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

#### **6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

#### **7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը

շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 2.1, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները՝ կազմված 12 էջից, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

### 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Ստրանսպորտի և կապի նախարարություն  
ք. Երևան, Նալբանդյան 28  
Կենտրոնական Գանձապետարան  
Հ/Հ 900011004901  
ՀՎՀՀ 025655618



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ  
ք. Սիսիան, Խանջյան 2  
«Կոնվեյթսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1930011791110100  
ՀՎՀՀ 09862793

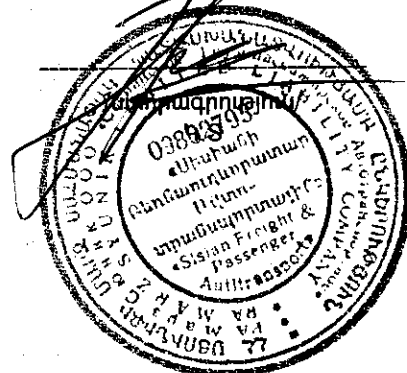

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ**

**S-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների (ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ)**

«Ղ դրամ»

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>1. Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Գոյություն ունեցող քայքայված ե/բ 30x34սմ վաբերի քանդում	մ <sup>3</sup>	10.56	23 433	247 452
2	Գոյություն ունեցող հենապատի բետոնե մասերի քանդում	մ <sup>3</sup>	33.20	27 218	903 638
3	Շինաղբի բարձում էրակավատրով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ <sup>3</sup>	43.76	651	28 488
4	Շին. աղբի տեղափոխում 2 կմ /դեպի լցակայան/	տն	87.52	1 388	121 478
<b>Ընդամենը 1.</b>					<b>1 301 056</b>
<b>2. Ճանապարհային պատվածք</b>					
1	Գոյ. ունեցող ա/բ պատվածքի վերաօգտագործում սառը վերամշակման(CR) եղանակով h=20սմ ցեմենտի ավելացումով 1մ <sup>2</sup> -16 կգ.	մ <sup>2</sup>	5 610	3 040	17 054 400
2	Միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի իրականացում h=5սմ	մ <sup>2</sup>	5 776	6 818	39 380 768
3	խճային շերտ h= 12 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	166	1 806	299 796
4	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ <sup>2</sup> /	տն	0.68392	319 138	218 265
5	Հիմքի փոշեգրկում և բիտումի էնուլսիայի տարածում 1մ <sup>2</sup> -0.6կգ	մ <sup>2</sup>	5 610	260	1 458 600
<b>Ընդամենը 2.</b>					<b>58 411 829</b>
<b>3. Կողնակի իրականացում</b>					
1	III կարգի ցամաքորդային բնահողի մշակում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինք	մ <sup>3</sup>	355.81	651	231 632
2	Բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ լիցք	տն	640.46	1 983	1 270 032
3	Կողնակների հարթեցում	մ <sup>2</sup>	2 093	306	640 458
4	Բնահողի խտացում գլլրոնով 25տ քաշով ճանցումով 1 հետքի վրայով	մ <sup>3</sup>	355.81	311	110 657

5	Բնահողի ջրում	մ <sup>3</sup>	355.81	348	123 822
<b>Ընդամենը 3.</b>					<b>2 376 601</b>
<b>4. Ուղիներ և մուտքեր</b>					
1	Խճային շերտ h= 12 սմ հաստությամբ բիտումֆիտարածումով 4.12տ /1000մ <sup>2</sup> /	մ <sup>2</sup>	1 138	1 806	2 055 228
2	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ <sup>2</sup> /	տն	4.69	319 138	1 496 298
3	Միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի իրականացում h-5սմ	մ <sup>2</sup>	1 138	6 819	7 760 022
4	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10 սմ	մ <sup>3</sup>	1.56	4 792	7 475
5	D=325մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	զծ.մ	17	26 610	452 370
6	Գլխամասի իրանի միաձույլ բետոն B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	4.20	122 000	512 400
7	D=325մմ մետ. խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	15.71	1 830	28 749
8	Մետ. խողովակի գլխամասի բետոնի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	12.00	1 226	14 712
9	D=530մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	զծ.մ	18	84 377	1 518 782
10	D=530մմ մետ. խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	27.29	1 830	49 941
11	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=16 սմ	մ <sup>3</sup>	11.68	4 792	55 965
12	D=530մմ մետաղական կիսախողովակի տեղադրում	զծ.մ	131.00	37 626	4 929 006
13	D=530մմ մետաղական կիսախողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	109.00	1 830	199 470
4	Մետ. Ցանցի կառուցում և տեղադրում	տն	3.73	1 054 250	3 932 353
<b>Ընդամենը 4.</b>					<b>19 080 418</b>
<b>5. Մետաղական կիսախողովակ d = 530մմ</b>					
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h-16սմ	մ <sup>3</sup>	53.13	4 792	254 573
2	D=530մմ մետաղական կիսախողովակի տեղադրում	զծ.մ	718.00	37 626	27 015 468
3	D=530մմ կիսախողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	588.97	1 830	1 077 604
<b>Ընդամենը 5.</b>					<b>28 347 645</b>
<b>6 Հենապատի կառուցում</b>					
1	Ցվ III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ի մեքենաների վրա	մ <sup>3</sup>	300	651	195 335
2	Ցվ III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և	մ <sup>3</sup>	80	4 987	398 945

3	Տեղափոխում 2կմ հեռ, վրա	տն	684	1 388	949 451
4	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=20 սմ	մ <sup>3</sup>	34	4 792	162 911
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարեբետոնիցբետոն B-20 դասի քար 20%/ըստ նախագծի/	մ <sup>3</sup>	159.33	76 837	12 242 512
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամքարեբետոնիցբետոն B-20 քար 20%/ըստ նախագծի/	մ <sup>3</sup>	129.87	78 447	10 187 896
7	ձեռնապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	զծ.մ	140.00	12 651	1 771 080
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում ՊՎԶ տիպի խողովակ d=100սմ	զծ.մ	42	2 951	123 930
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	239.64	1 226	293 893
10	8վ III գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ <sup>3</sup>	57	651	37 114
11	Տեղափոխում 2կմ-ից /հետլիցքի համար/	տն	96.90	1 388	134 505
12	8վ III գրունտի հետադարձ լիցք ձեռքով /բերովի գրունտով/	մ <sup>3</sup>	7	1 407	9 851
13	8վ III գրունտի հետադարձ լիցք բուլդոզերով 20մ գրունտի տեղափոխումով /բերովի գրունտով/	մ <sup>3</sup>	50	262	13 088

**Ընդամենը 7.** 26 520 513

**7. Ե/բ վաքեր**

1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10 սմ	մ <sup>3</sup>	8.4	5 893	49 442
2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34սմ չափերի	մ <sup>3</sup>	10.32	275 000	2 838 000
3	Վաքերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	մ <sup>3</sup>	162.54	1 226	199 274

**Ընդամենը 8.** 3 086 716

**8 Կահավորման աշխատանքներ**

1	Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	19	83 555	1 587 540
2	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- /զծ1,1/	կմ	0.148	140 861	20 847
3	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.2մ լայ- /զծ1,2,1/	կմ	1.40	249 598	349 438
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:2) 0.1մ /զծ1,8/	կմ	0.14	59 308	8 303
5	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ/զծ.1,5/	կմ	0.538	59 308	31 908
6	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1)0.1մ /զծ.1,6/	կմ	0.16	113 677	18 643

**Ընդամենը 9.** 2 016 679

**Ընդհանուրը** 141 141 451

\*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ**

**S-1-21, U-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների (2017 թ.)**

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
<b>1. Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Գոյություն ունեցող քայքայված ե/ք 30x34սմ վաքերի քանդում	մ <sup>3</sup>	10.56	23 433	247 452
2	Գոյություն ունեցող հենապատի բետոնե մասերի քանդում	մ <sup>3</sup>	33.20	27 218	903 638
3	Շինարարի բարձում էրկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ <sup>3</sup>	43.76	651	28 488
4	Շին. աղբի տեղափոխում 2 կմ /դեպի լցակայան/	տն	87.52	1 388	121 478
<b>Ընդամենը 1.</b>					<b>1 301 056</b>
<b>2. Ճանապարհային պատվածք</b>					
1	Գոյ. ունեցող ա/ք պատվածքի վերաօգտագործում սառը վերամշակման(CR) եղանակով h=20սմ ցեմենտի ավելացումով 1մ <sup>2</sup> -16 կգ.	մ <sup>2</sup>	4 591	3 040	13 956 640
2	Միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի իրականացում h=5սմ	մ <sup>2</sup>	4 753	6 818	32 405 954
3	խճային շերտ h= 12 սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	166	1 806	299 796
4	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ <sup>2</sup> /	տն	0.68392	319 138	218 265
5	Հիմքի փոշեգրկում և բիտումի էմուլսիայի տարածում 1մ <sup>2</sup> -0.6կգ	մ <sup>2</sup>	4 591	260	1 193 660
<b>Ընդամենը 2.</b>					<b>48 074 315</b>
<b>3. Ուղիներ և մուտքեր</b>					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10 սմ	մ <sup>3</sup>	1.56	4 792	7 475
2	D=325սմ մետաղական խողովակի տեղադրում	գծ.մ	17	26 610	452 370
3	Գլխամասի իրանի միաձույլ բետոն B-20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	4.20	122 000	512 400
4	D=325սմ մետ. խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	15.71	1 830	28 749
5	Մետ. խողովակի գլխամասի բետոնի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	12.00	1 226	14 712
<b>Ընդամենը 3.</b>					<b>1 015 706</b>
<b>4 Հենապատի կառուցում</b>					

1	Տվ III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ի մեքենաների վրա	մ <sup>3</sup>	300	651	195 335
2	Տվ III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով ,բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և	մ <sup>3</sup>	80	4 987	398 945
3	Տեղափոխում 2կմ հեռ, վրա	տն	684	1 388	949 451
4	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=20 սմ	մ <sup>3</sup>	34	4 792	162 911
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամբարեբետոնից բետոն B-20 դասի քար 20% /ըստ նախագծի/	մ <sup>3</sup>	159.33	76 837	12 242 512
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամբարեբետոնից բետոն B-20 քար 20% /ըստ նախագծի/	մ <sup>3</sup>	129.87	78 447	10 187 896
7	Հետնապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	գծ.մ	140.00	12 651	1 771 080
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում ՊՎՔ տիպի խողովակ d=100մմ	գծ.մ	42	2 951	123 930
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ <sup>2</sup>	239.64	1 226	293 893
10	Տվ III գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ <sup>3</sup>	57	651	37 114
11	Տեղափոխում 2կմ-ից /հետլիցքի համար/	տն	96.90	1 388	134 505
12	Տվ III գրունտի հետադարձ լիցք ձեռքով /բերովի գրունտով/	մ <sup>3</sup>	7	1 407	9 851
13	Տվ III գրունտի հետադարձ լիցք բուլդոզերով 20մ գրունտի տեղափոխումով /բերովի գրունտով/	մ <sup>3</sup>	50	262	13 088
<b>Ընդամենը 4.</b>					<b>26 520 513</b>
<b>5. Ե/բ վաքեր</b>					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10 սմ	մ <sup>3</sup>	8.4	5 893	49 442
2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34սմ չափերի	մ <sup>3</sup>	10.32	275 000	2 838 000
3	Վաքերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	մ <sup>3</sup>	162.54	1 226	199 274
<b>Ընդամենը 5.</b>					<b>3 086 716</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>79 998 300</b>
<i>*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.</i>					


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նալբանդյան 28  
 Կենտրոնական Գանձապետարան  
 Հ/Հ 900011004901  
 Հ/ՀՀՀ 02565518

*Արմենյան*  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ**

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ  
 ք. Սիսիան, Խանջյան 2  
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 193001179110100  
 Հ/ՀՀՀ 09502793



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**S-1-21, U-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ ավրոճանապարհի Քուչակ գյուղի փարածքում 850 մ երկարությամբ հարվածի ասֆալտապարման աշխատանքների (2017 թ.)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	30.10.2017թ.
2	Հենապատի կառուցում	30.10.2017թ.	15.11.2017թ.
3	Մետաղական կիսախողովակ d = 530մմ	05.11.2017թ.	15.11.2017թ.
4	Ե/բ վաքեր	10.11.2017թ.	30.11.2017թ.
5	Ճանապարհային ծածկ	15.11.2017թ.	15.12.2017թ.
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (2017թ.)</b>		<b>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո</b>	<b>15.12.2017թ.</b>

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**S-1-21, U-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ ավրոճանապարհի Քուչակ գյուղի փարածքում 850 մ երկարությամբ հարվածի ասֆալտապարման աշխատանքների (2018թ. ֆինանսական միջոցներ տրամադրելուց հետո)**

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 10օր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 20օր
2	Հենապատի կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 20օր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 50օր
3	Մետաղական կիսախողովակ d = 530մմ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 25օր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 35օր
4	Ե/բ վաքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 30օր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 60օր
5	Ուղիներ և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 40օր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 50օր
6	Ճանապարհային ծածկ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 60օր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 75օր

7	Կողնակների իրականացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 70օր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 85օր
8	Ճանապարհի կահավորում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 85օր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 90օր
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո 90օր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**


«Սիսիանի ԲՈՒՏ» ՍՊԸ  
 ք. Երևան, Նալբանդյան 28  
 Կենտրոնական Գանձապետարան  
 Հ/Կ 900011004901  
 ՀՎՀՀ 02565518

*[Handwritten signature]*

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Սիսիանի ԲՈՒՏ» ՍՊԸ  
 ք. Սիսիան, Խանջյան 2  
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Կ 1930011791110100  
 ՀՎՀՀ 09802793



### Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետներ

Ճանապարհային աշխատանքների ծառայության երաշխիքային ժամկետը հաշվառվում է ավտոճանապարհը պատվիրատուին հանձնման պահից սկսած:

Ճանապարհային պատվածքի, կամուրջների, ազդանշանային սյուների, նշագծման և այլնի ծառայության երաշխիքային ժամկետներն հետևյալն են

- Ճանապարհային հագուստի հիմքի համար - 15տարի
- Պատվածքի ստորին շերտի համար - 10տարի
- Պատվածքի վերին շերտի համար - 7տարի:

Թերությունների ի հայտ գալու դեպքում, երաշխիքային ժամկետը, տարրի կամ կառույցի որոշ մասի համար, նշանակվում է նորից, թերությունների վերացման պահից սկսած:

Թերությունների վերացման համար ծախսված ժամանակը հաշվի չի առնվում:


#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ստանսպորտի և կապի նախարարություն»  
ք. Երևան, Նալբանդյան 28  
Կենտրոնական Գանձապետարան  
Հ/Հ 900011004901  
ՀՎՀՀ 02565518

/ստորագրություն/  
Կ.Տ

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ  
ք. Սիսիան, Խանջյան 2  
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1930011791110100  
ՀՎՀՀ 09802793



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Որամ»

		Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
1	45231177/19	S-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 974 239	79 974 239	79 974 239	79 974 239

**ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ**


«Որամ» տրանսպորտի և կապի նախարարություն  
 ք. Երևան, Նալբանդյան 28  
 Կենտրոնական Գանձապետարան  
 Հ/Կ 900011004901  
 ՀՎՀՀ 02565518

/ստորագրություն/  
 Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ  
 ք. Սիսիան, Խանջյան 2  
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Կ 1930011791110100  
 ՀՎՀՀ 09802793

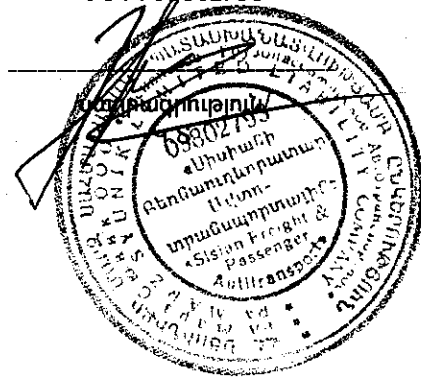

**Պայմանագրի կողմ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**Պատվիրատու**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_

հհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՄԱՆ**

«        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «        » «        » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման մեղադրանքը «        » «        » 20 թ. կազմված գնման հաստի նախագծած ներկայացուցիչ N \_\_\_\_\_ եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքի					
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

**Աշխատանքը հանձնեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

**Աշխատանքն ընդունեց**

\_\_\_\_\_

ստորագրություն

\_\_\_\_\_

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը \_\_\_\_\_ պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուին 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման  
 նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**  
 հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

« 20 » 10 2017

N: COP/PO 75

**Բենեֆիցիար**  
«ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն»  
«ՀՀ ք. Երևան, Նալբանդյան 28»

## ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

1. Սույն բանկային երաշխիքը /այսուհետ՝ Երաշխիք/ հանդիսանում է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության /այսուհետ՝ Բենեֆիցիար/ և Սիսիանի ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ-ի /այսուհետ՝ Պրինցիպալ/ միջև կնքվելիք N ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2017/12 «ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ» Բենեֆիցիարի հանդեպ Պրինցիպալի ստանձնած պարտավորությունների ապահովում:
2. Երաշխիքով «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ն /այսուհետև՝ Բանկ/ պարտավորվում է Բենեֆիցիարի կողմից Երաշխիքի 3-րդ կետով սահմանված ժամկետում ներկայացված գրավոր պահանջով /այսուհետև՝ Պահանջ/ վերջինիս վճարել մինչև 8,000,000 /ուրժ միլիոն/ ՀՀ դրամ գումար /այսուհետև՝ Երաշխիքի գումար/ Պահանջը ստանալու պահից 3 /երեք/ բանկային օրվա ընթացքում:
3. Երաշխիքը գործում է 20.10.2017թ.-ից մինչև 05.02.2018թ.-ը ներառյալ:
4. Բանկն իրավունք ունի մերժել Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե Երաշխիքը դադարել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:
5. Երաշխիքի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառելի է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

Վարկային գործառնությունների բաժնի պատասխանատու Ինեսա Կազարովա



Կատարող՝ Գ.Մովսեսյան  
հեռ.՝ 55 14 67

73839
