

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
№ «ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01»**

ք.երևան

«10» «07» 2018թ.

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Հ.Հովհաննիսյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Քոչարյանի, որը գործում է «Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

- 1.1. Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել Պայմանագրի Հավելված №1-ով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:
- 1.2. Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան: Պայմանագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների կատարման նպատակով անտառափայտման տոմսերի կամ սանիտարական և խնամքի հատման թույլտվություն տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Պատվիրատուի իրավական ակտով կամ հանձնարարականով:
- 1.3. Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետները (ներառյալ կողմերի կողմից համաձայնեցված Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները) որոշվում են օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված №2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

- 2.1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի «ՀՀ 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Սևանա լճի անտառափայտնկարկների մաքրման առանձին գործողությունների նորմաները հաստատելու մասին» N 809-Ն որոշումը՝ պայմանագրի գործողության ընթացքում աշխատանքների կատարման որակի բարելավման և ինքնարժեքի իջեցման նպատակով, Պատվիրատուն ձեռնարկում է միջոցներ, որպեսզի Կապալառուին տրամադրվի «Վոթերմաստեր Կլասիկ III» ինքնագնաց բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատորը և դրան կցվող սարքավորումները (այսուհետև՝ Գույք):
- 2.2. Պայմանագրի 2.1 կետով նախատեսված Գույքի օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Գույքը տնօրինողի և Կապալառուի միջև կնքվող առանձին պայմանագրով և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի «ՀՀ 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Սևանա լճի անտառափայտնկարկների մաքրման առանձին գործողությունների նորմաները հաստատելու մասին» N 809-Ն որոշմամբ սահմանված կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալները:
- 2.3. Աշխատանքների ամբողջ ծավալի կատարման համար Կապալառուն ապահովում է պահանջվող տեխնիկական մյուս միջոցները և աշխատանքների պատշաճ իրականացման համար նյութերը:
- 2.4. Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

- 3.1.1. Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
- 3.1.2. Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:
- 3.1.3. Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ «՝ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:
- 3.1.4. Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
  - ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
  - բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
  - գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
  - դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.
- 3.1.5. Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:
- 3.1.6. Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.
- 3.1.7. Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

#### 3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

- 3.2.1. Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.
- 3.2.2. Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.
- 3.2.3. Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.
- 3.2.4. Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:
- 3.2.5. Ձեռնարկել միջոցներ Պայմանագրի 2.1 կետով նախատեսված Գույքը Կապալառուին տրամադրման համար:

#### 3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

- 3.3.1. Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:
- 3.3.2. Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:
- 3.3.3. Պատվիրատուից պահանջել ձեռնարկելու համապատասխան միջոցներ Պայմանագրի 2.1 կետով նախատեսված Գույքն իրեն տրամադրելու համար:

#### 3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

- 3.4.1. Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:
- 3.4.2. Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:



- 3.4.3. Պայմանագրով նախատեսված մաքրման աշխատանքների արդյունքում գոյացած փայտանյութը (շինափայտ, վառելափայտ, օսի) կատարողը հանձնում է «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ին՝ նրա հետ հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
- 3.4.4. Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:
- 3.4.5. Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:
- 3.4.6. Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:
- 3.4.7. Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:
- 3.4.8. Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

- 4.1. Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:  
Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված №4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (Հավելված №4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):
- 4.2. Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:
- 4.3. Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:
- 4.4. Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:
- 4.5. Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին

չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

- 4.6. Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝
- 1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի կողմից ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.
  - 2) Կապալառուի կողմից կատարված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ ընդունող հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.
  - 3) մինչև ավարտված աշխատանքների ընդունումը՝ ընդունող հանձնաժողովը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված աշխատանքները և կազմում ակտ.
  - 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝
    - ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը,
    - բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.
  - 5) մինչև Պայմանագրի 4.6 կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

- 5.1. Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **568 200 000 (հինգ հարյուր վաթսուութ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 94 700 000 (իննսուներս միլիոն յոթ հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝  
2018 թվականի համար՝ **113 823 249 (մեկ հարյուր տասներեք միլիոն ութ հարյուր քսաներեք հազար երկու հարյուր քառասունինը) ՀՀ դրամ՝ որից 18 970 541 (տասնութ միլիոն ինը հարյուր յոթանասուն հազար հինգ հարյուր քառասունմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:**  
2019 թվականի համար՝ **113 580 843 (մեկ հարյուր տասներեք միլիոն հինգ հարյուր ութանասուն հազար ութ հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամ՝ որից 18 930 141 (տասնութ միլիոն ինը հարյուր երեսուն հազար հարյուր քառասունմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:**  
2020 թվականի համար՝ **113 574 235 (մեկ հարյուր տասներեք միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներս հազար երկու հարյուր երեսունհինգ) ՀՀ դրամ՝ որից 18 929 039 (տասնութ միլիոն ինը հարյուր քսանինը հազար երեսունինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:**  
2021 թվականի համար՝ **113 645 160 (մեկ հարյուր տասներեք միլիոն վեց հարյուր քառասունհինգ հազար հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ՝ որից 18 940 860 (տասնութ միլիոն ինը հարյուր քառասուն հազար ութ հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:**  
2022 թվականի համար՝ **113 576 513 (մեկ հարյուր տասներեք միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունվեց հազար հինգ հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամ՝ որից 18 929 419 (տասնութ միլիոն ինը հարյուր քսանինը հազար չորս հարյուր տասնինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:**
- 5.2. Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:
- 5.3. Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (Հավելված N°3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը:

- 5.3.1. Պայմանագրի 8.13 կետով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքների կատարման համար կնքված համաձայնագրով նախատեսվող վճարման ժամանակացույցով:
- 5.4. Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝  
 ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված համապատասխան տարվա գինն է.  
 ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.  
 ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.  
 Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.  
 ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

- 6.1. Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և Պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:
- 6.2. Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 6.3. Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով<sup>1</sup>:
- 6.4. Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:
- 6.5. Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:
- 6.6. Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 6.7. Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 8.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:  
 Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:
- 8.2. Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված

<sup>1</sup> Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում ստանալով հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հարկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

- 8.3. Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:
- 8.4. Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:
- 8.5. Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:
- Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
- 8.6. Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:
- 8.7. Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:
- Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:
- 8.8. Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:
- 8.9. Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:
- 8.10. Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 8.11. Պայմանագիրը կազմված է 7 (յոթ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Պայմանագրի հավելվածներ N<sup>o</sup>1-ը; 2-ը; 3-ը; 4-ը և 4.1-ը համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

- 8.12. Պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:
- 8.13. Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Հ բնապահպանության նախարարություն  
 ք.Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք  
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011007763  
 ՀՎՀՀ 02507198

«Հ բնապահպանության նախարարության  
 աշխատակազմի ղեկավար

**Հ.Հովհաննիսյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ  
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք.Ճամբարակ, Գարդմանի 6  
 «Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 115004674137  
 ՀՎՀՀ 08100179

«Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ի  
 տնօրեն

**Ա.Քոչարյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



*(Handwritten signatures)*

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ բնապահպանության նախարարության  
 աշխատակազմի ղեկավար

**Հ. Հովհաննիսյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ**

«Ճարտարապետական ճշգրտում» ԲԲԸ-ի  
 տնօրեն

**Ա. Քոչարյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ.


**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**


2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների  
 մաքրման աշխատանքների կատարման  
**2018 թվական**


(հազար դրամ)

ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի գինը	Ընդամենը
<b>Մարտունու մասնաճյուղի Երանոսի և Մարտունու տեղամասեր</b>					
1	Ճահճացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ թփերի, ծառերի և կոճղերի արմատախիլ անում T-170 ճահճագնաց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջին 200մ հեռավորության վրա/850x2+190խմ կոճղ/	հա	17.3	8.793	16619.33
		խտխմ	800 (1890)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	100	1.623	162.30
	Արմատային զանգվածի բարձում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	1890	1.037	1959.93
	Տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա	խտխմ	1890	0.733	1385.37
<b>Ընդամենը</b>			<b>17.3</b>		<b>20126.93</b>
2	Ցամաք տարածքում տրակտորով ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում/520խմX1,5+85խմ կոճղ/	հա	12.0	3.092	2674.58
		խտխմ	520* (865)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	100	1.623	162.30
	Ծառերի և թփերի արմատների ու փթած, նեխած զանգվածի հողախառնուրդի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	865	1.037	897.00
	Տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	865	0.910	787.40
<b>Ընդամենը</b>			<b>12.0</b>		<b>4521.28</b>
<b>Ընդամենը Երանոսի և Մարտունու տեղամասերում</b>			<b>29.3</b>		<b>24648.21</b>
<b>Նորատուսի մասնաճյուղի Նորատուսի տեղամաս</b>					
1	Ջրի մեջ թփերի, ծառերի և նախկին տարիների հատված կոճղերի արմատախիլ անում WATERMASTER CLASSIC III տրակտորով /խորությունը 1մ-ից ավելի/ և բարձում ПТС-М ինքնագնաց լաստի վրա / 100x1,5+50/	հա	4.0	8.012	1602.40
		խտխմ	100* (200)**		
	տեղափոխում ավտոմեքենայի բարձման տեղը, միջին 350մետր հեռավորության վրա	խտխմ	200	9.259	1851.84
	Փայտանյութի, ջախի և արմատային զանգվածի դատարկում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	200	0.802	160.40
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	50	1.623	81.15
	Փայտանյութի, ջախի և արմատների՝ փտած, նեխած զանգվածի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	200	1.037	207.40
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	200	0.440	88.00
<b>Ընդամենը</b>			<b>4.0</b>		<b>3991.19</b>
2	Ճահճացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ թփերի և ծառերի արմատախիլ անում T-170 ճահճագնաց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջին 200 հեռավորության վրա/620x2+90խմ կոճղ/	հա	12.2	8.793	11695.09
		խտխմ	620* (1330)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	200	1.623	324.60
	արմատային զանգվածի բարձում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	1330	1.037	1379.21
	Տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	1330	0.733	974.89
<b>Ընդամենը</b>			<b>12.2</b>		<b>14373.79</b>

3	Ցամաք տարածքում տրակտորով ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում/550լսմX1,5+45լսմ կոճղ/	հա	12.0	3.092	2690.04
		խտխմ	550* (870)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	150	1.623	243.45
	Ծառերի և թփերի արմատների ու փթած, նեխած զանգվածի հողախառնուրդի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	870	1.037	902.19
	Տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	870	0.733	637.71
<b>Ընդամենը</b>			<b>12.0</b>		<b>4473.39</b>
<b>Ընդամենը Նորագույնի տեղամասում</b>			<b>28.2</b>		<b>22838.37</b>
<b>Վարդենիսի մասնաճյուղի Վարդենիսի տեղամաս</b>					
1	Ջրի մեջ նախկին տարիներին հատված կոճղերի և առանձին թփերի արմատախիլ անում WATERMASTER CLASSIC III տրակտորով /խորությունը 1մ-ից ավելի/ և բարձում PTC-M ինքնազնաց լաստի վրա	հա	27.4	6.333	6966.30
		խտխմ	1100		
	տեղափոխում ափ մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջին 400մետր հեռավորության վրա	խտխմ	1100	10.582	11640.20
	Փայտանյութի, ջախի և արմատային զանգվածի դատարկում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	1100	0.802	882.20
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	100	1.623	162.30
	Փայտանյութի, ջախի և արմատների՝ փտած, նեխած զանգվածի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	1100	1.037	1140.70
	Տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	1100	0.733	806.30
<b>Ընդամենը</b>			<b>27.4</b>		<b>21598.00</b>
2	Ճահճացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ ծառերի և թփերի արմատախիլ անում T-170 ճահճազնաց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջին 250 հեռավորության վրա/210x2+55լսմ կոճղ/	հա	2.7	10.545	5008.68
		խտխմ	210* (475)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	120	1.623	194.76
	արմատային զանգվածի բարձում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	475	1.037	492.57
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	475	0.440	209.00
<b>Ընդամենը</b>			<b>2.7</b>		<b>5905.01</b>
3	Ցամաք տարածքում տրակտորով ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում/170լսմX1,5+45լսմ կոճղ/	հա	2.0	3.092	927.60
		խտխմ	170* (300)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	100	1.623	162.30
	Ծառերի և թփերի արմատների ու փթած, նեխած զանգվածի հողախառնուրդի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	300	1.037	311.10
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	300	0.440	132.00
<b>Ընդամենը</b>			<b>2.0</b>		<b>1533.00</b>
<b>Ընդամենը Վարդենիսի տեղամասում</b>			<b>32.1</b>		<b>29036.01</b>
<b>Ընդհանուր Մարտունու, Նորատուսի և Վարդենիսի մասնաճյուղերում</b>			<b>89.60</b>		<b>76522.59</b>
<b>Վերադիր ծախսեր</b>		<b>տոկոս</b>	<b>11.0</b>		<b>8417.48</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>84940.07</b>
<b>Շահույթ</b>		<b>տոկոս</b>	<b>11.0</b>		<b>9343.41</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>94283.48</b>
<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>		<b>տոկոս</b>	<b>2.0</b>		<b>1885.67</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>96169.15</b>
<b>Ավելացված արժեքի հարկ</b>		<b>տոկոս</b>	<b>20.0</b>		<b>19233.83</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>115402.98</b>

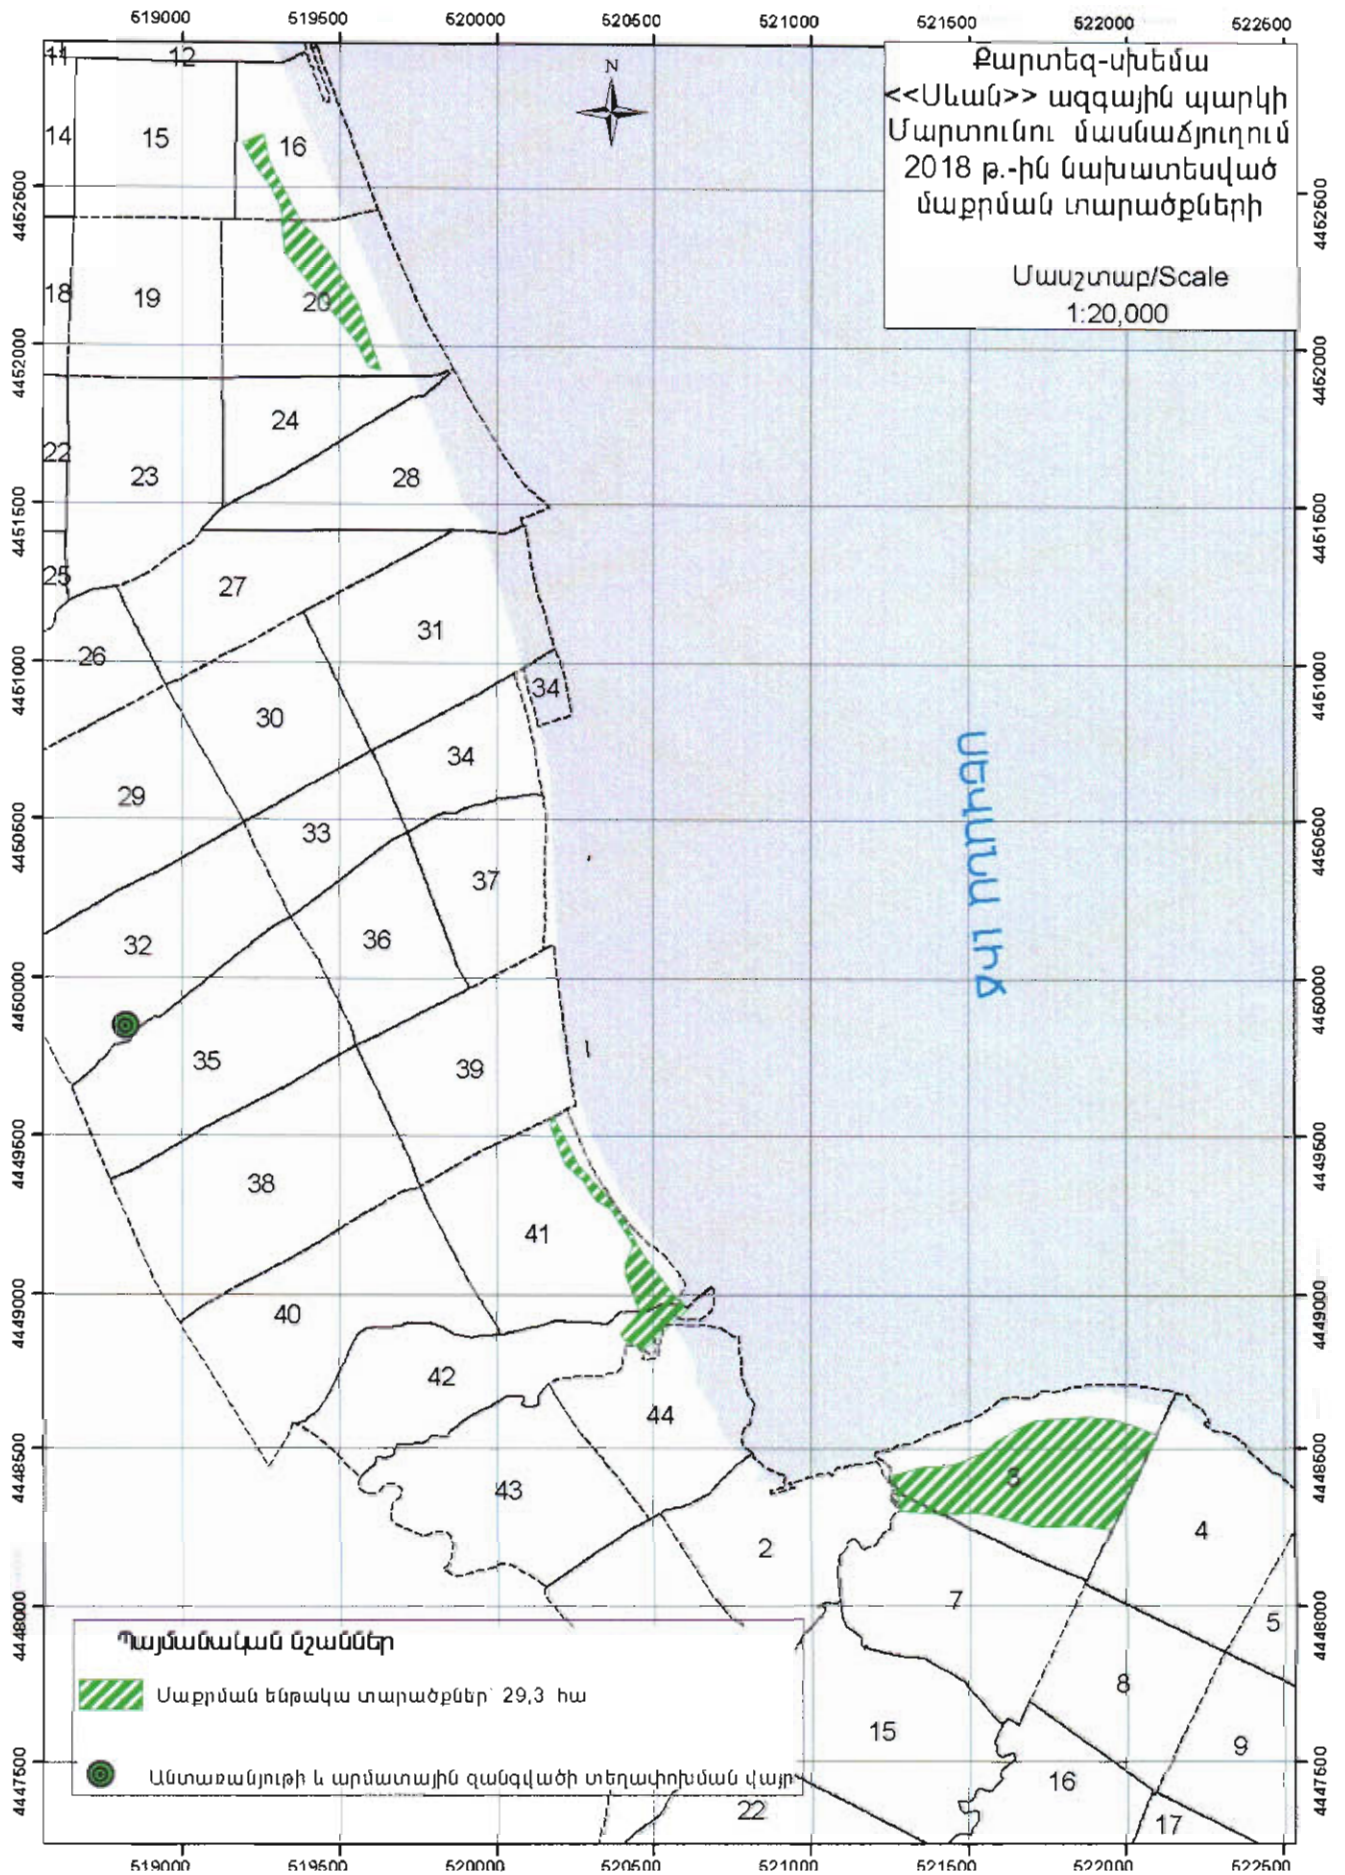

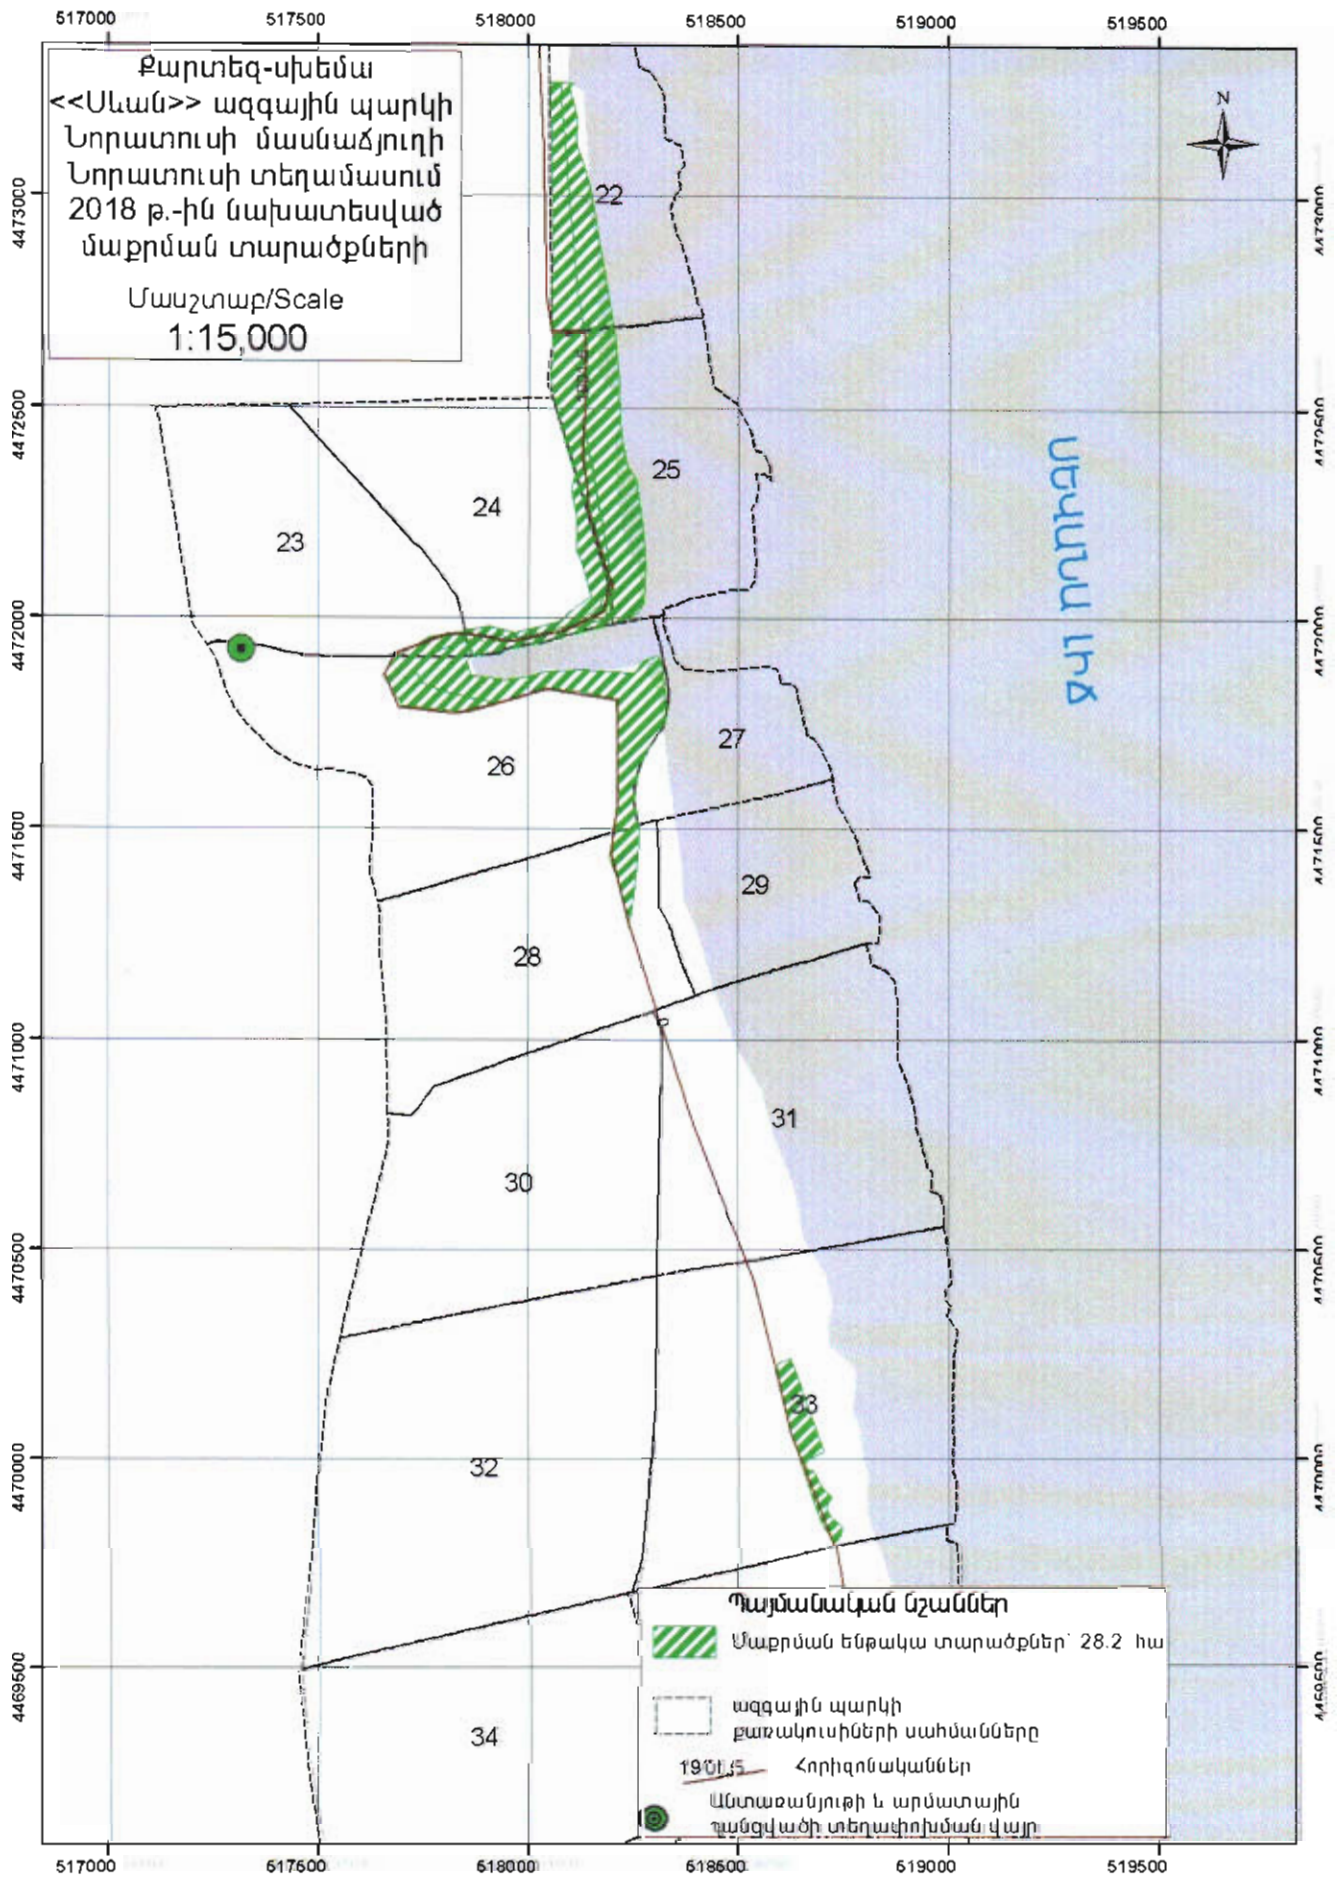


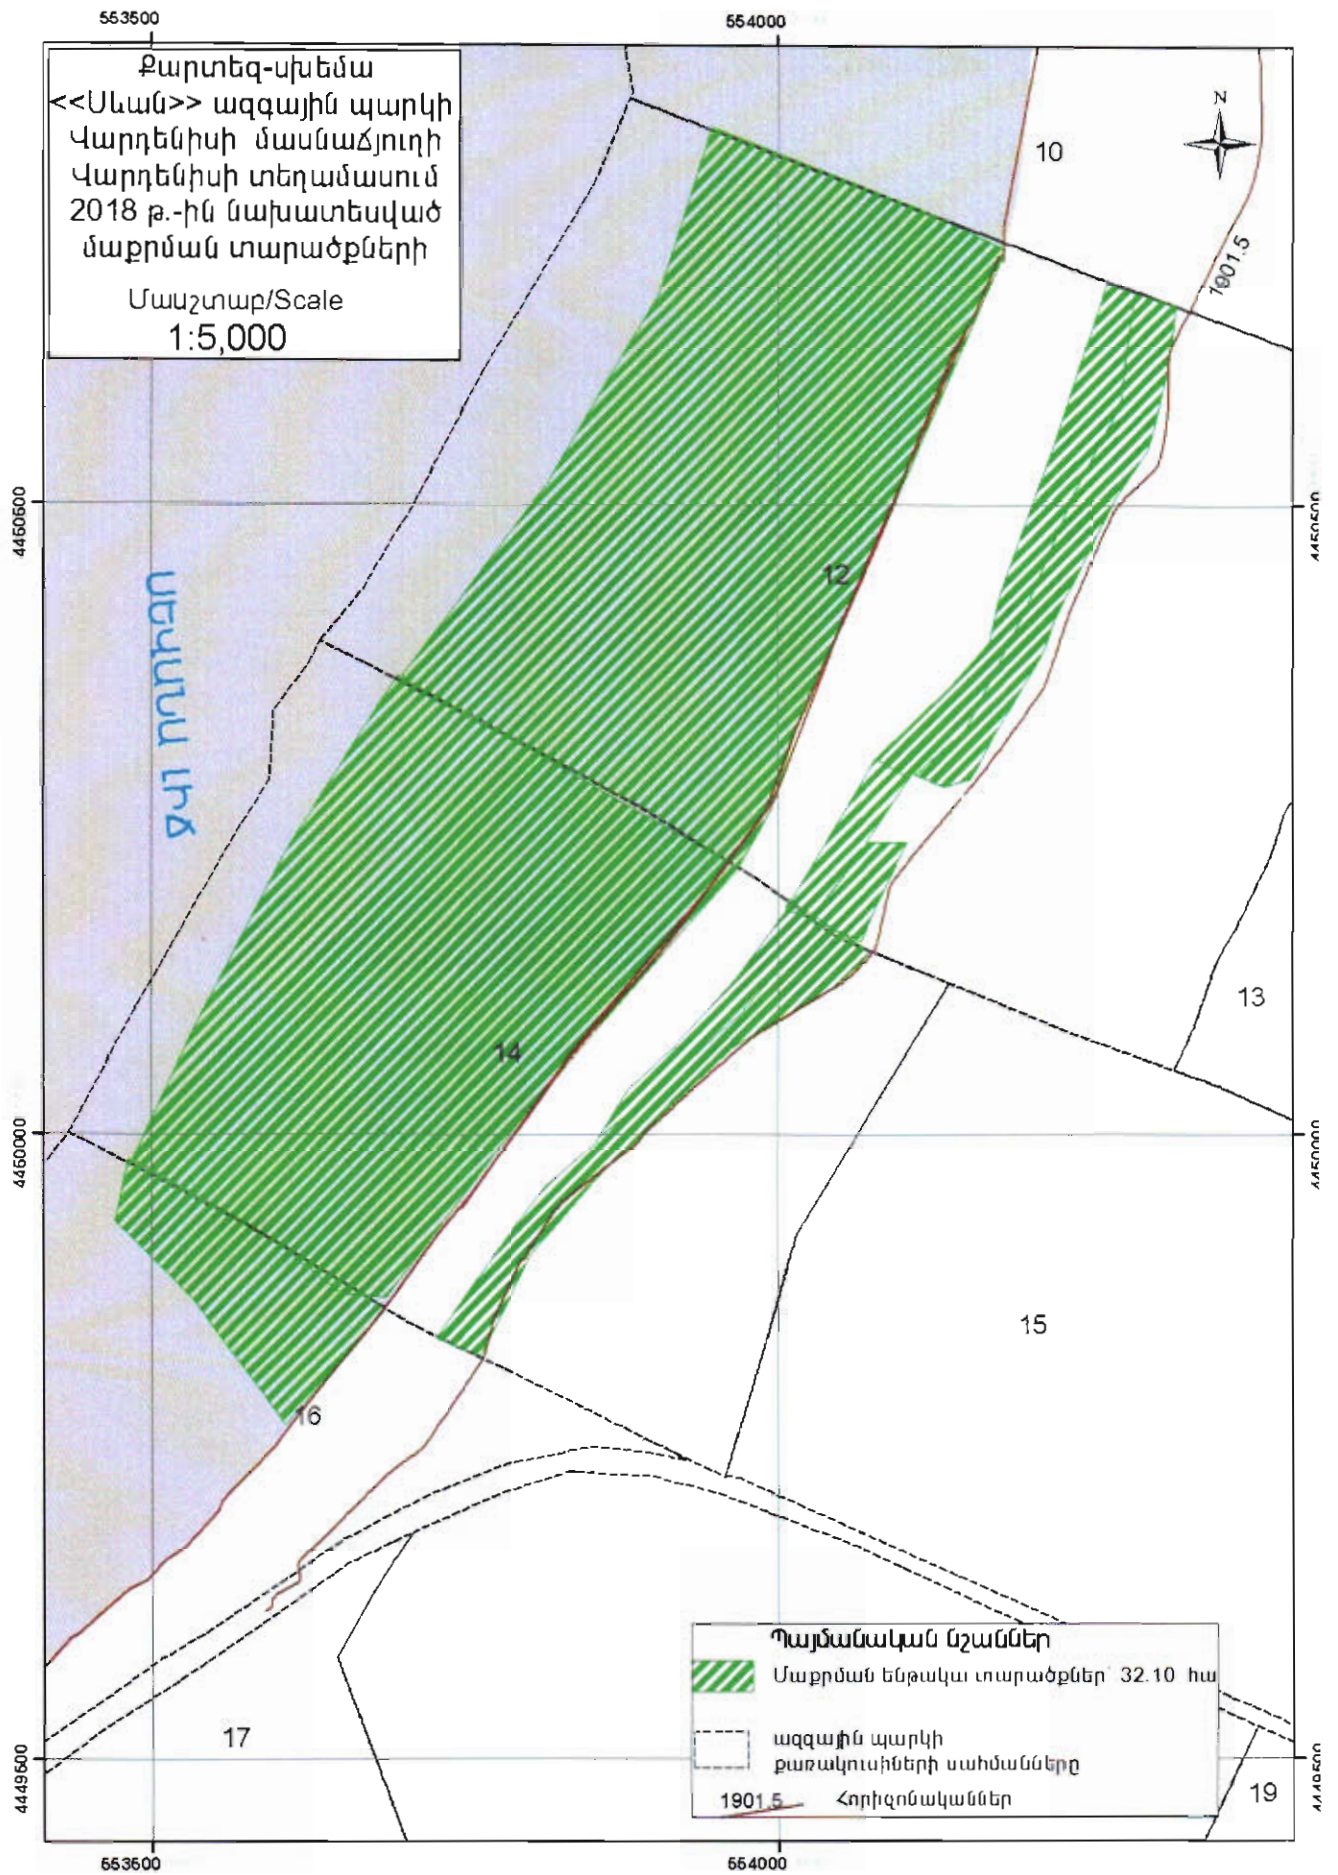


2019 թվական

(հազար դրամ)

ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի գինը	Ընդամենը
<b>Վարդենիսի մասնաճյուղի Վարդենիսի տեղամաս</b>					
1	Ջրի մեջ թփերի, ծառերի և նախկին տարիներին հատված կոճղերի արմատախիլ անում WATERMASTER CLASSIC III տրակտորով /խորությունը 1մ-ից ավելի/ և բարձում ПТС-М ինքնագնաց լաստի վրա / 100x1,5+50/	հա	39.1	6.333	11399.40
		խտխմ	1800		
	տեղափոխում ափ մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջին 500մետր հեռավորության վրա	խտխմ	1800	13.228	23810.40
	Փայտանյութի, ջախի և արմատային զանգվածի դատարկում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	1800	0.802	1443.60
	Փայտանյութի, ջախի և արմատների՝ փտած, նեխած զանգվածի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	1800	1.037	1866.60
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	1800	0.440	792.00
<b>Ընդամենը</b>			<b>39.1</b>		<b>39312.00</b>
2	Ճահնգացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում T-170 ճահնգանց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջին 300մ հեռավորության վրա/900x2+285խմ կոճղ/	հա	15.0	12.654	26383.59
		խտխմ	900* (2085)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	240	1.623	389.52
	արմատային զանգվածի բարձում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	2085	1.037	2162.13
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	2085	0.440	917.40
	<b>Ընդամենը</b>			<b>15.0</b>	
<b>Ընդամենը Վարդենիսի տեղամասում</b>			<b>54.1</b>		<b>69164.64</b>
<b>Վարդենիսի մասնաճյուղի Ծովակի տեղամաս</b>					
1	Ճահնգացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ թփերի, ծառերի և կոճղերի արմատախիլ անում T-170 ճահնգանց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջին 200մ հեռավորության վրա/ 220x2+90խմ կոճղ/	հա	6.8	8.793	4660.44
		խտխմ	220* (530)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	20	1.623	32.46
	արմատային զանգվածի բարձում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	530	1.037	549.61
	Տեղափոխում 5կմ հեռավորության վրա	խտխմ	530	0.733	388.49
	<b>Ընդամենը</b>			<b>6.8</b>	
2	Ցանաք տարածքում տրակտորով ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում/140խմX1,5+90խմ կոճղ/	հա	5.9	3.092	973.98
		խտխմ	140* (315)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	20	1.623	32.46
	Ծառերի և թփերի արմատների ու փթած, նեխած զանգվածի հողախառնուրդի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	315	1.037	326.65
	Տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	315	0.733	230.89
	<b>Ընդամենը</b>			<b>5.9</b>	
<b>Ընդամենը Ծովակի տեղամասում</b>			<b>12.7</b>		<b>7194.98</b>
<b>Ընդամենը Վարդենիսի մասնաճյուղում</b>			<b>66.80</b>		<b>76359.62</b>
Վերադիր ծախսեր		տոկոս	11.0		8399.56
<b>Ընդամենը</b>					<b>84759.18</b>
Շահույթ		տոկոս	11.0		9323.51
<b>Ընդամենը</b>					<b>94082.69</b>
Ձևախատեսված ծախսեր		տոկոս	2.0		1881.65
<b>Ընդամենը</b>					<b>95964.34</b>
Ավելացված արժեքի հարկ		տոկոս	20.0		19192.87
<b>Ընդամենը</b>					<b>115157.21</b>

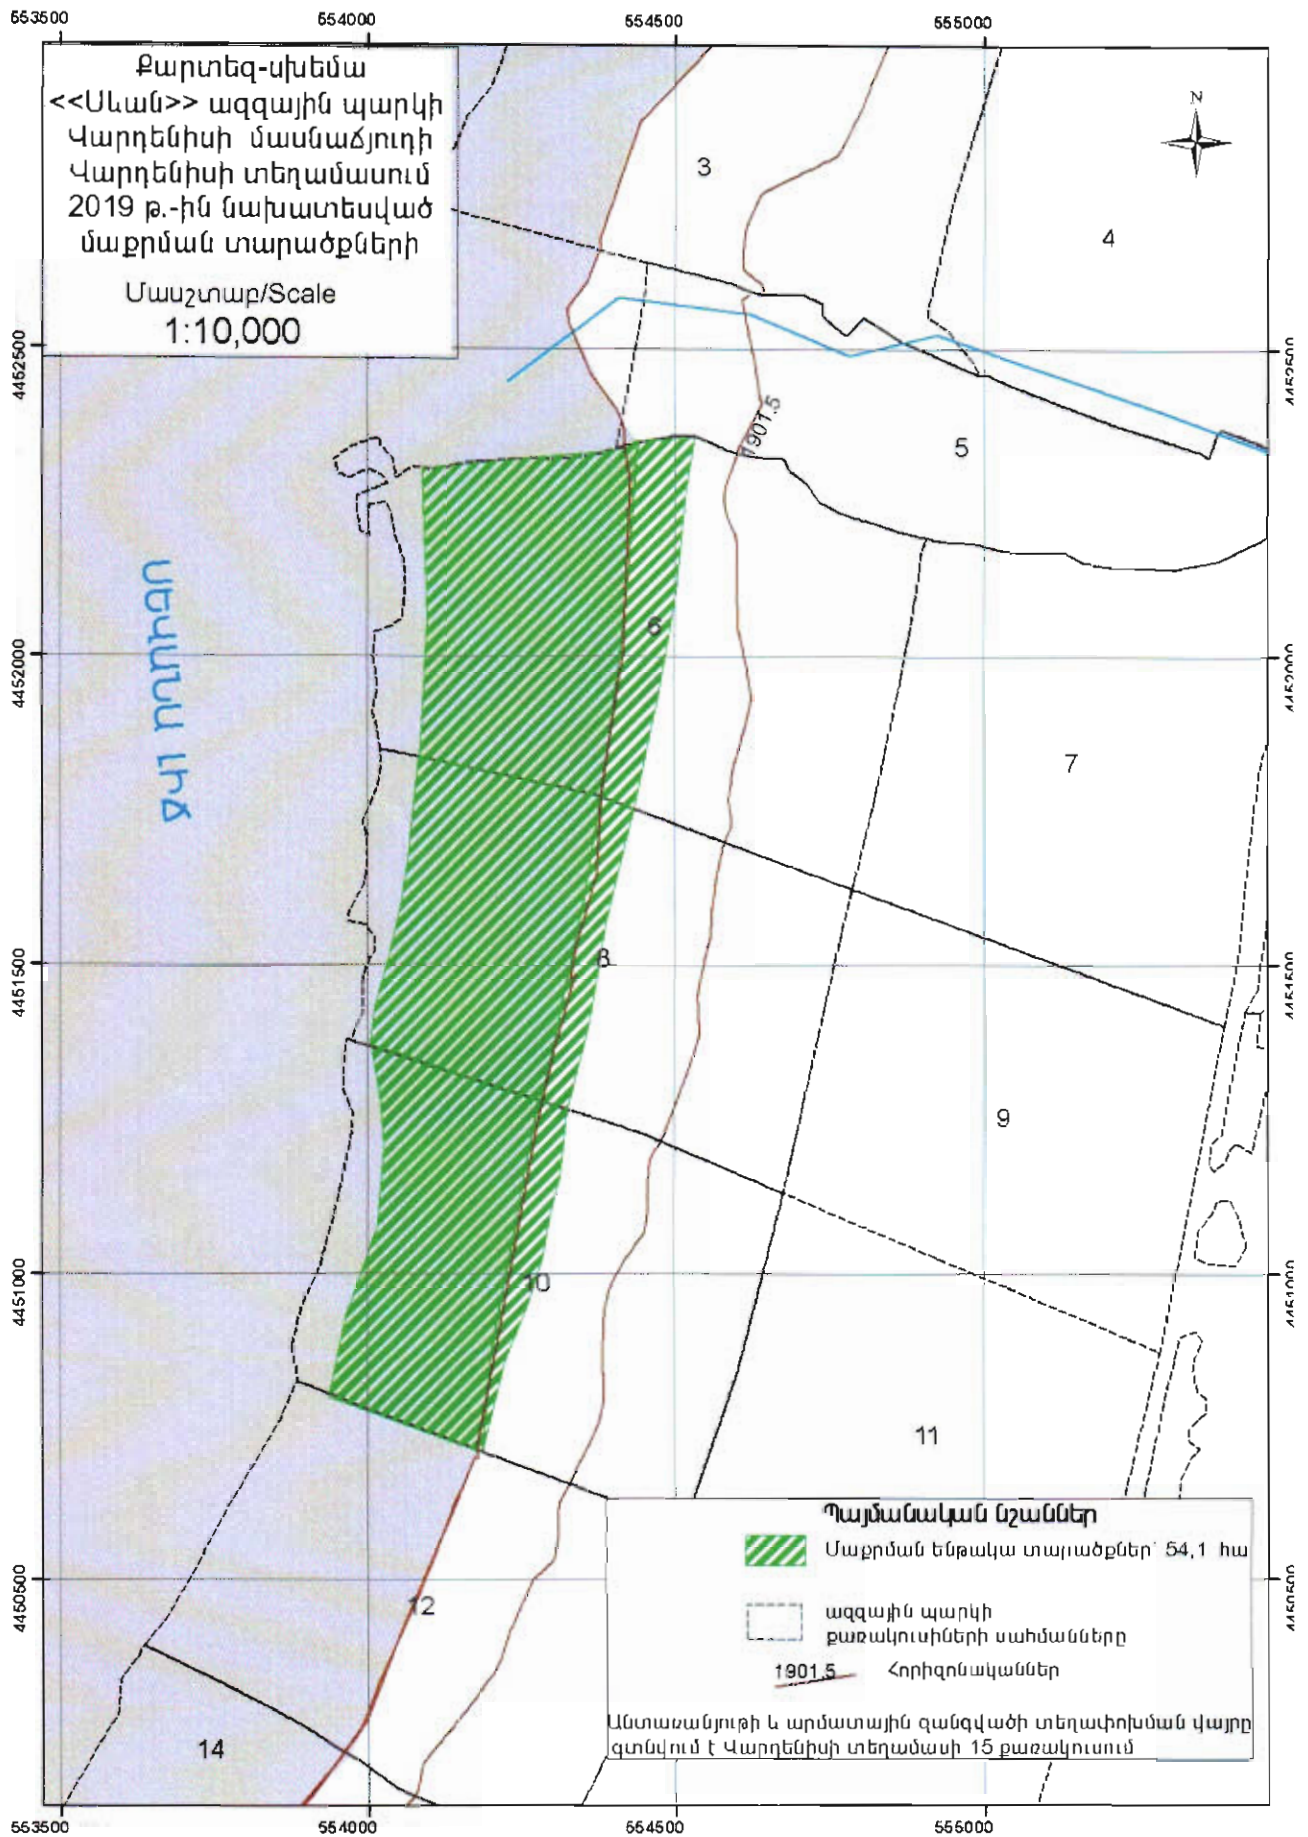

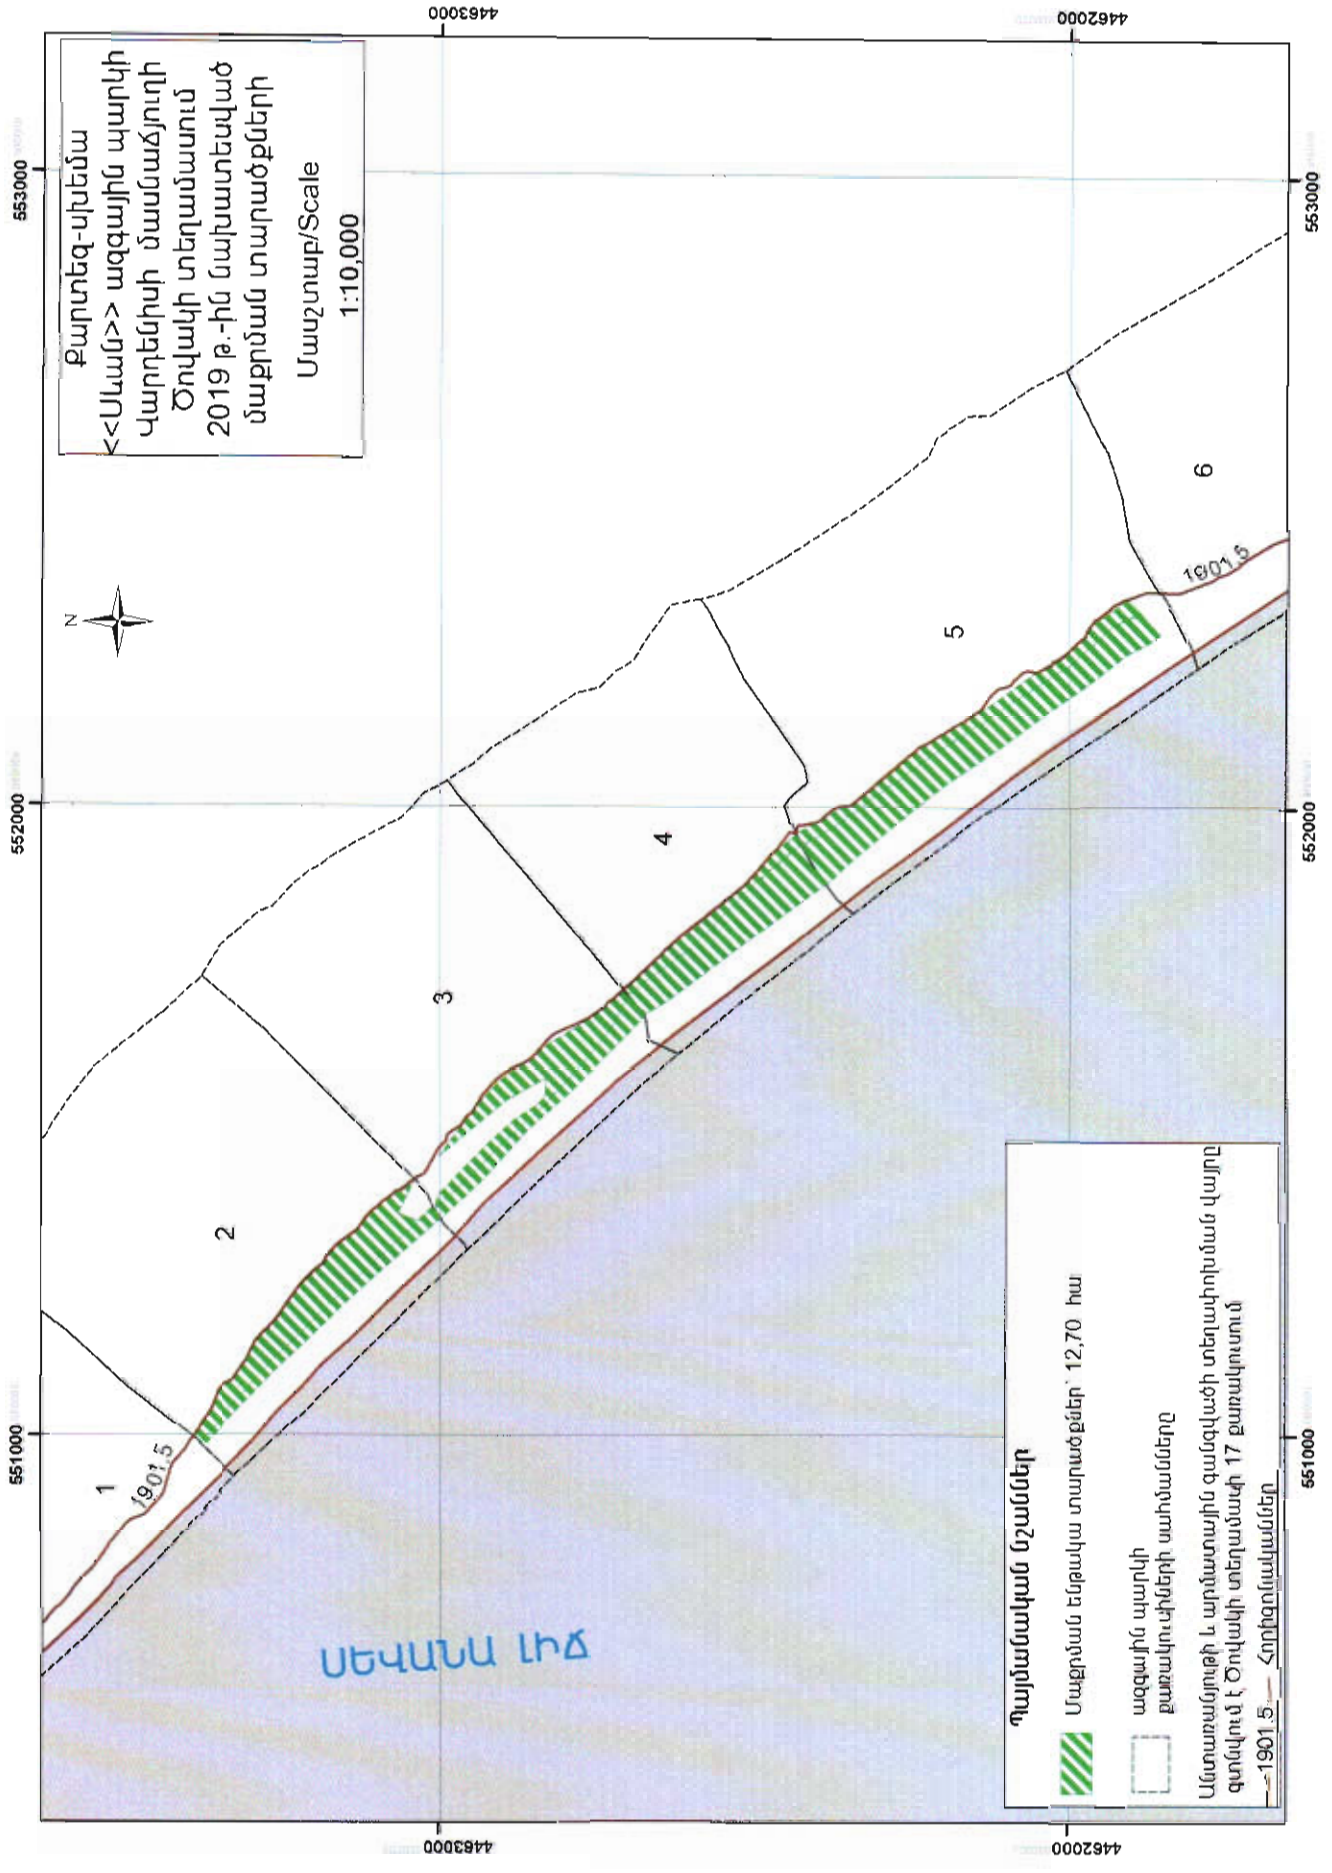



2020 թվական


(հազար դրամ)


ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի գինը	Ընդամենը	
<b>Անանի մասնաճյուղի Ախթամարի տեղամաս</b>						
1	Ջրի մեջ թփերի և նախկին տարիներին հատված կոճղերի արմատախիլ անում WATERMASTER CLASSIC III տրակտորով /խորությունը 1մ-ից ավելի/ և բարձրում՝ ПТС-М ինքնազնաց լաստի վրա / 360x1,5/	հա	8.0	8.512	4596.48	
		խտխմ	360* (540)**			
	տեղափոխում ափ մինչև մեքենայի բարձրման տեղը, միջին 200մետր հեռավորության վրա	խտխմ	540	5.291	2857.14	
	Փայտանյութի, ցախի և արմատային զանգվածի դատարկում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	540	0.802	433.08	
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	20	1.623	32.46	
	Փայտանյութի, ցախի և արմատների՝ փտած, նեխած զանգվածի հետ միասին բարձրում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	540	1.037	559.98	
	Տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	540	0.586	316.65	
<b>Ընդամենը</b>			<b>8.0</b>		<b>8795.79</b>	
2	Ճահճացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ ծառերի և թփերի արմատախիլ անում T-170 ճահճազնաց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձրման տեղը, միջին 150մ հեռավորության վրա/105x2+40խմ կոճղ/	հա	3.5	6.327	1581.75	
		խտխմ	105* (250)**			
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	20	1.623	32.46	
	արմատային զանգվածի բարձրում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	250	1.037	259.25	
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	250	0.440	109.95	
	<b>Ընդամենը</b>			<b>3.5</b>		<b>1983.41</b>
	<b>Ընդամենը Ախթամարի տեղամասում</b>			<b>11.5</b>		<b>10779.20</b>
<b>Արևիկի մասնաճյուղի Փամբակի տեղամաս</b>						
1	Ճահճացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ թփերի, ծառերի և կոճղերի արմատախիլ անում T-170 ճահճազնաց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձրման տեղը, միջին 250մ հեռավորության վրա/ 410x2+110խմ կոճղ/	հա	9.55	10.992	10222.18	
		խտխմ	410* (930)**			
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	100	1.623	162.30	
	արմատային զանգվածի բարձրում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	930	1.037	964.41	
	Տեղափոխում 4կմ հեռավորության վրա	խտխմ	930	0.580	539.35	
	<b>Ընդամենը</b>			<b>9.55</b>		<b>11888.24</b>
2	Ցամաք տարածքում տրակտորով ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում/440խմX1,5+100խմ կոճղ/	հա	10.85	3.092	2349.92	
		խտխմ	440* (760)**			
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	100	1.623	162.30	
	Ծառերի և թփերի արմատների ու փթած, նեխած զանգվածի հողախառնուրդի հետ միասին բարձրում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	760	1.037	788.12	
	Տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	760	0.586	445.66	
	<b>Ընդամենը</b>			<b>10.85</b>		<b>3746.00</b>
<b>Ընդամենը Փամբակի տեղամասում</b>			<b>20.40</b>		<b>15634.24</b>	
<b>Արևիկի մասնաճյուղի Արեգունու տեղամաս</b>						
1	Ճահճացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ թփերի և ծառերի արմատախիլ անում T-170 ճահճազնաց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձրման տեղը, միջին 200 հեռավորության վրա/160x2+80խմ կոճղ/	հա	3.4	8.918	3567.20	
		խտխմ	160* (400)**			
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	25	1.623	40.57	
	արմատային զանգվածի բարձրում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	400	1.037	414.80	
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	400	0.440	175.92	
	<b>Ընդամենը</b>			<b>3.4</b>		<b>4198.49</b>
2	Ցամաք տարածքում տրակտորով ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում/150խմX1,5+75խմ կոճղ/	հա	3.5	3.092	927.60	
		խտխմ	150* (300)**			
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	25	1.623	40.57	
	Ծառերի և թփերի արմատների ու փթած, նեխած զանգվածի հողախառնուրդի հետ միասին բարձրում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	300	1.037	311.10	
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	300	0.440	131.94	
	<b>Ընդամենը</b>			<b>3.5</b>		<b>1411.21</b>
<b>Ընդամենը Արեգունու տեղամասում</b>			<b>6.9</b>		<b>5609.70</b>	
<b>Ընդամենը Արևիկի մասնաճյուղում</b>			<b>27.30</b>		<b>21243.94</b>	


<b>Արտանիշի մասնաճյուղի Դրախտիկի տեղամաս</b>					
1	Ճահճացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ թփերի, ծառերի և կոճղերի արմատախիլ անում T-170 ճահճագնաց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հյուսմ մինչև մեքենայի բարձրան տեղը, միջին 200մ հեռավորության վրա/ 1570x2+400խմ կոճղ/	հա	34.0	8.793	31128.28
		խտխմ	1460* (3540)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	480	1.623	779.04
	արմատային զանգվածի բարձում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	3540	1.037	3670.98
	Տեղափոխում 4կմ հեռավորության վրա	խտխմ	3540	0.586	2074.44
<b>Ընդամենը</b>			<b>34.0</b>		<b>37652.74</b>
2	Ցամաք տարածքում տրակտորով ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում/490խմX1,5+120խմ կոճղ/	հա	7.3	3.092	3401.20
		խտխմ	490* (1100)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	50	1.623	81.15
	Ծառերի և թփերի արմատների ու փթած, նեխած զանգվածի հողախառնուրդի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	1100	1.037	1140.70
	Տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	1100	0.586	645.04
<b>Ընդամենը</b>			<b>7.3</b>		<b>5268.09</b>
<b>Ընդամենը Դրախտիկի տեղամասում</b>			<b>41.3</b>		<b>42920.83</b>
<b>Արտանիշի մասնաճյուղի Արտանիշի տեղամաս</b>					
1	Ցամաք տարածքում տրակտորով ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում/150խմX1,5+75խմ կոճղ/	հա	4.9	3.092	927.60
		խտխմ	150* (300)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	25	1.623	40.57
	Ծառերի և թփերի արմատների ու փթած, նեխած զանգվածի հողախառնուրդի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	300	1.037	311.10
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	300	0.440	131.94
<b>Ընդամենը</b>			<b>4.9</b>		<b>1411.21</b>
<b>Ընդամենը Արտանիշի տեղամասում</b>			<b>4.9</b>		<b>1411.21</b>
<b>Ընդհանուր Արտանիշի մասնաճյուղում</b>			<b>46.20</b>		<b>44332.04</b>
<b>Ընդհանուր Սևանի, Արևիկի և Արտանիշի մասնաճյուղերում</b>			<b>85.00</b>		<b>76355.18</b>
<b>Վերադիր ծախսեր</b>		տոկոս	11.0		<b>8399.07</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>84754.25</b>
<b>Շահույթ</b>		տոկոս	11.0		9322.97
<b>Ընդամենը</b>					<b>94077.22</b>
<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>		տոկոս	2.0		<b>1881.54</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>95958.76</b>
<b>Ավելացված արժեքի հարկ</b>		տոկոս	20.0		19191.75
<b>Ընդամենը</b>					<b>115150.51</b>

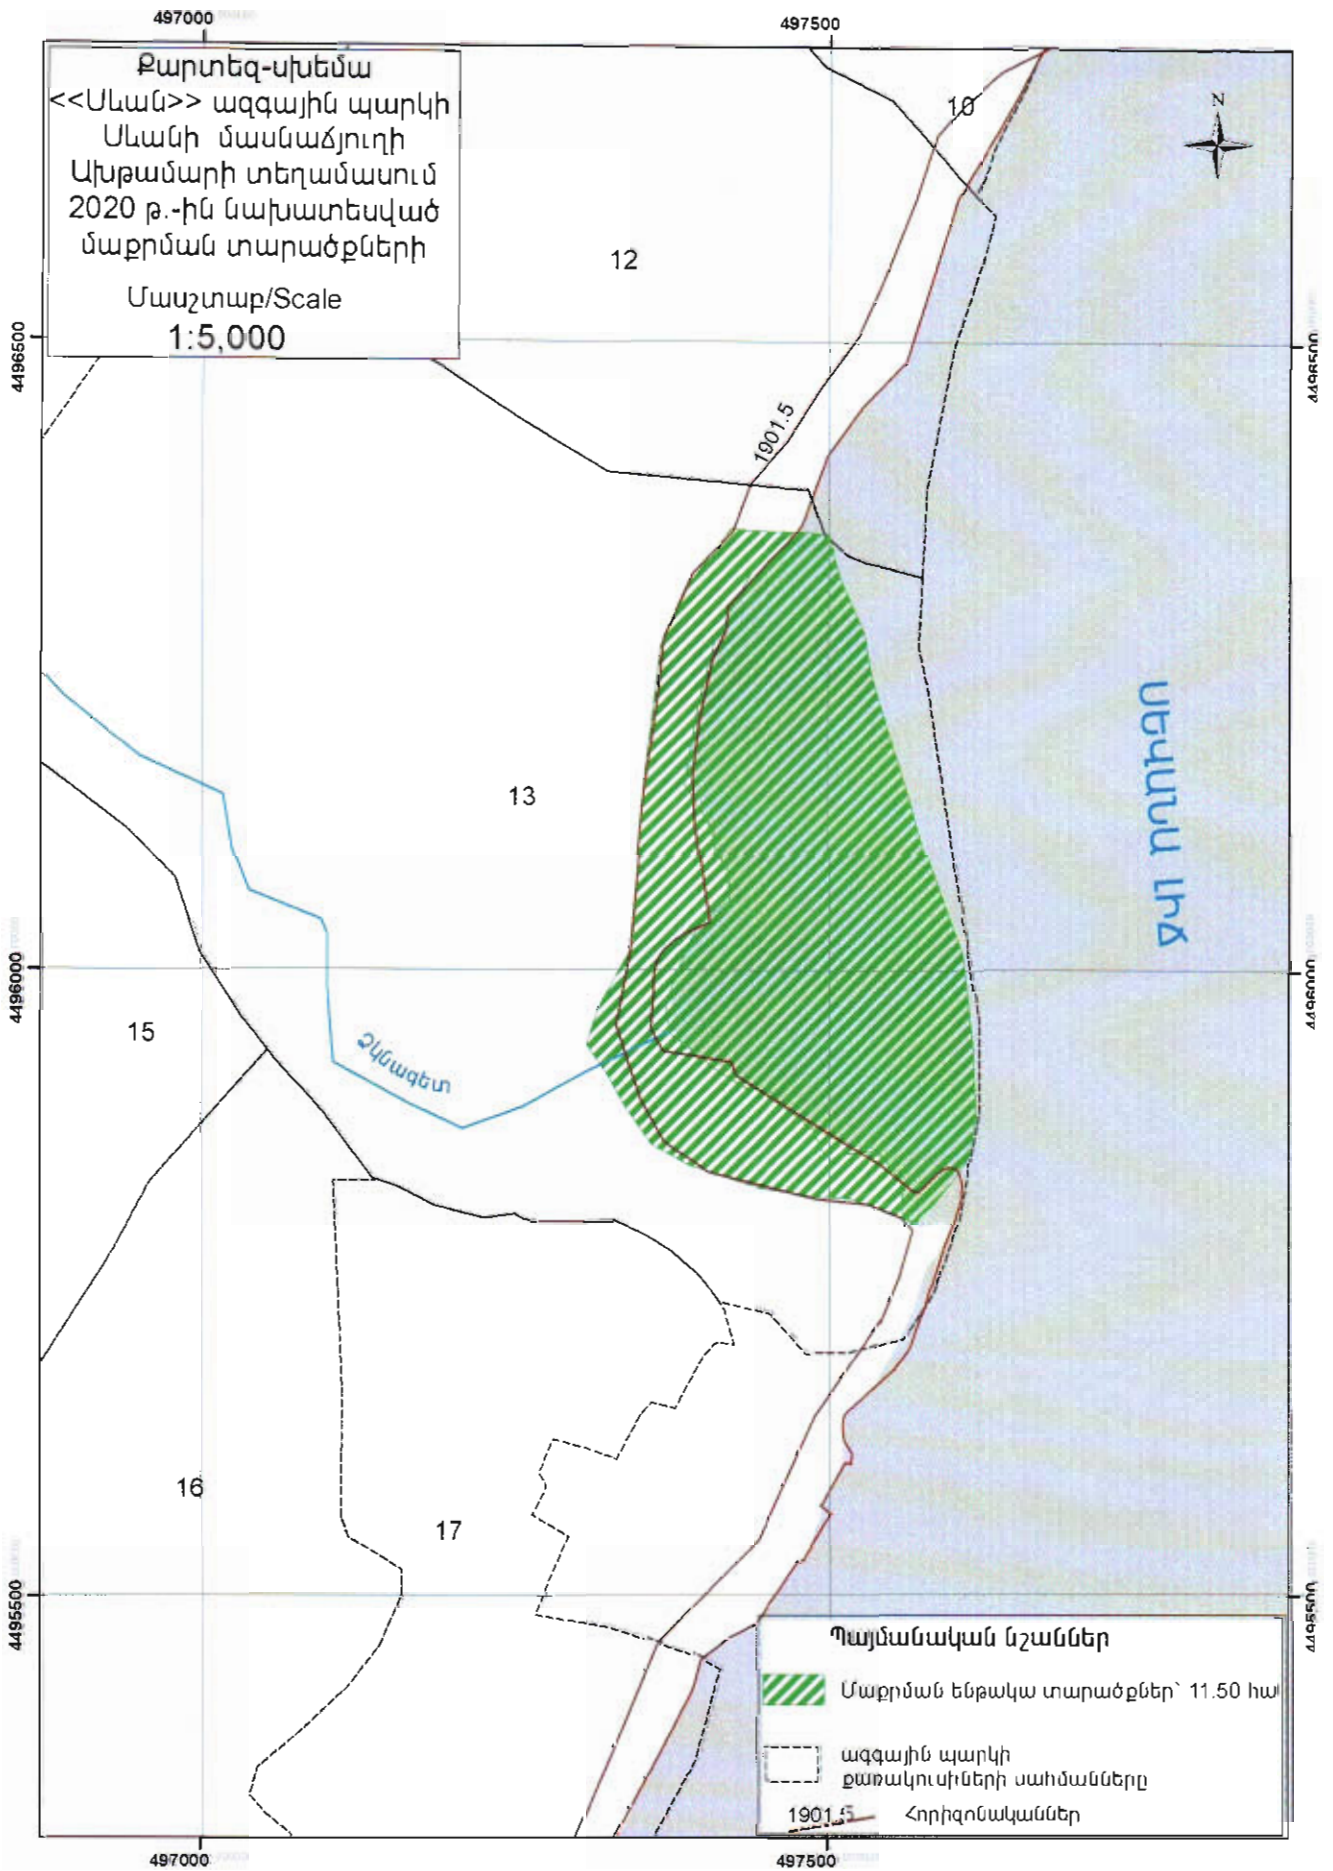

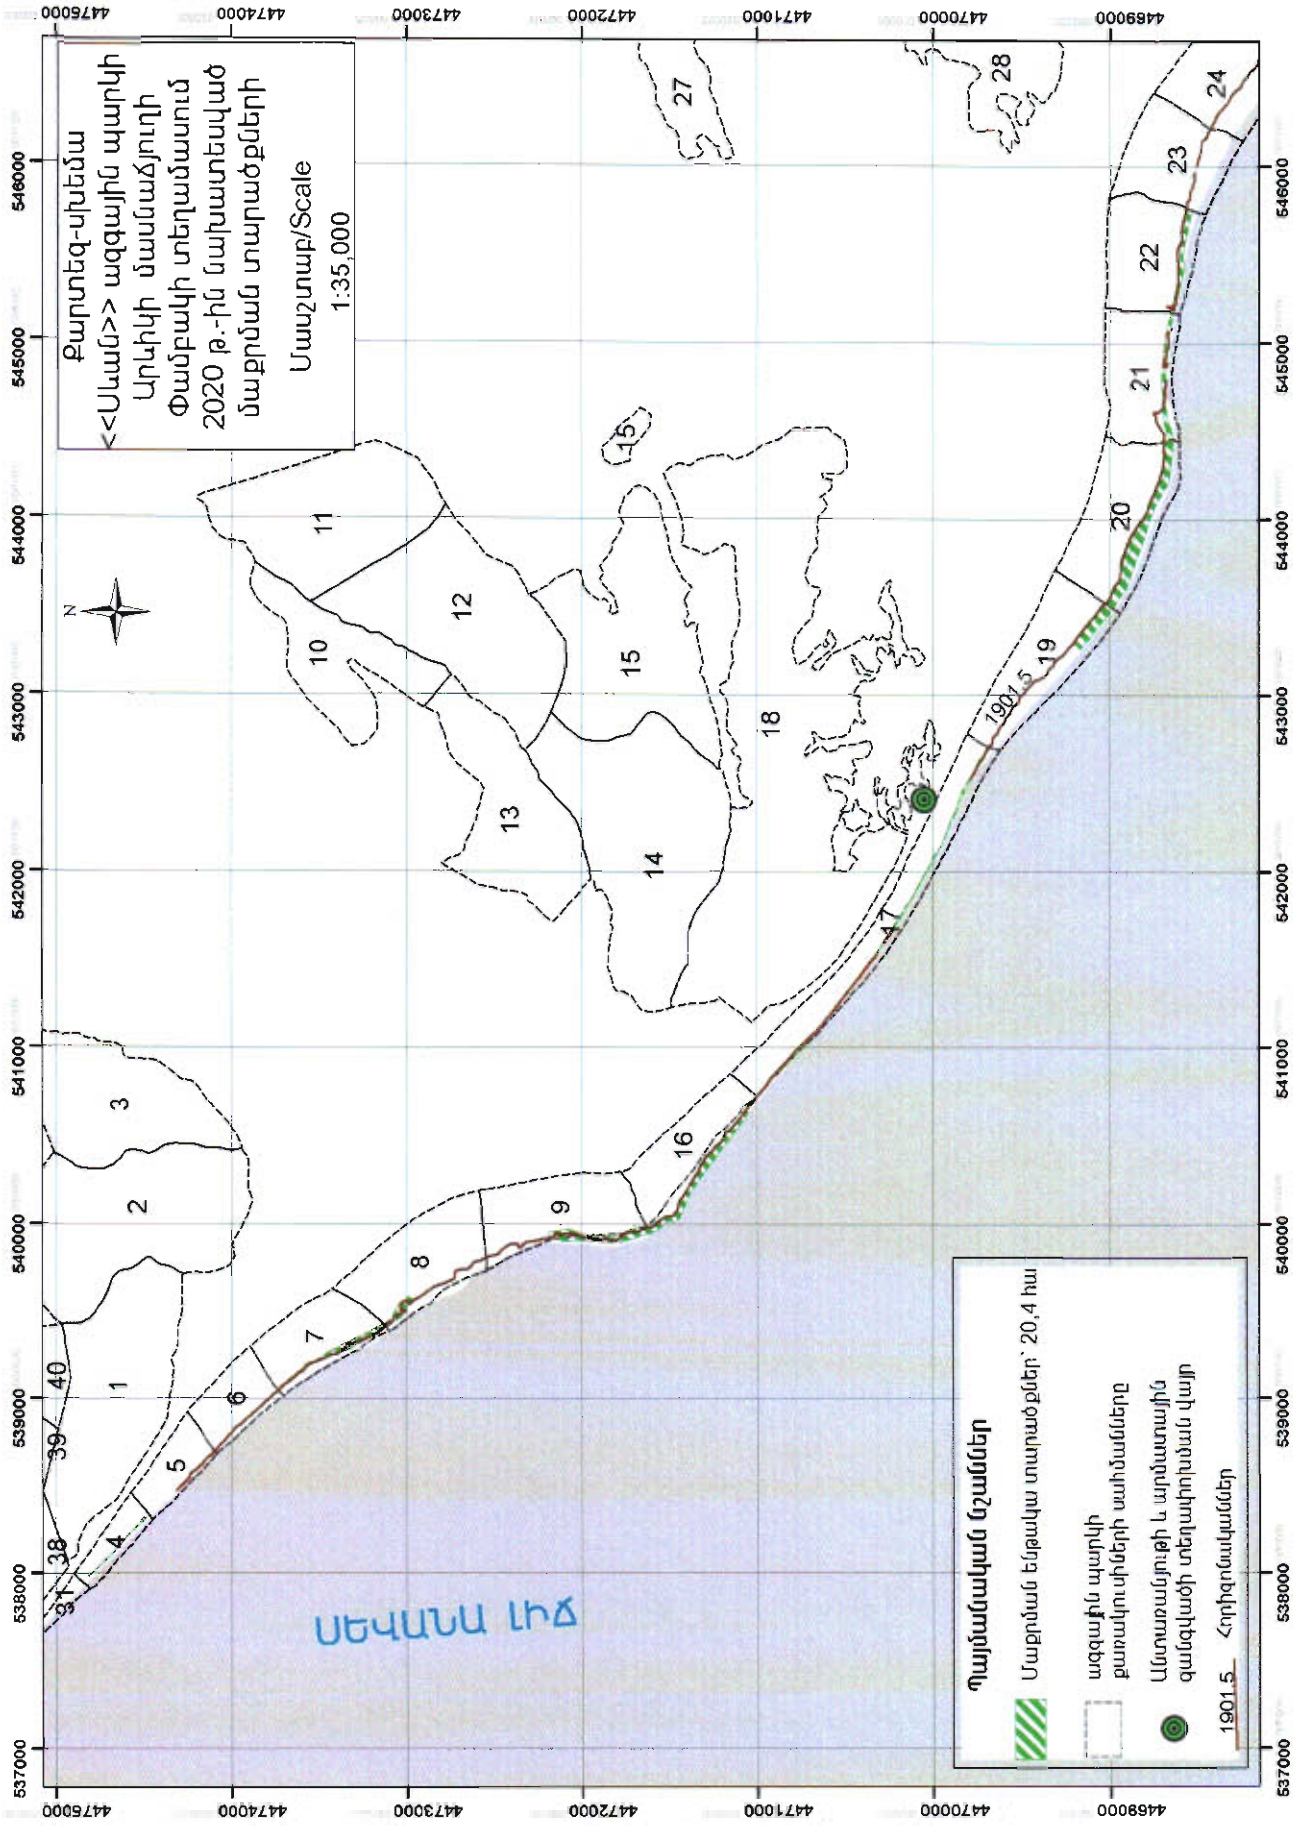

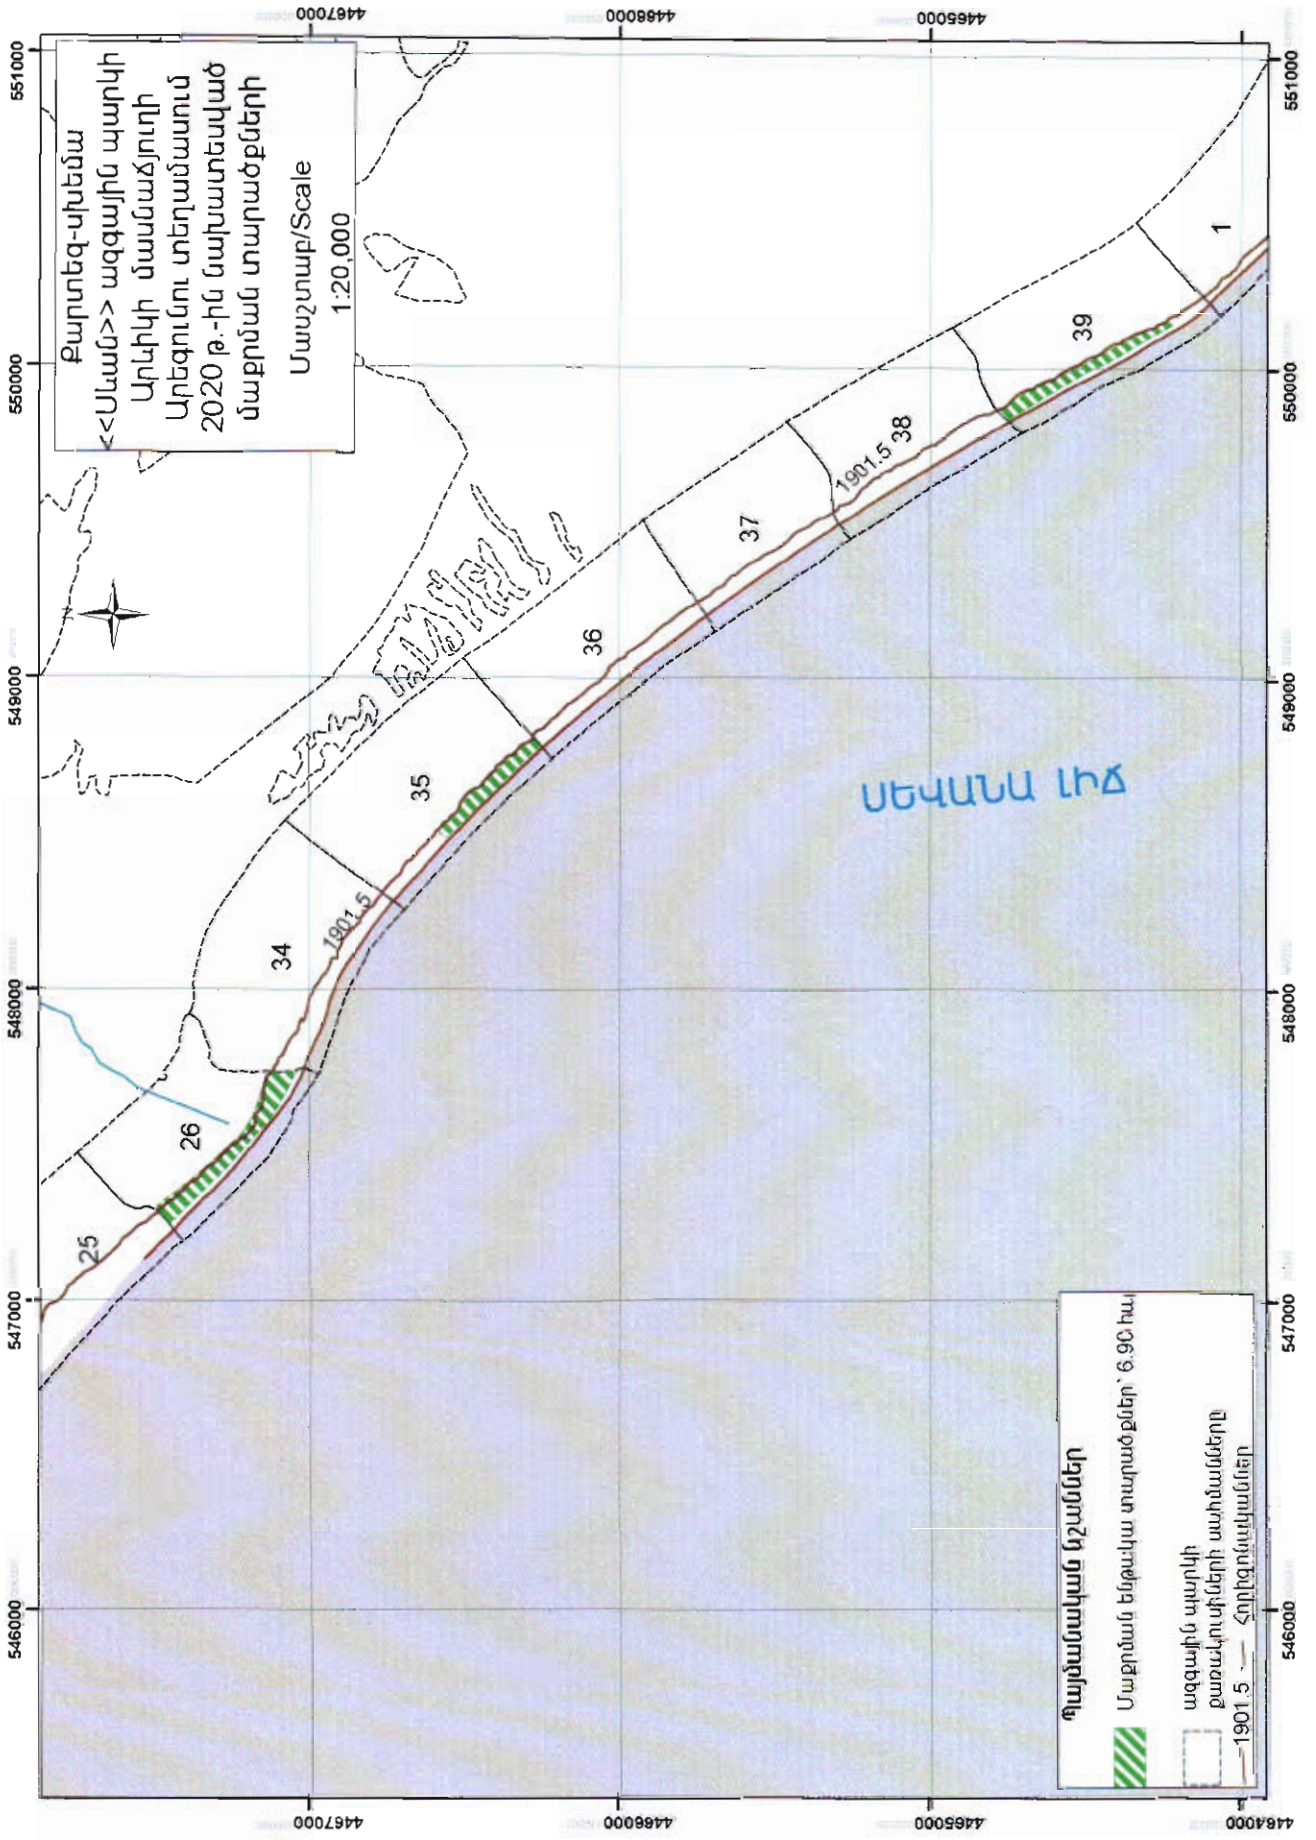

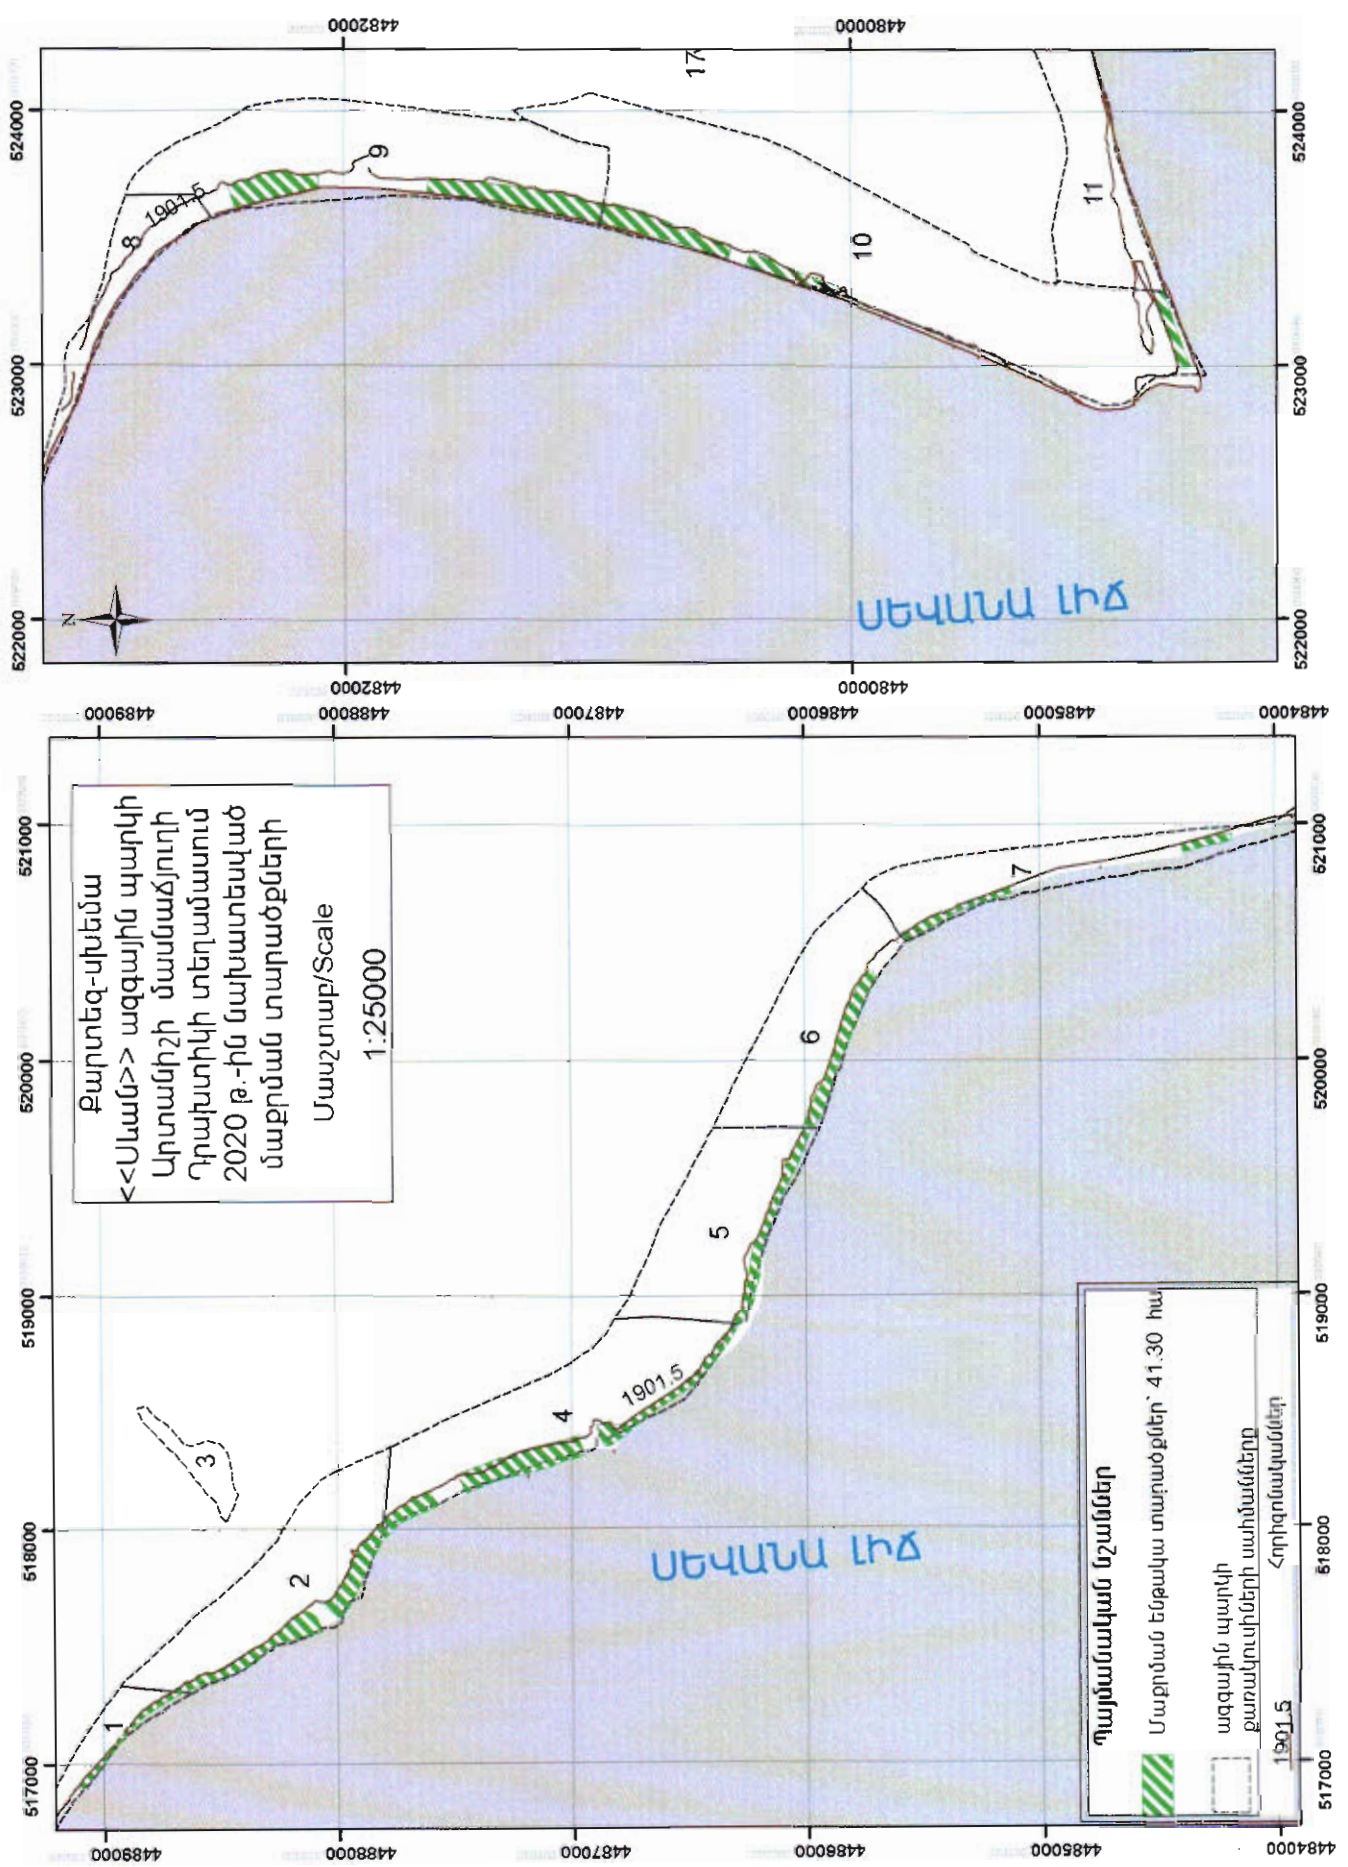

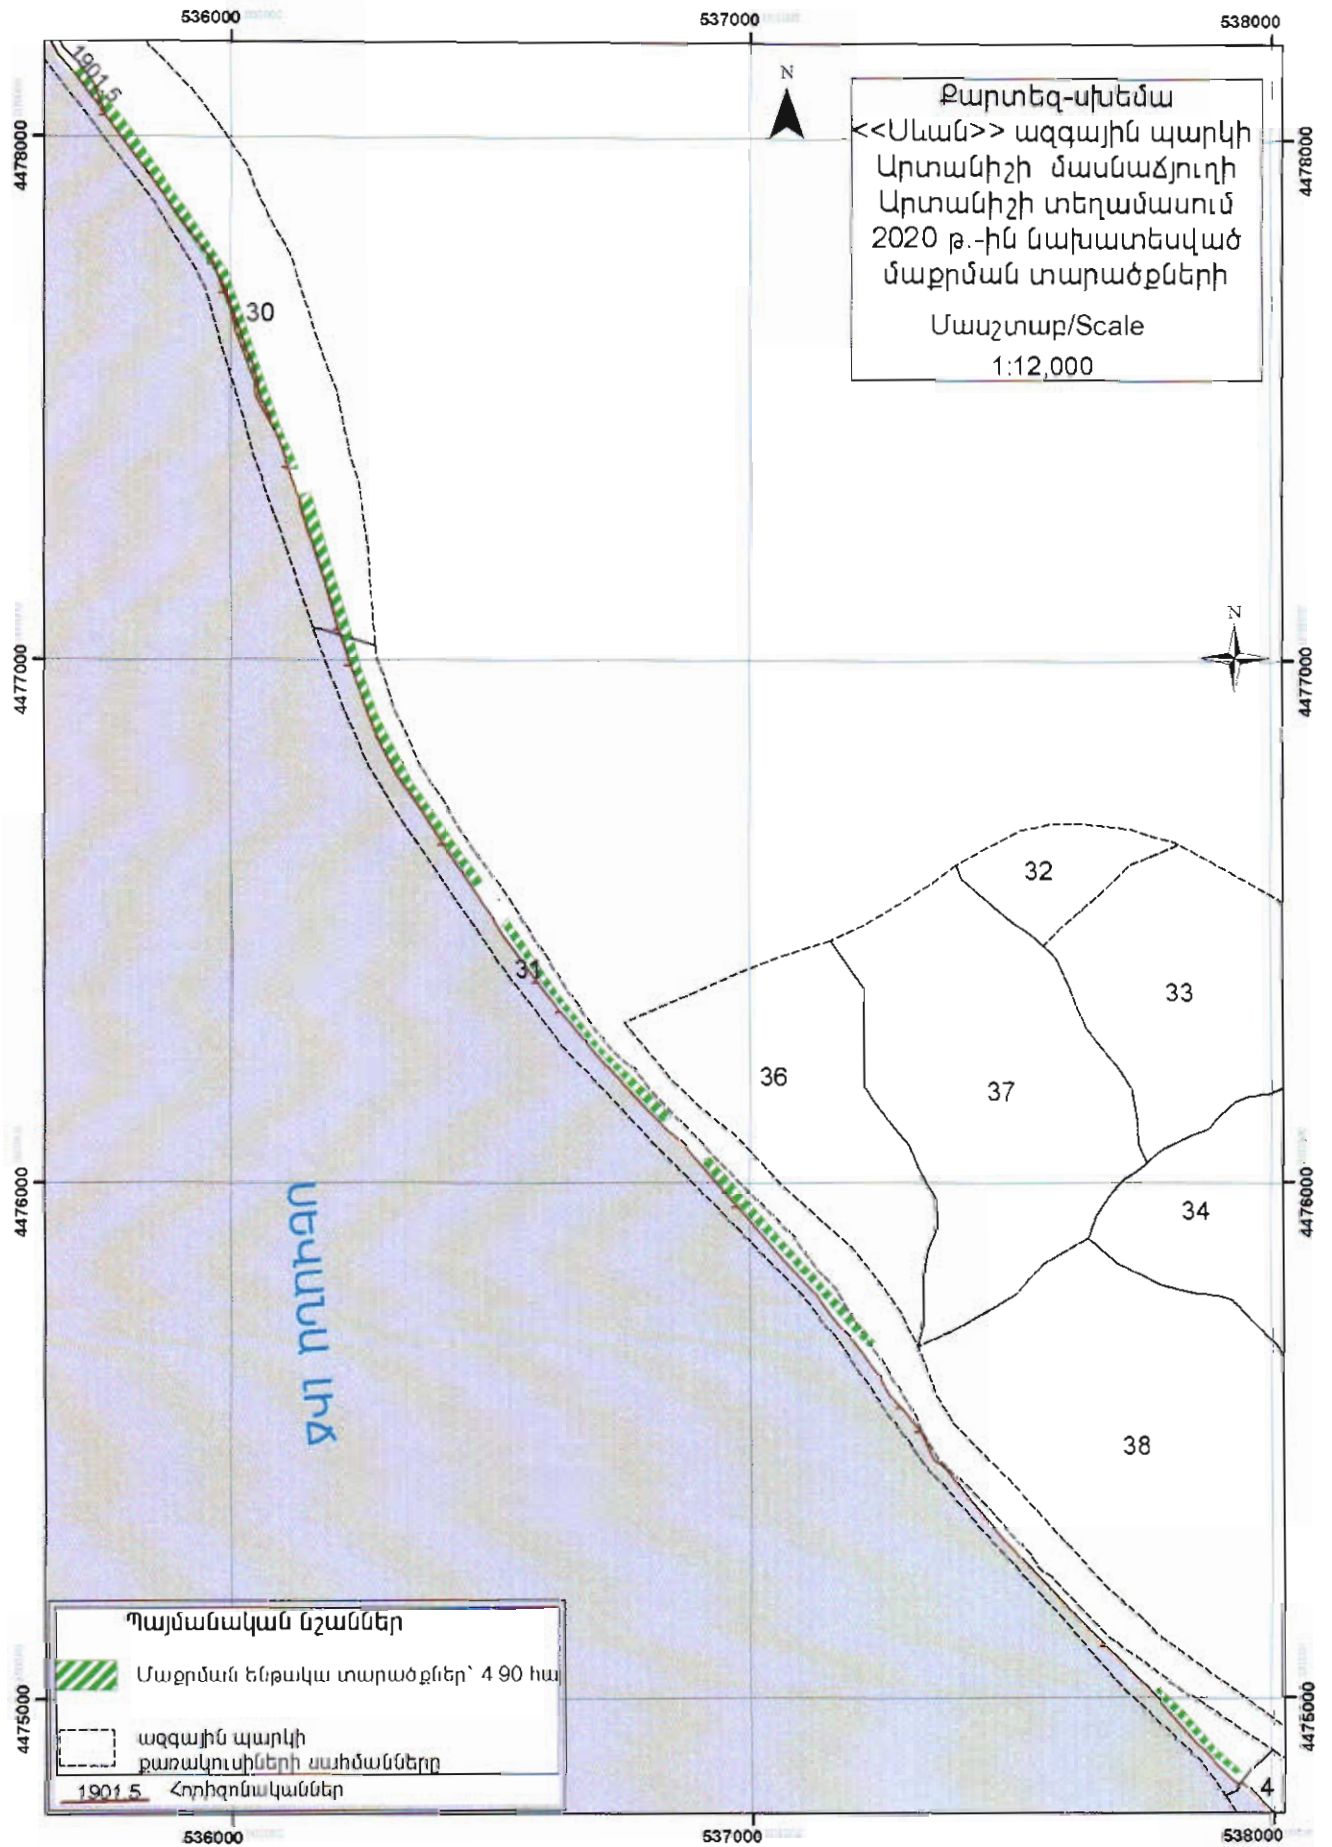


## 2021 թվական

(հազար դրամ)

ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի գինը	Ընդամենը
<b>Վարդենիսի մասնաճյուղի Վարդենիսի տեղամաս</b>					
1	Ջրի մեջ նախկին տարիներին հատված կոճղերի և առանձին թփերի արմատախիլ անում WATERMASTER CLASSIC III տրակտորով /խորությունը 1մ-ից ավելի/ և բարձում ПТС-М ինքնագնաց յաստի վրա	հա	21.3	6.333	6333.00
		խտխտ	1000		
	տեղափոխում ափ մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջին 400մետր հեռավորության վրա	խտխտ	1000	10.582	10582.00
	Փայտանյութի, ջախի և արմատային զանգվածի դատարկում CAT 428E էքսկավատորով	խտխտ	1000	0.802	802.00
	Փայտանյութի, ջախի և արմատների՝ փտած, նեխած զանգվածի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխտ	1000	1.037	1037.00
	Տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	խտխտ	1000	0.733	733.00
<b>Ընդամենը</b>			<b>21.3</b>		<b>19487.00</b>
2	Ճահճացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ ծառերի, թփերի և հատված կոճղերի արմատախիլ անում T-170 ճահճագնաց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջին 300 հեռավորության վրա/810x2+130խմ կոճղ/	հա	13.6	12.654	22144.50
		խտխտ	810* (1750)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխտ	300	1.623	486.90
	արմատային զանգվածի բարձում CAT 428E էքսկավատորով	խտխտ	1750	1.037	1814.75
	Տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խտխտ	1750	0.586	1025.50
	<b>Ընդամենը</b>			<b>13.6</b>	
3	Ցամաք տարածքում տրակտորով ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում 190խմX1,5+50խմ կոճղ/	հա	3.8	3.092	1035.82
		խտխտ	190* (335)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխտ	100	1.623	162.30
	Ծառերի և թփերի արմատների ու փթած, նեխած զանգվածի հողախառնուրդի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխտ	335	1.037	347.39
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխտ	335	0.440	147.40
	<b>Ընդամենը</b>			<b>3.8</b>	
<b>Ընդամենը Վարդենիսի տեղամասում</b>			<b>38.7</b>		<b>46651.56</b>
<b>Վարդենիսի մասնաճյուղի Ծովակի տեղամաս</b>					
1	Ջրի մեջ նախկին տարիներին հատված կոճղերի և առանձին թփերի արմատախիլ անում WATERMASTER CLASSIC III տրակտորով /խորությունը 1մ-ից ավելի/ և բարձում ПТС-М ինքնագնաց յաստի վրա	հա	8.9	6.333	2849.85
		խտխտ	450		
	տեղափոխում ափ մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջին 400մետր հեռավորության վրա	խտխտ	450	10.582	4761.90
	Փայտանյութի, ջախի և արմատային զանգվածի դատարկում CAT 428E էքսկավատորով	խտխտ	450	0.802	360.90
	Փայտանյութի, ջախի և արմատների՝ փտած, նեխած զանգվածի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխտ	450	1.037	466.65
	Տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա	խտխտ	450	0.733	329.85
<b>Ընդամենը</b>			<b>8.9</b>		<b>8769.15</b>
2	Ճահճացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում T-170 ճահճագնաց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջին 350 հեռավորության վրա/500x2+100խմ կոճղ/	հա	8.5	14.762	16238.70
		խտխտ	500* (1100)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխտ	300	1.623	486.90
	արմատային զանգվածի բարձում CAT 428E էքսկավատորով	խտխտ	1100	1.037	1140.70
	Տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խտխտ	1100	0.406	446.60
	<b>Ընդամենը</b>			<b>8.5</b>	
3	Ցամաք տարածքում տրակտորով ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում 300խմX1,5+70խմ կոճղ/	հա	5.7	3.092	1607.84
		խտխտ	300* (520)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխտ	150	1.623	243.45
	Ծառերի և թփերի արմատների ու փթած, նեխած զանգվածի հողախառնուրդի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխտ	520	1.037	539.24
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխտ	520	0.536	278.72
	<b>Ընդամենը</b>			<b>5.7</b>	
<b>Ընդամենը Ծովակի տեղամասում</b>			<b>23.1</b>		<b>29751.30</b>
<b>Ընդհանուր Վարդենիսի մասնաճյուղում</b>			<b>61.80</b>		<b>76402.86</b>

Վերադիր ծախսեր	տոկոս	11.0	8404.31
Ընդամենը			84807.17
Շահույթ	տոկոս	11.0	9328.79
Ընդամենը			94135.96
Զնախատեսված ծախսեր	տոկոս	2.0	1882.72
Ընդամենը			96018.68
Ավելացված արժեքի հարկ	տոկոս	20.0	19203.74
Ընդամենը			115222.42

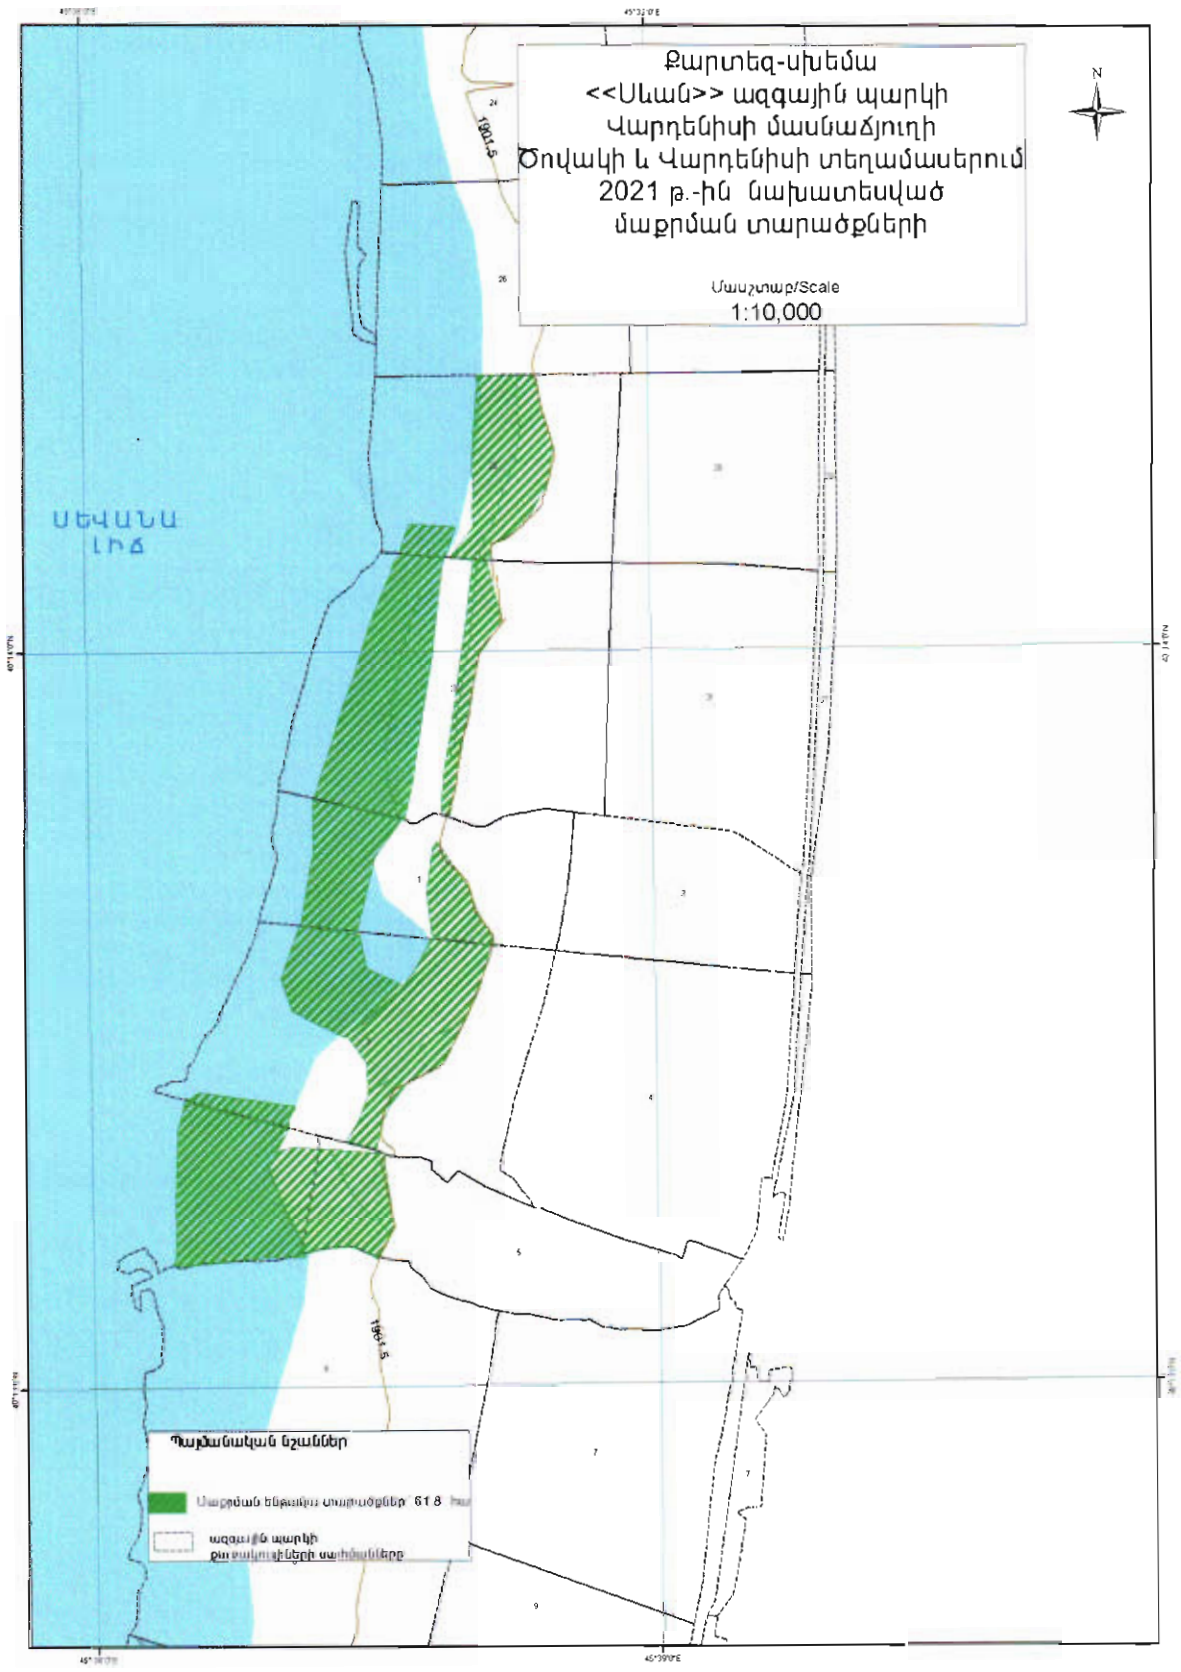

2022 թվական


(հազար դրամ)

ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի գինը	Ընդամենը
<b>Վարդենիսի մասնաճյուղի Ծովակի տեղամաս</b>					
1	Ճահճացած տարածքում և ջրի մեջ /խորությունը մինչև 1 մ/ ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում T-170 ճահճագնաց տրակտորով և արմատների՝ փթած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձրման տեղը. միջին 250մ հեռավորության վրա/ 2490x2+300խմ կոճղ/	հա	57.8	10.545	55675.49
		խտխմ	2490* (5280)**		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	910	1.623	1476.93
	արմատային զանգվածի բարձում CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	5280	1.037	5475.36
	Տեղափոխում 4 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	5280	0.586	3094.08
<b>Ընդամենը</b>			<b>57.8</b>		<b>65721.86</b>
2	Ցամաք տարածքում տրակտորով ծառերի, թփերի և կոճղերի արմատախիլ անում/1300խմX1,5+200խմ կոճղ/	հա	29.0	3.092	6647.80
		խտխմ	1350* (2150) **		
	Անտառանյութի մասնատում	խտխմ	500	1.623	811.50
	Ծառերի և թփերի արմատների ու փթած, նեխած զանգվածի հողախառնուրդի հետ միասին բարձում բեռնատար մեքենային CAT 428E էքսկավատորով	խտխմ	2150	1.037	2229.55
	Տեղափոխում 3 կմ հեռավորության վրա	խտխմ	2150	0.440	946.00
<b>Ընդամենը</b>			<b>29.0</b>		<b>10634.85</b>
<b>Ընդամենը Ծովակի տեղամասում</b>			<b>86.8</b>		<b>76356.71</b>
<b>Ընդհանուրը Վարդենիսի մասնաճյուղում</b>			<b>86.80</b>		<b>76356.71</b>
Վերադիր ծախսեր		տոկոս	11.0		8399.24
<b>Ընդամենը</b>					<b>84755.95</b>
Շահույթ		տոկոս	11.0		9323.15
<b>Ընդամենը</b>					<b>94079.10</b>
Չնախատեսված ծախսեր		տոկոս	2.0		1881.58
<b>Ընդամենը</b>					<b>95960.68</b>
Ավելացված արժեքի հարկ		տոկոս	20.0		19192.14
<b>Ընդամենը</b>					<b>115152.82</b>

\* վերգետնյա կենսազանգվածը

\*\* վերգետնյա կենսազանգվածը և արմատային զանգվածը՝ տիղմի և հողախառնուրդի հետ միասին

Կապալառույն աշխատանքները կատարում է Գեղարքունիքի մարզ, «Սևան» ազգային պարկ հասցեում:

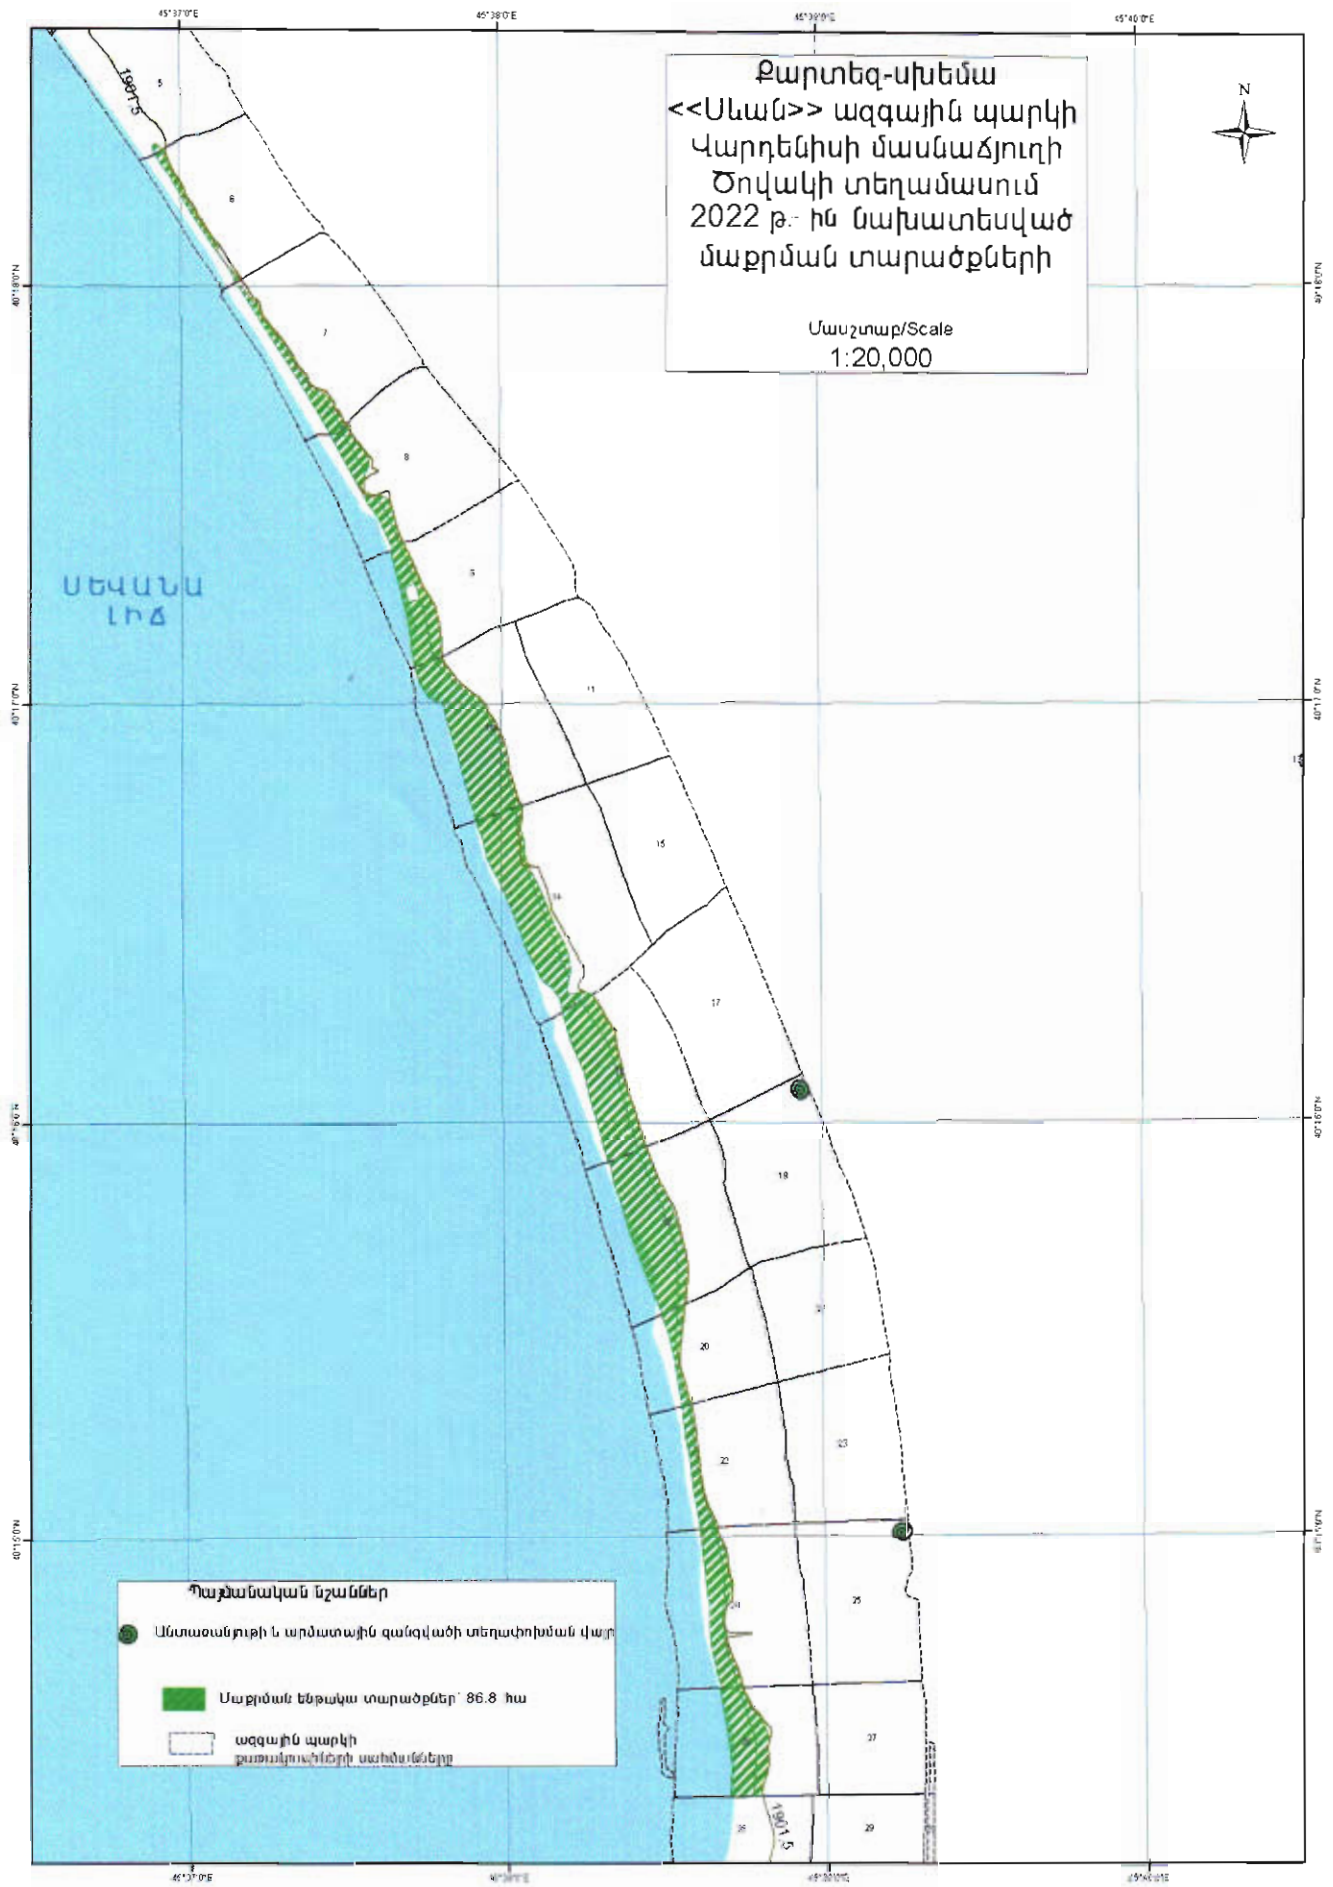

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
ՀՀ բնապահպանության նախարարության  
աշխատակազմի ղեկավար  
**Հ.Հովհաննիսյան**  
(ստորագրություն)  
**Կ.Տ.**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
«Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ի  
տնօրեն  
**Ա.Քոչարյան**  
(ստորագրություն)  
**Կ.Տ.**



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

2018-2022 թվականների ժամանակահատվածի Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	2018 թվականին կատարման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրը	05.12.2018թ.
2	2019 թվականին կատարման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	05.12.2019թ.
3	2020 թվականին կատարման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	05.12.2020թ.
4	2021 թվականին կատարման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	05.12.2021թ.
5	2022 թվականին կատարման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	05.12.2022թ.

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 ՀՀ բնապահպանության նախարարության  
 աշխատակազմի ղեկավար  
**Հ.Հովհաննիսյան**  
  
 (ստորագրություն)  
**Կ.Տ.**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ի  
 տնօրեն  
**Ա.Քոչարյան**  
  
 (ստորագրություն)  
**Կ.Տ.**



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2018 թվականին՝ այդ թվում (ըստ ամիսների աճողական կարգով)												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45111450	Սևանա լճի ջրածածկ անտառուտկարկների մաքրման 2018 թվականին կատարման աշխատանքների	.	.	.	.	.	.	80 068 400	80 068 400	80 068 400	113 823 249	113 823 249	113 823 249	113 823 249

\* «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա 2019-2022 թվականների համար կնքված պայմանագրի մասով՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագրի:

Հավելված №4  
« 10 » « 07 » 2018թ. կնքված  
№ «ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01» ծածկագրով պայմանագրի

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ՀՀ բնապահպանության նախարարություն**  
ք.Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011007763  
ՀՎՀՀ 02507198

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ**  
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք.Ճամբարակ, Գաղղմանի 6  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 115004674137  
ՀՎՀՀ 08100179

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20\_\_թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ **Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր**

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « 10 » « 07 » 2018թ.

Պայմանագրի համարը՝ № «ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01»

Պատվիրատուն և Կապալառուն՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20\_\_թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
Կ.Տ.

**ԱԿՏ N°**  
**պայմանագրի արդյունքը Գնորդին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ**

Սույնով արձանագրվում է, որ ՀՀ բնապահպանության նախարարության (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Ճամբարակի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև « 10 » « 07 » 2018 թվականին կնքված №«ՀՀ-ԲՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-18/01» պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն « \_\_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_ թվականին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ապրանքները.

Ապրանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

**ԿՈՂՄԵՐԸ**

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 Ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն
